

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍHO OBJEKTU

Název stavby: **Oprava silnice III/312 27 Dolní Morava**

Stupeň dokumentace: **Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)**

Datum: **2024/4**

Stavební objekt:

SO 132 DIO – dopravně-inženýrská opatření
SPO 132.6 Úsek 6

Investor stavebního objektu:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Příloha:

D 132-1 Technická zpráva

Projektant:

DHV PRO, spol. s r.o., Černopolní 39, 603 00 Brno

Zodpovědný projektant:

Ing. Václav Starý, tel. 603 875 291, vaclav.stary@dhvpro.cz


Projektanti:

Ing. Michal Jonáš, tel. 602 218 638, michal.jonas@dhvpro.cz

2 STRUČNÝ POPIS

Stavba bude prováděna za provozu po etapách. Je navrženo rozdělení stavby na 6 úseků, které se budou stavět samostatně.

ÚSEKY:	číslo úseku	staničení	orient. délka
	ÚSEK 1	KM 0.000 - 0.900	dl. 900 m
	ÚSEK 2	KM 0.900 - 1.850	dl. 950 m
	ÚSEK 3	KM 1.850 - 3.300	dl. 1.450 m
	ÚSEK 4	KM 3.300 - 4.311	dl. 1.000 m
	ÚSEK 5	KM 4.311 - 4.887	dl. 570 m
	ÚSEK 6	KM 4.887 - 6.291	dl. 1.400 m

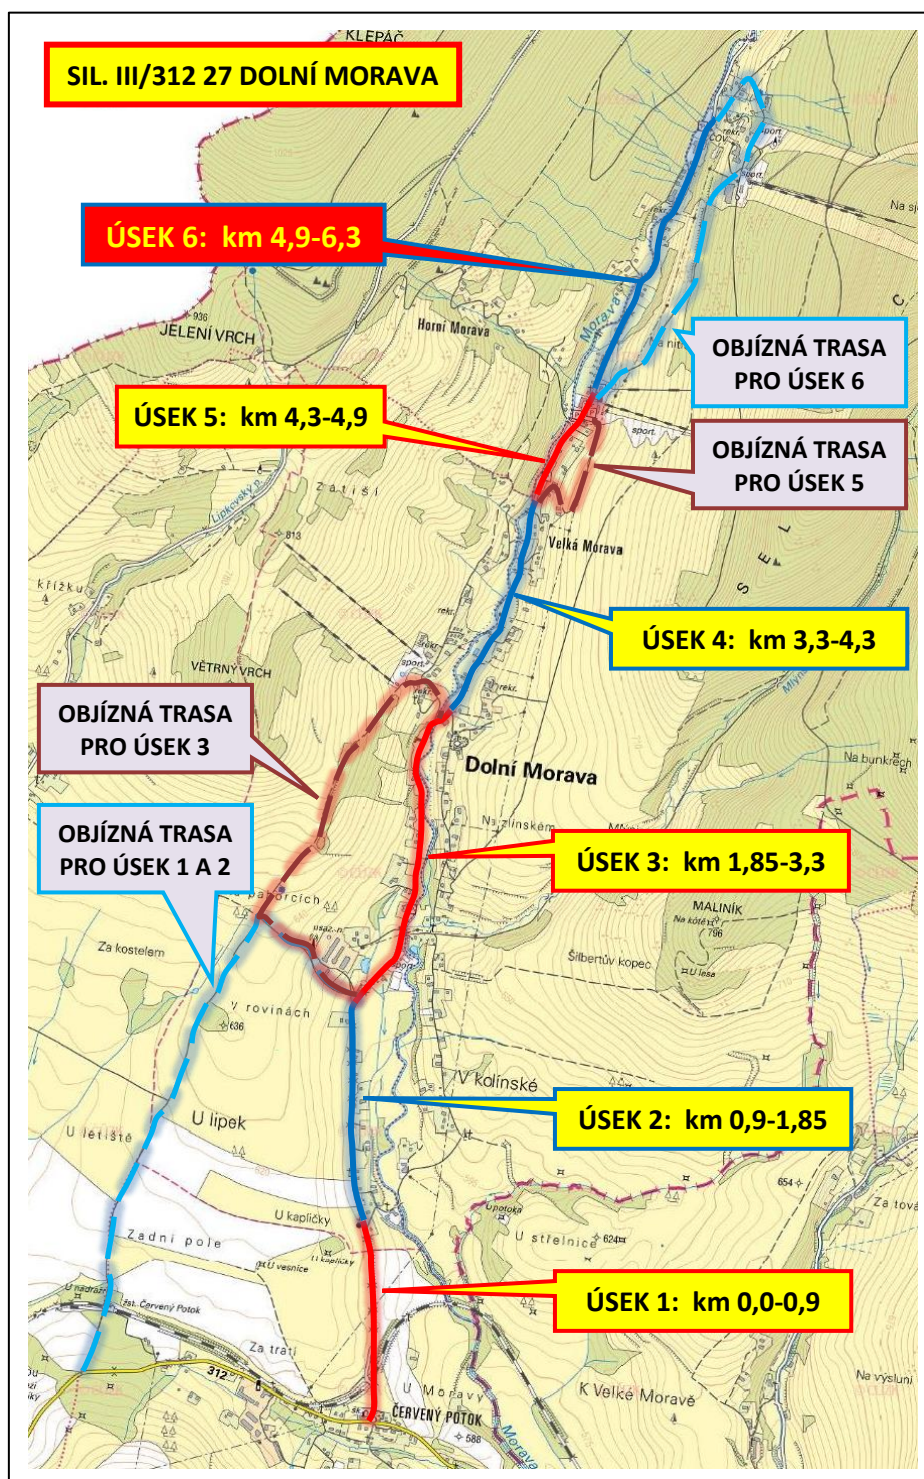

Realizace bude probíhat v období mimo letní (i zimní) turistickou sezonu.

Realizace úseku 6 bude probíhat za plné uzavírky. Doprava bude obousměrně vedena po objízdné trase kolem hotelu Vista.

Uzavírka bude na jejím začátku a konci vyznačena schématem dle vzoru TP 66, **Schéma B/15**. Ve směru od Červeného potoka bude vyznačena objízdná trasa užitím svislé dopravní značky IS 11a. Na objíždě v křižovatkách bude doplněno IS 11c.

Lokální pracovní místo bude vyznačeno dle TP 66, schéma **B/5.2**.

Po celou dobu výstavby bude umožněn průjezd IZS a omezeně cílové dopravě.

Dokončovací práce pak budou prováděny opět s lokálními omezeními.

Celková doba realizace se předkládá 16 týdnů.

Zpracoval: Ing. M. Jonáš
