

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	51
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 111/08

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Kalkulace položky 917425.R	1 / 5	
Zápis z Kontrolního dne č. 13 konaného dne 03.09.2020	11 / 6	
Fotodokumentace deště ze dne 13.06.2020	19 / 17	
Návrh AD ze dne 09.09.2020 včetně Situace	3 / 36	
Vyjádření TDS ze dne 11.09.2020	2 / 39	
Pokyn Správce stavby ze dne 22.09.2020	2 / 41	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 111 / 08	Číslo ZBV: 51
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE Husova 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí		
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: Dne 03.04.2020 obdržela Stavba stížnost vlastníka domu Jiráskovo nám č.p.1, Litomyšl, kdy dochází při větších deštích k zaplavení sklepních prostor domu. Po úpravách provedených v rámci PDPS majitel upozorňoval na hrozící nebezpečí vniknutí vody přímo do domu - v rámci PDPS došlo ke zvýšení obrubníků a chodníku před zmíněným domem. Své obavy dokládal fotodokumentací z přivalového deště ze dne 13.06.2020, kdy se před vchodem voda vlivem zvýšeného obrubníku zdržovala. Situaci nevyřešilo ani vyčištění chodníkové kanalizace městem Litomyšl - kanalizace v chodníku je pravděpodobně poddimenzovaná. Po několika projednání byla na Kontrolním dni č. 13 konaném dne 03.09.2020 dohodnuta úprava, kterou zpracoval Autorský dozor a předložil dne 09.09.2020. Správce stavby na toto konto po projednání s TDS vydal Pokyn k provedení Variace - úpravy chodníku, nicméně došlo k modifikaci návrhu, kdy nedošlo k předláždění zbylých 75m2 chodníku, ale došlo k úpravě pouze oblasti před předmětným domem (40m2). Vzhledem k výše uvedenému se jedná skutečnost, kterou nebylo možné odhalit během přípravy, jelikož kanalizace nebyla součástí projektu a je ve vlastnictví města Litomyšl. Z tohoto důvodu lze tvrdit, že se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nepředvídané změny na díle nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky. Změna tedy splňuje podmínky nepředvídanosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	0,00 Kč	92 101,80 Kč
		92 101,80 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum: podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum: podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis:
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum: podpis:
		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 08													
Evidenční číslo a název stavby: N24190086b - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 111 - Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl								6,08					
Číslo a název rozpočtu: SO 111 - Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací								Skupina Změn: \$222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0141021	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	T	117,83	139,43	21,60	263,00 Kč	30 988,76 Kč	0,00 Kč	5 680,80 Kč	36 669,56 Kč	5 680,80 Kč	18,30%
3	0141023	POPLATKY ZA SKLÁDKU BETONOVY ODPAD	T	111,58	113,38	1,80	297,00 Kč	33 139,85 Kč	0,00 Kč	534,60 Kč	33 674,45 Kč	534,60 Kč	1,60%
14	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ	M	283,14	295,59	12,45	71,00 Kč	20 102,94 Kč	0,00 Kč	883,95 Kč	20 986,89 Kč	883,95 Kč	4,40%
17	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	47,40	59,40	12,00	151,00 Kč	7 157,40 Kč	0,00 Kč	1 812,00 Kč	8 969,40 Kč	1 812,00 Kč	25,30%
23	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	3 786,30	3 911,30	125,00	15,00 Kč	56 794,50 Kč	0,00 Kč	1 875,00 Kč	58 669,50 Kč	1 875,00 Kč	3,30%
25	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	2 321,58	2 361,58	40,00	181,00 Kč	420 205,98 Kč	0,00 Kč	7 240,00 Kč	427 445,98 Kč	7 240,00 Kč	1,70%
38	582311	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAİK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LÓŽE Z KAMENIVA	M2	1 162,46	1 202,46	40,00	1 459,00 Kč	1 696 029,14 Kč	0,00 Kč	58 360,00 Kč	1 754 389,14 Kč	58 360,00 Kč	3,40%
64	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	857,00	867,00	10,00	400,00 Kč	342 800,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	346 800,00 Kč	4 000,00 Kč	1,20%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						2 607 218,57 Kč	0,00 Kč	80 386,35 Kč	2 687 604,92 Kč	80 386,35 Kč	3,00%
Nové položky													
235	917425,R	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 200MM	M	0,00	12,45	12,45	941,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 715,45 Kč	11 715,45 Kč	11 715,45 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	11 715,45 Kč	11 715,45 Kč	11 715,45 Kč	100,00%
		Celkem za všechny položky						2 607 218,57 Kč	0,00 Kč	92 101,80 Kč	2 699 320,37 Kč	92 101,80 Kč	4,00%
Za Zhotovitele:								Za Objednatela:					
Datum:								Datum:					

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	51
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 111/08

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
917425.R	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	12,450	941,00 Kč	11 715,45 Kč	Modifikace položky 917425

Za zhotovitele:
Podpis:

Za objednatele:
Podpis:

Rozbor ceny	
-------------	--

Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

101a

020

749,96

112,50

941,00

41.00

71 045,12

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena MJ	JC (M)
			Vlastní práce				671,42
1	P	000001	Dlaždic - obruba kamenná 200mm	M	1,00000	231,00	231,00
			Profese				231,00
2	S	000002	Audytář	Nh	0,10000	800,00	80,00
3	S	000003	Nákladní malý - UNC	Nh	0,10000	550,00	55,00
			Stroje				135,00
4	O	000004	Řezání obrubníků	M	0,25000	150,00	37,50
			Ostatní				37,50
5	D	000005	Nákladní automobil 14 T - časová sazba (oprava stávajících obrub na staveništi)	Nh	0,10000	600,00	60,00
6	D	000006	Nákladní automobil 14 T	tkm	17,00000	2,22	37,74
7	D	000007	Nákladní automobil 14 T - čekačka	15 min	0,02350	50,00	1,18
			Doprava				96,92
8	M	000008	Cementová mazanina CM12	M3	0,10000	1 690,00	169,00
			Material				169,00

ZÁPIS z kontrolního dne č. 13 konaného dne 04.09.2020

Stavba: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Místo: MěÚ Litomyšl

Účast: [viz prezenční listina]

Program:

- 1/ Konstatování současného stavu stavby
- 2/ Kontrola kvality
- 3/ Stav BOZP a PO
- 4/ Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni
- 5/ Vyjádření a připomínky účastníků
- 6/ Termín příštího kontrolního dne

1. Konstatování současného stavu stavby			
Úkol číslo	Název	Popis úkolu	Výsledek projednání
8.3	Dotaz Zhotovitele	Dotaz Zhotovitele – reprofilace příkopů	V případě chybějící položky krajnic na SO 101d TDS v rámci místního šetření dne 03.04.2020 požádal Zhotovitele o nacenění krajnic u SO 101b, kdy namísto ŠD 0/32 jako materiál krajnic bude použit vyzisk – frézovaný asfalt, a dále bude dopočítána položka krajnic. Dojde tedy k ponížení výzisků frézovaného materiálu. Z důvodů finanční úspory bylo dohodnuta záměna materiálu na krajnicích na všech objektech z ŠD 0-32 na vyfrézovaný materiál. Správce stavby požádal Zhotovitele o předložení návrhu Variace. Bod je ve sledování.
8.5	Požadavek obce Němčice	Požadavek zástupce obce Němčice na Zhotovitele a Objednatele	Dne 03.04.2020 obdržel Správce stavby od starosty obce následující požadavky na provedení Díla: Průběžně informovat občany o možnosti nebo zamezení přístupu do jejich nemovitostí (krátkodobě z důvodu prováděných stavebních prací) – zůstává ve sledování
8.6	Připomínka vlastníka dotčené nemovitosti	Provedení chodníku u č.p. 1 na Jiráskově náměstí.	Správce stavby obdržel dne 03.04.2020 následující připomínku. Vlastník objektu č. p. 1 na Jiráskově náměstí se obává, že zvýšení chodníku, začínající před

		vchodem do objektu, společně s vybudováním objezdu dvou malých schodišť o tři domy výše, povede k tomu, že při mírných přívalových deštích poteče těsně kolem objektu voda, která bude ohrožovat základy objektu, zatopí sklep a namočí základy. Podle názoru vlastníka úpravy chodníku zvednou hladinu protékající vody a dostane se tak do objektu. Během pochůzky po stavbě bylo konstatováno, že se voda ze silnice na chodník nedostane, neboť došlo k přidání dvou uličních vpustí na komunikaci, kde jsou celkem 4 uliční vpusti. Zhotovitel přislíbil, že vlastníkově situaci objasní. Zhotovitel situaci vlastníkově objasnil. Vlastník nemovitosti však se závěry nesouhlasí. Zhotovitel proto provedl ruční pročištění šachty kanalizace uliční vpusti, která je ve vlastnictví města Litomyšl. Více ze strany Zhotovitele v rámci provádění Díla není možné učinit. Zhotovitel dále vyšel vlastníkově nemovitosti vstříc a vyhověl jeho žádosti o poskytnutí několika pytlů písku, než bude věc vyřešena. Město Litomyšl o pročištění kanalizace na předmětném chodníku, která je v jeho vlastnictví. Zhotovitel svolá místní šetření, kde bude pomocí cisterny s vodou demonstrován odtok vody. Pohled účastníků výstavby na situaci je stále stejný – navržený způsob zlepšit odtokové poměry (za předpokladu funkčnosti dešťové kanalizace města nacházející se v chodníku). Účastníci výstavby domluví termín, kdy dojde k demonstraci odtoku dešťové vody pomocí cisterny s vodou. Demonstrace odtoku nebyla po přívalových deštích nutná. Odtok vody z komunikace je v pořádku a funkční. Problém je dle stavby v kanalizaci v chodníku, která nestíhá a voda je vytlačována zpět na chodník. Kanalizace je mimo stavbu a v majetku města. AD navrhne řešení, avšak požaduje podrobné zaměření dané lokality. Zhotovitel zaměření dodá v co možná nejkratším termínu.
--	--	---

			Závěr: Zhotovitel přespádá chodník a sníží obruby jak požadovalo město. Bylo přislíbeno, že tato úprava následně nebude bránit kolaudaci.
9.4	Požadavek obce Němčice	Oprava místní komunikace v Němčicích	Starosta obce Němčice požádal dne 06.05.2020 o opravení místní komunikace na pozemcích č. 1636, 1697/2 a 1713, která slouží jako přístupová cesta na dočasnou skládku materiálu v Němčicích. Podle vyjádření Zhotovitele z 08.05.2020 byla místní komunikace na dočasnou skládku dne 07.05.2020 opravena, je zde však problém s prosakující vodou z podloží. Podle vyjádření TDS z 11.05.2020 musí Zhotovitel na své náklady uvést pozemky, které využil pro skládku svého materiálu, do původního stavu. Totéž se týká i příjezdové cesty. TDS předpokládá, že Zhotovitel před zahájením Stavby provedl pasportizaci. Bod je sledován.
10.1	Požadavek města Litomyšl	Požadavek zástupce města Litomyšl na Objednatele	Prostřednictvím e-mailu ze dne 19.05.2020 požádal zástupce města Litomyšl o opravu propadlé horské vpusti na místní komunikaci v ulici Lidická, které podle něj vznikla vlivem zvýšeného provozu při vedení objízdné a zásobovací trasy v rámci provádění Díla. Závada byla podle něj objevena v rámci pravidelné roční prohlídky komunikací. Dle tvrzení Zhotovitele podle pasportizace nedošlo k poškození vlivem stavby – popraskané asfaltové souvrství bylo již před zahájením Stavby. Město s tvrzením souhlasí, poukazuje však na výškový propad vpusti, nikoliv na poškozené asfaltové souvrství. Na KD bylo domluveno, že město Litomyšl nechá vypracovat cenový odhad opravy, následně bude projednán způsob opravy a její financování. Sanace propadlé vpusti bude řešena a financována městem a zhotovitel opraví asfaltové souvrství po provedení sanace horské vpusti. Město čeká na nabídku (řeší pan Pavel Kubeš). Bod zůstává ve sledování.
10.2	Požadavek Objednatele	Požadavek Objednatele na Zhotovitele	Objednatelem pověřená osoba požádala prostřednictvím e-mailu ze dne 28.05.2020 Zhotovitele o opravu vzniklé

			závady ve sjízdnosti (výtluky) na silnici III/35846 v úseku, který slouží jako objízdná trasa při uzavírce silnice II/358 Litomyšl – Zhoř. Podle vydaného rozhodnutí o povolení uzavírky, které vydal příslušný silniční správní úřad (MěÚ Litomyšl – odbor místního a silničního hospodářství), má Zhotovitel povinnost ihned odstraňovat vzniklé závady ve sjízdnosti na objízdné trase během trvání uzavírky. Pokud není závadu možné odstranit ihned, má povinnost označit místo příslušnou dopravní značkou. Tento požadavek Objednatele platí i pro úsek silnice II/360 Litomyšl – Němčice k jehož výpravě měl být Zhotovitel telefonicky vyzván v dubnu 2020. Město dodalo emailovou korespondenci odůvodnění požadavku. Správce stavby problematiku projedná s Objednatelem. Opravy probíhají. Na vyjádření objednatel se čeká u komunikace v zahrádkářské kolonii, kde byla odebráno značení „mimo dopravní obsluhy“.
12.1	Propustek v km 6,987 včetně UV 103 a 104	Řešení situace ohledně propustku v km 6,987 včetně UV 103 a 104	Vzhledem k neshodám ohledně finálního řešení vyústění propustku bylo AD navrženo, že konec obecní dešťové kanalizace bude těsně za koncem obecního chodníku překopem a ocelovým propustkem DN 400 převedena na druhou stranu komunikace (tedy vpravo ve směru staničení cca km 7,004) , kde bude na obecním pozemku č. 487/1 a zhotovena vsakovací jáma, která bude mít následující parametry: šířka 2m délka 9m a hloubka 3 metry, nepropustná folie bude pouze po stranách (tj. u silnice a u svahu) geotextilie ze všech stran. Přepad bude řešen směrem proti staničení, k odtoku bude využita původní dešťová kanalizace, která odváděla vodu z aktuálně zrušené vpusti v nároží místní komunikace, do zasakovací jámy bude taktéž zaústěna UV 104 a 103 pomocí trubky DN 150 (před zasakovací jámou bude zřízena plastová revizní šachta za účelem budoucí údržby). Díky výše uvedenému řešení bude většina dešťové vody odvedena pryč před předmětným propustkem, který bude následně odvádět pouze vodu z příkopu vlevo ve směru staničení (včetně případné vody ze sousedního pole) a bude proto řešen

			podle projektu – záhozem lomovým kamenem. Starosta obce s návrhem souhlasí a projedná návrh s občanem, který pozemek 487/1 z části užívá. Změna byla projednávána se stavebním úřadem. Bude se jednat o nepodstatnou odchylku od PD – bude projednáno v rámci kolaudace. Bude potřeba pouze souhlas vlastníků dotčených pozemků – obce Němčice. Souhlas zajištěn. Zhotovitel předloží Návrh Variace. Zhotovitel apeluje na AD kvůli dodání rozdílového výkazu výměr.
12.2	Ostrůvek ZŠ Zámecká	Oprava ostrůvku u sjezdu k ZŠ Zámecká	Vlivem provozu (pravděpodobně zásobování školní jídelny) u ZŠ Zámecká došlo k poškození zrealizovaného ostrůvku. Město Litomyšl navrhovalo jeho zrušení. AD navrhl provedení podle původní PD (krajníky s nášlapem + 6cm, výplň z drobných kostek). Byla dohodnuta varianta navržená AD. Úprava provedena, bod se vypouští.
13.1	Škody po dešti	Škody po dešti ze dne 14.08.2020	Dne 14.08.2020 došlo k nadprůměrným srážkám v oblasti obce Němčice. Na stížnosti obyvatel z Člupku bylo svoláno místní šetření, kde byla přislíbena snaha stavby o řešení odvodnění v oblasti cca v km 7,315 – 7,975. Na základě pochůzky na KD bylo dohodnuto následující: Km cca 7,525-7,550 – palisády, krajnice vytvořena zatravnovací dlažbou kvůli vymílání Km cca 7,625 – 7,655 – obruba kvůli ochraně domu pod silnicí Zbytek tohoto úseku beze změny oproti PD Km cca 7,700-7,725 (za opěrnou zdí ve směru staničení) – díky původnímu stavu nebylo možné cca od poloviny kopce provést střechovitý sklon a tak se sklon mění na jednostranný směrem k opěrné zdi z tohoto důvodu AD navrhl obruby v délce cca 25 metrů (ke sloupu VN) Km 7,700 – 7,975 vzhledem ke komplexnosti problematiky není v silách stavby tento problém vyřešit, stavba tedy navrhla zpevnění břehu příkopu zatravnovací dlažbou v místech, kde je komunikace podemletá. Správce stavby návrh projedná s Objednatelem.

13.2	Kácení stromů	Kácení stromů Vlkov cca v km 3,200	Zhotovitel upozorňuje na označené stromy ke kácení s tím, že vzhledem k jejich poloze musí být zkáceny do silnice. V těchto místech budou svodidla a mohlo by dojít k jejich poškození, resp. i k poškození obrusné vrstvy, která bude provedena o víkendu 26-27.09.2020 a doporučuje tedy kácení před tímto datem. Starosta obce Němčice ověří situaci.
------	---------------	------------------------------------	--

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací	Ve sledovaném období probíhaly práce na těchto stavebních objektech: • SO 101b Silnice II/358, km 1,366 - 4,125 • SO 101c Silnice II/358, km 4,125 - 8,060 • SO 112 Úpravy místních komunikací a chodníků, Němčice • SO 121 Propustky na sil. II/358 • SO 122 Úpravy sjezdů vč. propustků • SO 131 Dešťové stoky • SO 142 Dopravně inženýrská opatření • SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 358-019 v km 3,350 SO 101b Silnice II/358, km 1,366 - 4,125 • <u>km 1,366 – 2,237</u> - reprofilace a ohumusování příkopů • <u>km 2,900 – 3,650</u> - dláždění příkopů žulovou kostkou • <u>km 3,650 – 3,975</u> - odstranění nestmelených vrstev komunikace - provedení sanací v tl. 0,3m štěrkodrtí frakce 0/125 - pokládka vrstvy štěrkodrtě frakce 0/63 v tl. 0,22m - pokládka SC 0/32 C 8/10 - pokládka silničních obrubníků - pokládka ACP 22 S PMB 25/55-60 v tl. 50mm - pokládka ložné vrstvy asfaltobetonu směs ACL 16 CRmB v tl. 70mm SO 101c Silnice II/358, km 4,125 - 8,060 • <u>km 4,135</u> - sanace odbočné větve křižovatky komunikace - pokládka drenáží - provedení sanací v tl. 0,3m štěrkodrtí frakce 0/125 - pokládka vrstvy štěrkodrtě frakce 0/63 v tl. 0,22m • <u>km 4,700 – 4,980</u> - pokládka drenáží - provedení sanací v tl. 0,3m štěrkodrtí frakce 0/125 - pokládka vrstvy štěrkodrtě frakce 0/63 v tl. 0,22m • <u>km 4,415 - 4,460 a km 5,300 – 5,500</u> - pokládka drenáží - provedení sanací v tl. 0,3m štěrkodrtí frakce 0/125 v levém jízdním pruhu - pokládka vrstvy štěrkodrtě frakce 0/63 v tl. 0,22m • <u>km 4,120 – 5,000 (pravá strana); km 4,360 – 4,475 (levá strana); km 5,125-5,585 (levá strana)</u> - pokládka silničních obrub • <u>km 4,125-4,275 (oba jízdní pruhy) a km 5,125-5,500 (levá strana)</u> - pokládka SC 0/32 C 8/10 v tl. 130mm
----------------------------	---

	• <u>km 4,160-4,275 a km 5,125-5,500 (levá strana)</u> - pokládka ACP 22 S PMB 25/55-60 v tl. 50mm SO 112 Úpravy místních komunikací a chodníků, Němčice - odstranění nestmelených vrstev komunikace - pokládka vrstvy šterkodrtě frakce 0/63 v tl. 0,22m - pokládka silničních obrubníků SO 121 Propustky na sil. II/358 • <u>km 5,068</u> - zatrubnění klenbového propustku troubou DN 800 - beranění štětovic pro zapažení výkopu monolitické šachty SO 122 Úpravy sjezdů vč. propustků • <u>Km 1,815 – 1,845</u> - pokládka potrubí DN 800 včetně zásypu • <u>km 2,950 – 3,650</u> - dláždění vtoků a výtoků z lomového kamene SO 131 Dešťové stoky • <u>km 4,075 – 4,100</u> - provedení stoky „C“ včetně uličních vpustí a zaústění do vodního toku • <u>km 4,125 – 5,300</u> - průběžné práce na stokách „J, F a G“ - osazování uličních vpustí SO 132 Vsakovací objekty • <u>km 3,431 – 3,495</u> - dláždění vtoků z lomového kamene • <u>km 7,000</u> - pokládka trouby DN 400 a osazení plastových šachet pro vsakovací objekt včetně zásypů SO 142 Dopravně inženýrská opatření - kontrola přechodného dopravního značení SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 358-019 v km 3,350 - bednění a vázání výztuže pro zřízení nové přibetonávky opěr a křídel mostu - betonáž přibetonávky opěr a spřažené desky - provedení pečetící vrstvy - pokládka izolace mostu asfaltovými pásy
b) finanční plnění	-
c) předávání RDS	Viz níže.
d) fotodokumentace	Je součástí zprávy o postupu prací.

2. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Práce dosud probíhaly v souladu se schválenými TePř a VTD.
--	--

3. Stav BOZP a PO

Koordinátor BOZP upozornil Zhotovitele, aby dodržoval pravidla BOZP – především pracovníky podzhotovitele MADOS MT. Zhotovitel byl upozorněn, že v případě opakované neukázněnosti by muselo být přistoupeno k sankcím.

4. Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni

Úkol číslo	Název	Popis úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1.1				
1.2				

5. Vyjádření a připomínky účastníků

Účastník	Vyjádření, připomínky, ostatní
Správce stavby	Správce stavby seznámil všechny účastníky výstavby s možností nahlédnout do zápisů z pravidelných výrobních výborů, kterých se účastní zástupci Zhotovitele, zástupci Objednatele a tým Správce stavby. Předmětem výrobních výborů je zejména projednání aktuálních Variací. Počet Variací: 49 Předložených ocenění: 38 Podepsaných ZBV: 20 Bod zůstává ve sledování Správce stavby byl ze strany TDS upozorněn na nedostatek Personálu zhotovitele s tím, že jsou dle jeho názoru ohroženy dohodnuté termíny. Správce stavby Zhotovitele na tuto skutečnost upozornil. Zhotovitel slíbil zvýšení počtu již v následujícím týdnu. Personál posílen, bod se vypouští. Správce stavby informoval účastníky KD, že ze strany Objednatele bylo požádáno o kolaudaci intravilánu města Litomyšl a České Třebové.
TDS	Podle TDS jsou na Stavbě stížnosti na zaústění výtoků z propustků na sousední pozemky – stížnosti na splavování hlíny apod. - Vyústění propustku v km 5,607 bude řešeno úpravou plánované vsakovacího tělesa – AD zpracoval návrh řešení – provádí se dle návrhu – bod se vypouští - Vyústění propustku v km 6,435 – bude provedeno vsakovací těleso před předmětným propustkem a upraveno navrhované vsakovací těleso u výtoku – AD zpracoval návrh řešení – provádí se dle návrhu – bod se vypouští
Město Litomyšl	Město Litomyšl počítá se zprovozněním celé trasy 10.10. Zhotovitel z důvodu nepříznivého počasí upozorňuje na možný posun nejpozději na 19.10.
Policie ČR	- podle aktuálního výkladu předpisů se místa pro přecházení nevyznačují přerušovanou čarou – zástupce DI upozorňuje, aby místa pro přecházení nebyla tímto způsobem označována Bod zůstává ve sledování.
Obec Němčice	- průběžně udržovat sjízdnou komunikaci pro osobní vozy používanou jako přístup k dočasné skládce, požadavek vlastníka čp. 48 v Němčicích Bod zůstává ve sledování Po koordinaci PD s PD města na úpravu chodníků budou upřesněny požadavky na snížení nášlapných výšek obrub v místech případných přechodů a míst pro přecházení – obec ve spolupráci s AD. AD předal upravené situace. Obec žádá o: - prověření, zda budou dle dohody umístěny UV v km 3,981 a 4,025. Zhotovitel potvrdil, že veškeré úpravy probíhají podle dodané koordinační situace. Bod se vypouští. - V suchých dnech snižovat prašnost kropením. Zůstává ve sledování - Uvedení cesty před úřadem do původního stavu – cesta je využívána pro průjezd mechanizace. Zůstává ve sledování. - U vsakovací jámy v km 7,655 zajistit, aby voda přitékající od garáží byla zachycena a svedena do nejbližší UV (dojde k jejímu zdvojení) a zabránit jejímu vtékání na II/358. Zůstává ve sledování.

	Obec má následující požadavky: - upravit ostrůvek na příjezdu do Němčic po pravé straně mezi dvěma místními komunikacemi snížením obrub pro následné zhotovení chodníku - úprava obrub v otáčce směrem na Člupek po pravé straně (cca km 4,370) za čerpací stanici PHM tak aby od opěrné zdi protipovodňových opatření zůstal prostor min. 1,5m pro umístění chodníku - dosypání terénu za obrubami provést štěrkodrtí v místech budoucího chodníku pokud lze - bude upřesněno - vyčistit stavbou dotčené šachty splaškové kanalizace od napadaného materiálu Požadované opravy - místní komunikace u obecního úřadu, MK byla používána pro dopravu techniky a navážení materiálu - prostor točny BUS, uskladnění materiálu a techniky - chodník na Člupku, opravy obrub, uličních vpustí, kanalizačních šachet včetně poklopů, dlažby
Zhotovitel	Zhotovitel žádá AD o zaslání rozdílových soupisů prací týkající se úpravy křižovatky v Němčicích, propustků v km 5,587 a 6,647, vsakovacích jám v km 6,987 (resp. 7,00 včetně týkajícího se propustku a UV) a 7,655 a úpravy klenbového propustku na Člupku („Stoka G“). Stále trvá Zhotovitel upozornil účastníky, že 26-27.09.2020 dojde k pokládce obrusné vrstvy a komunikace tedy bude o tomto víkendu zavřena kompletně.

6. Termín příštího kontrolního dne

Datum konání příštího KD	02.10.2020
Čas konání příštího KD	10:00
Místo konání příštího KD	Zasedací místnost MěÚ Litomyšl

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku.

Zapsal:

Tomáš Opelka

Jméno

**Tomáš
Opelka**

Digitálně
podepsal Tomáš
Opelka

Podpis

Přílohy



Číslo	Název
1	Prezenční listina



Rozdělovník

viz Prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA

Kontrolní den č. 13 konaný dne 04.09.2020 v prostorech MěÚ Litomyšl
Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Organizace	Jméno	Kontakt/e-mail	Podpis
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Ing. Milan Skýba	+420 724 105 131	
		milan.skyba@suspk.cz	
M-SILNICE, a.s.	Mgr. Jiří Pokorný	+420 606 680 697	
		jiri.pokorny@msilnice.cz	
Contract management, a.s.	Tomáš Opelka	+420 774 988 894	
		opelka@cmanagement.cz	
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.	Ing. Michal Jonáš	+420 602 218 638	
		michal.jonas@rhdhv.com	
Contract management, a.s.	Mgr. et. Mgr. Martin Altmann	+420 603 814 379	
		altmann@cmanagement.cz	
GEODROM s.r.o.	Ing. Jiří Habrovec	+420 604 235 851	VZ: KUBICEK ONDŘEJ 
		habrovec@geodrom.cz	
MANIFOLD GROUP s.r.o.	Ing. Pavel Matuška	+420 602 171 295	
		matuska@manifold.cz	
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Ing. Kristýna Malinská	+420 724 946 065	
		kristyna.malinska@suspk.cz	
MěÚ Litomyšl	Rostislav Simon		
		Rostislav.simon@litomysl.cz	

Organizace	Jméno	Kontakt/e-mail	Podpis
MADOS MT	Ing. Petr Rous	rous@madostmt.cz	
Obec Němčice	Ing. Josef Racek	racek@uo.cz	
MěÚ Litomyšl	Miloslav Cink	miloslav.cink@litomysl.cz	
MADOS MT	Zdeněk Stránský	stransky@madostmt.cz	
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	David Jaška	david.jaska@suspk.cz	
Policie ČR, DI Svitavy	por. Bc. Martin Pavliš	sy.di@pcr.cz	
MěÚ Česká Třebová	Karel Švercl	Karel.svercl@ceska-trebova.cz	
MěÚ Litomyšl	Ing. Pavel Jiráň	pavel.jiran@litomysl.cz	
M-SILNICE	Josef Reznicek	josef.reznicek@msilnice.cz	
MADOS MT	Janecek	janecek@madostmt.cz	
M-SILNICE	Ondřej Štol	ONDREJ.STOL@MSILNICE.CZ	
		602 465 782	

Litomyšl, Jiráskovo nám. 1
Průtrž mračen 13.06.2020

foto 1



foto 2



foto 3



foto 4



foto 5



foto 6



foto 7



foto 8



foto 9



foto 10



foto 11



foto 12



foto 13



foto 14



foto 15



foto 16



foto 17

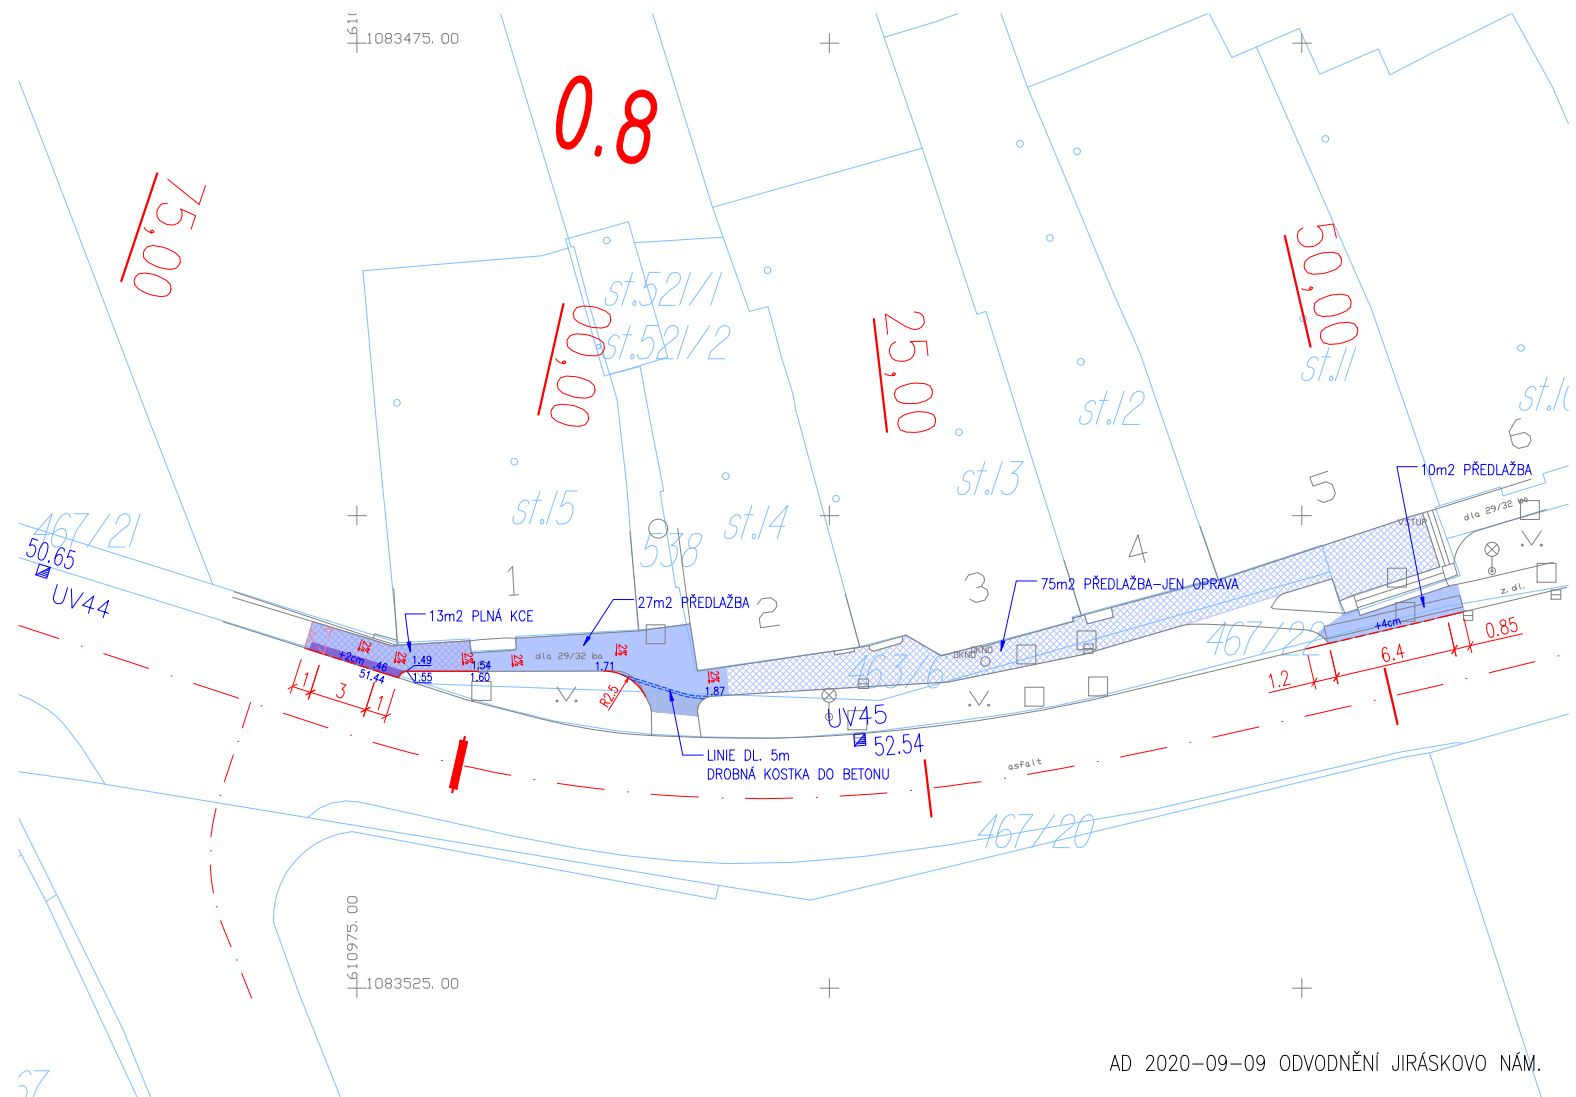


foto 18



foto 19





AD 2020-09-09 ODVODNĚNÍ JIRÁSKOVO NÁM.

Mgr. Jiří Pokorný
Zástupce zhotovitele

M – Silnice a.s. – Oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 40 Chrudim
IČO: 421 96 868
ID schránky: jwtq7ju

Název stavby: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Naše sp. zn.: CM2020/Ope/095

V Praze dne
22.09.2020

Související
korespondence: -

Věc: Pokyn Správce stavby (Pod-čl. 3.3 / Pod-čl. 13.3 OP/ZP)

Dobrý den,

reaguji na problematiku odvodnění komunikace II/358v úseku Jiráskova náměstí v Litomyšli, zejména pak odvodnění chodníku před objektem č. p. 1 na Jiráskově náměstí (dále jen „**odvodnění Jiráskova náměstí**“), která byla naposledy předmětem jednání mezi účastníky výstavby v rámci KD č. 13 konaného dne 04.09.2020.

Konečným výsledkem jednání v této věci je vyhovění požadavku města Litomyšl na úpravu chodníku před objektem č. p. 1. Úprava měla podle požadavku spočívat ve změně spádování dlažby chodníku a ve snížení obruby chodníku za účelem zlepšení odtokových poměrů a odvodnění chodníku při intenzivních srážkách.

Současně byl v této věci požádán AD o předložení návrhu stavebně-technického řešení a Zhotovitel o zaměření předmětného úseku. V návaznosti na Zhotovitelem provedené zaměření AD předložil návrh dne 09.09.2020 a je součástí Přílohy č. 1 a 2 tohoto pokynu. Vedle úpravy spádování chodníku a snížení obrub AD navrhuje dále zrušení stávajících uličních vpustí v chodníku a mechanické zamezení otevírání kanalizačních šachet spodním tlakem vody. K tomuto návrhu AD se souhlasně vyjádřil TDS dne 11.09.2020 s tím, že o by se mělo jednat pouze o předláždění chodníku před předmětným objektem (cca 40 m²) bez celé konstrukce a dalších navrhovaných 75 m² a zvýšení nášlapné výšky obruby v km 0,852.

Na základě výše uvedeného tímto vydávám ve věci odvodnění Jiráskova náměstí v souladu s Pod-čl. 3.3 OP/ZP pokyn Správce stavby k provedení navržených změn tj. snížení obruby v cca km 0,793 a úpravy 30 m2 dlažby včetně zvýšení obruby v km 0,852.

Pro případ, že navržené změny v odvodnění Jiráskova náměstí vyvolají Zhotoviteli dodatečné Náklady, vydávám v souladu s Pod-čl. 13.3 OP/ZP pokyn Správce stavby k provedení Variace a současně Vás zdvořile žádám o neprodlené zaslání ocenění Variace podle Pod-čl. 12.3 OP/ZP.

Závěrem dodávám, že Variace bude administrována podle interní směrnice Objednatele a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Během této administrace dojde rovněž k projednání ocenění Variace.

S pozdravem

5

CM
Contract Management

Zelený pruh 95/97 IČ: 05306035
140 00 Praha 4 DIČ: CZ05306035
www.contractmanagement.cz



Tomáš Opelka
Správce stavby

Přílohy

- | | |
|---|---|
| 1 | Návrh AD na odvodnění Jiráskova náměstí ze dne 09.09.2020 se situačním výkresem |
| 2 | Vyjádření TDS ze dne 11.09.2020 |
