

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	33
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce mostu ev.č. 358-019, km 3,350
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 202/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Zápis z místního šetření ze dne 03.04.2020	3 / 5	
Zaměření kácení	1 / 8	
Fotodokumentace	2 / 9	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (5)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce mostu ev.č. 358-019, km 3,350	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 202 / 01	Číslo ZBV: 33
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE Husova 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí		
Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: Zhotovitel musel v rámci provádění stavebního objektu SO202 Rekonstrukce mostu ev.č. 358-019, km 3,350 provést vyřezání a likvidaci všech náletových dřevin pro umožnění přístupu ke stavebnímu objektu a především možnosti zatrubnění potoka, který objektem protéká (viz. Zápis z místního šetření ze dne 03.04.2020). Bez odstranění náletových dřevin by nebylo možné provést práce na stavebním objektu. S těmito nálety nebylo v zadávací dokumentaci počítáno. V případě změny v osobě dodavatele by došlo k zpoždění zahájení realizace stavebního objektu a tedy k prodloužení celé stavby, což by zadavateli způsobilo značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Z tohoto důvodu je zřejmé, že se jedná o změnu, kterou je nezbytné provést původním dodavatelem a změna nepřesáhne 50% původní hodnoty zakázky a tedy splňuje náležitosti § 222 odst. 5 ZZVZ.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	0,00 Kč	32 930,00 Kč
		32 930,00 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum: podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum: podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis:
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum: podpis:
		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název stavby: N24190086b - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová Číslo a název SO/PS: SO 202 - Rekonstrukce mostu ev.č. 358-019, km 3,350 Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Rekonstrukce mostu ev.č. 358-019, km 3,350 - Soupis prací							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.01 Skupina Změn: §222, odst. (5)						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Nové položky													
151	11120.N	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	0,00	370,00	370,00	89,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	32 930,00 Kč	32 930,00 Kč	32 930,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	32 930,00 Kč	32 930,00 Kč	32 930,00 Kč	100,00%
		Celkem za všechny položky						0,00 Kč	0,00 Kč	32 930,00 Kč	32 930,00 Kč	32 930,00 Kč	0,00%
Za Zhotovitele:							Za Objednatele:						
Datum:							Datum:						

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Název a evidenční číslo Stavby:

Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	148 047 801,14 Kč	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	7 018 165,50 Kč	bez ABS	9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	0,02%	limit nepřekročen	12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	0,87%	limit nepřekročen										
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	155 706 529,21 Kč	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	4,74%	limit nepřekročen	10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvidané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	5,49%	limit nepřekročen	13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	22 207 170,17 Kč	1 292 258,65 Kč	limit nepřekročen									
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	105,17%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	44 414 340,34 Kč		11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	74 023 900,57 Kč		14=149224000-28	Zbývá do vyčerpání limitu	22 207 170,17 Kč	20 914 911,52 Kč	OK v limitu									
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%																						
5=(39/1)*100	Sledování záporných položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%																						
15 % z Přijaté smluvní částky		22 207 170,17 Kč		Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)	Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ			Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ			Změny nepředvidané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ									
SO	ZBV č.	Název SOPS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	
16	17	18	19=22+26+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28=25+26	29	30	31=29+30	32=29+30	33	34	35=33+34	36=33+34	37	38	39=37+38	
			-894 987,54 Kč	8 553 715,61 Kč	7 658 728,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-325 848,04 Kč	966 410,61 Kč	0,87%	1 292 258,65 Kč	0,00 Kč	32 930,00 Kč	32 930,00 Kč	32 930,00 Kč	-569 139,50 Kč	7 554 235,00 Kč	6 985 235,50 Kč	8 123 514,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 102	1	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací / Kamenné obruby	0,00 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 102	2	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací / Kamenné obruby	0,00 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 102	3	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací / Kanalizační přípojky	0,00 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	4	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / vodící proužky	0,00 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	5	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / uliční vpusti	0,00 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	6	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / sanace klenby	0,00 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 111	7	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací / podkladní vrstvy u kabelu CETIN	-231 630,00 Kč	140 421,54 Kč	-91 208,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-231 630,00 Kč	140 421,54 Kč	-91 208,46 Kč	372 051,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 101a	8	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / sanace podloží v km 0,197-0,560	0,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	9	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / obruby ve vnitřním oblouku v km 0,780-0,855	0,00 Kč	136 898,07 Kč	136 898,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	136 898,07 Kč	0,00 Kč	136 898,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	10	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / vrstvy pod OŽK	0,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 142.1a	11.1	Dopravné inženýrské opatření - I. etapa / Úprava DIO SO 101a	0,00 Kč	96 965,50 Kč	96 965,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	96 965,50 Kč	0,00 Kč	96 965,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 142.2	11.2	Dopravné inženýrské opatření - IV. etapa / Úprava DIO SO 102	0,00 Kč	33 342,00 Kč	33 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 342,00 Kč	0,00 Kč	33 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 111	12	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací / změna chodníku VK Jeřába 123	0,00 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	13	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / separační geotextilie	0,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 102	14	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací / odvodnění pod vliaduktem	0,00 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	15	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / vyrovnávací vrstvy	0,00 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	354 219,84 Kč	0,00 Kč	354 219,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	16	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / odvodnění vjezdu km 0,071	0,00 Kč	119 613,94 Kč	119 613,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	119 613,94 Kč	0,00 Kč	119 613,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	17	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / ČEZ km 0,25-0,3	-70 669,50 Kč	309 236,15 Kč	238 566,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-70 669,50 Kč	309 236,15 Kč	238 566,65 Kč	379 905,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 101a	18.1	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / napojení ul. Terezy Novákové a Petra Bezruče	0,00 Kč	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 320,00 Kč	0,00 Kč	4 320,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 111	18.2	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací / napojení ul. Terezy Novákové a Petra Bezruče	0,00 Kč	51 288,28 Kč	51 288,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	51 288,28 Kč	51 288,28 Kč	51 288,28 Kč	51 288,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	19	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / Sanace podloží 0,366-0,774	0,00 Kč	1 868 275,08 Kč	1 868 275,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 868 275,08 Kč	1 868 275,08 Kč	1 868 275,08 Kč	1 868 275,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 102	20	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací / Spátný výpočet odstranění kons. vrstev z PDPS	0,00 Kč	1 091 179,72 Kč	1 091 179,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 091 179,72 Kč	1 091 179,72 Kč	1 091 179,72 Kč	1 091 179,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	21	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / geotextilie	0,00 Kč	297 474,00 Kč	297 474,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	297 474,00 Kč	297 474,00 Kč	297 474,00 Kč	297 474,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 142.1b	22	Dopravné inženýrské opatření - II. etapa / DIO zima	0,00 Kč	116 456,00 Kč	116 456,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	116 456,00 Kč	116 456,00 Kč	116 456,00 Kč	116 456,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 142.1b	23	Dopravné inženýrské opatření - II. etapa / oprava objízdných tras	0,00 Kč	60 662,63 Kč	60 662,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 662,63 Kč	0,00 Kč	60 662,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 403	24	Veřejné osvětlení, Česká Třebová - Soupis prací / Demontáž VO	0,00 Kč	23 990,84 Kč	23 990,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 990,84 Kč	0,00 Kč	23 990,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 990,84 Kč	23 990,84 Kč	23 990,84 Kč	23 990,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	25	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / ul. Prokešova	0,00 Kč	63 610,49 Kč	63 610,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	63 610,49 Kč	63 610,49 Kč	63 610,49 Kč	63 610,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101b	26.1	Silnice II/358, km 1,366 - 4,125 _II. etapa / krajnice z frézinku	-161 322,70 Kč	162 928,88 Kč	1 606,18 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-161 322,70 Kč	162 928,88 Kč	0,00 Kč	324 251,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101c	26.2	Silnice II/358, km 4,125 - 8,060 _III. etapa / krajnice z frézinku	-164 525,34 Kč	165 543,28 Kč	1 017,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-164 525,34 Kč	165 543,28 Kč	0,00 Kč	330 068,62 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101d	26.3	Silnice II/358, km 1,366 - 4,125 _II. etapa / úsek km 2,237 - 2,899 / Krajnice z frézinku	0,00 Kč	65 454,75 Kč	65 454,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	65 454,75 Kč	0,00 Kč	65 454,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101a	27	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / ul. Týrsova	0,00 Kč	40 725,30 Kč	40 725,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	40 725,30 Kč	40 725,30 Kč	40 725,30 Kč	40 725,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 111	28	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací / sjezdůr. nám. č. 2	0,00 Kč	19 361,24 Kč	19 361,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 361,24 Kč	0,00 Kč	19 361,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 111	29	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací / zadržování chodníků a oprava schodů M. Kuděje	0,00 Kč	88 911,09																				

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	33
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Rekonstrukce mostu ev.č. 358-019, km 3,350
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 202/01

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
11120.N	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	370,000	89,00 Kč	32 930,00 Kč	převzato z SO 802

Za zhotovitele:
Podpis:

Za objednatele:
Podpis:

ZÁPIS

Z místního šetření, konaného dne 03.04.2020 na stavbě

"Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová"

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu

1. SO 111 - Přechod u ZŠ km 0,425
 - V PDPS není vyřešen původní sloup VO, který je zde díky novému nadbytečný. Správce stavby požádá AD o vyjádření.
 - Vodící linie pro nevidomé je „vyosená“ a není zakončena v souladu s normou, Zhotovitel zjistí, zda tato skutečnost bude bránit kolaudačnímu souhlasu. AD provede kontrolu projektového řešení se skutečností na stavbě a navrhne zakončení vodící linie pro nevidomé v souladu s normou.
 - U přechodu v km 0,850 chybí vodící linie pro nevidomé.
2. SO 101a – zastávka v km 0,575 – město Litomyšl se dosud nevyjádřilo k požadavku Zhotovitele na upřesnění typu přístřešku. Zhotovitel poskytne kontakt a Správce stavby bude vyjádření urgovat.
3. SO 202
 - Vzhledem ke stavu zábradlí dojde ke snížení výzisků. Zhotoviteli bylo doporučeno stav zdokumentovat.
 - Na římse vlevo na konci objektu ve směru staničení byla objevena geodetická značka, se kterou v PDPS nebylo počítáno. Správce stavby v této věci kontaktuje AD, který napíše zdůvodnění a předloží identifikaci bodu a zakreslí jej do situace. Objednatel následně požádá o její zrušení.
 - V těsné blízkosti SO jsou vzrostlé náletové dřeviny, které bude třeba odstranit. Správce stavby vyzve zhotovitele k předložení návrhu Variace.
 - DO RDS budou nově zpracovány prohloubení základové spáry gabionů.
4. SO 101d – chybí položka krajnic, TDS požádal o nacenění změny týkající se krajnic u SO 101b a to výměnu materiálu krajnic namísto ŠD 0/32 použít výzisk – frézovaný asfalt a dále dopočítat položku krajnic u SO 101d. Dojde tedy k ponížení výzisků frézovaného materiálu. Správce stavby požádá Zhotovitele o předložení návrhu Variace.
5. Z důvodů úspory bylo dohodnuta záměna materiálu na krajnicích na všech objektech z ŠD 0-32 na vyfrézovaný materiál. Správce stavby požádá Zhotovitele o předložení návrhu Variace.
6. SO 101c – křižovatka v km 4,135 se silnicí III/36018
 - Zhotovitel upozornil, že při obnovování krajnice na silnici III/360 vpravo proti směru staničení může dojít k uvolnění svahu, který by mohl bránit zhotovení normové projektované vozovky. Zajištění tohoto svahu si však zajišťuje sama obec Němčice.
 - Ve výkazu výměr chybí v položce č.23 (svodidla) 336m svodidel. Správce stavby požádá AD o vyjádření.
 - V příčných řezech v km 7,650 – 7,975 vpravo je zakreslena silniční obruba takovým způsobem, že je zde stávající obruba, a mělo by se pod ní provést nové bet. lože. V situaci a TZ je uvedeno, že v km 7,419 – 8,060 vpravo nebudou obruby provedeny. Správce stavby požádá AD o vyjádření.
 - V celé délce SO vede v pravém kraji komunikace ve směru staničení sdělovací kabel ve správě CETIN. Ve výkazu výměr chybí položka




- zohledňující ztížení výkopu v blízkosti podzemního vedení (už jen kvůli provádění projektovaných sanací). Správce stavby požádá AD o vyjádření.
- V km 4,175 bylo zhotovitelem zastiženo neodborně zhotovené svedení vody z příkopu do dešťové kanalizace. Zhotovitel kontaktuje vlastníka pozemků, ze kterých je dešťová voda odváděna, výsledek projednání sdělí správci stavby.
7. SO +210 – skutečná poloha sloupu NN je jiná, než je uvažováno v PDPS. V této věci Správce stavby vyzve AD k vyjádření a návrhu řešení. Zároveň Správce stavby vydá Zhotoviteli Požadavek k předložení návrhu variace. Samotný návrh bude zpracován v rámci RDS.
 8. SO 203 – zhotovitel požaduje objasnění způsobu osazení svodidel v místě opěrné zdi. Zejména není zřejmé, že bude dodržena předepsaná vzdálenost svodidel od komunikace. AD se vyjádří k navrhované délce opěrné zdi, neboť svah je mnohem delší než navržená zeď. Dále od opěrné zdi ve směru staničení je v příčných řezech rozšíření krajnice šířky 1,25-1,35 metrů – Zhotovitel zpochybňuje možné provedení s odvoláním na skutečný stav. Správce stavby požádá AD k vyjádření.
 9. Správce stavby požádá AD o zdůvodnění, proč se do projektu nedostala oprava mostu 358-021, který je ve špatném stavu.

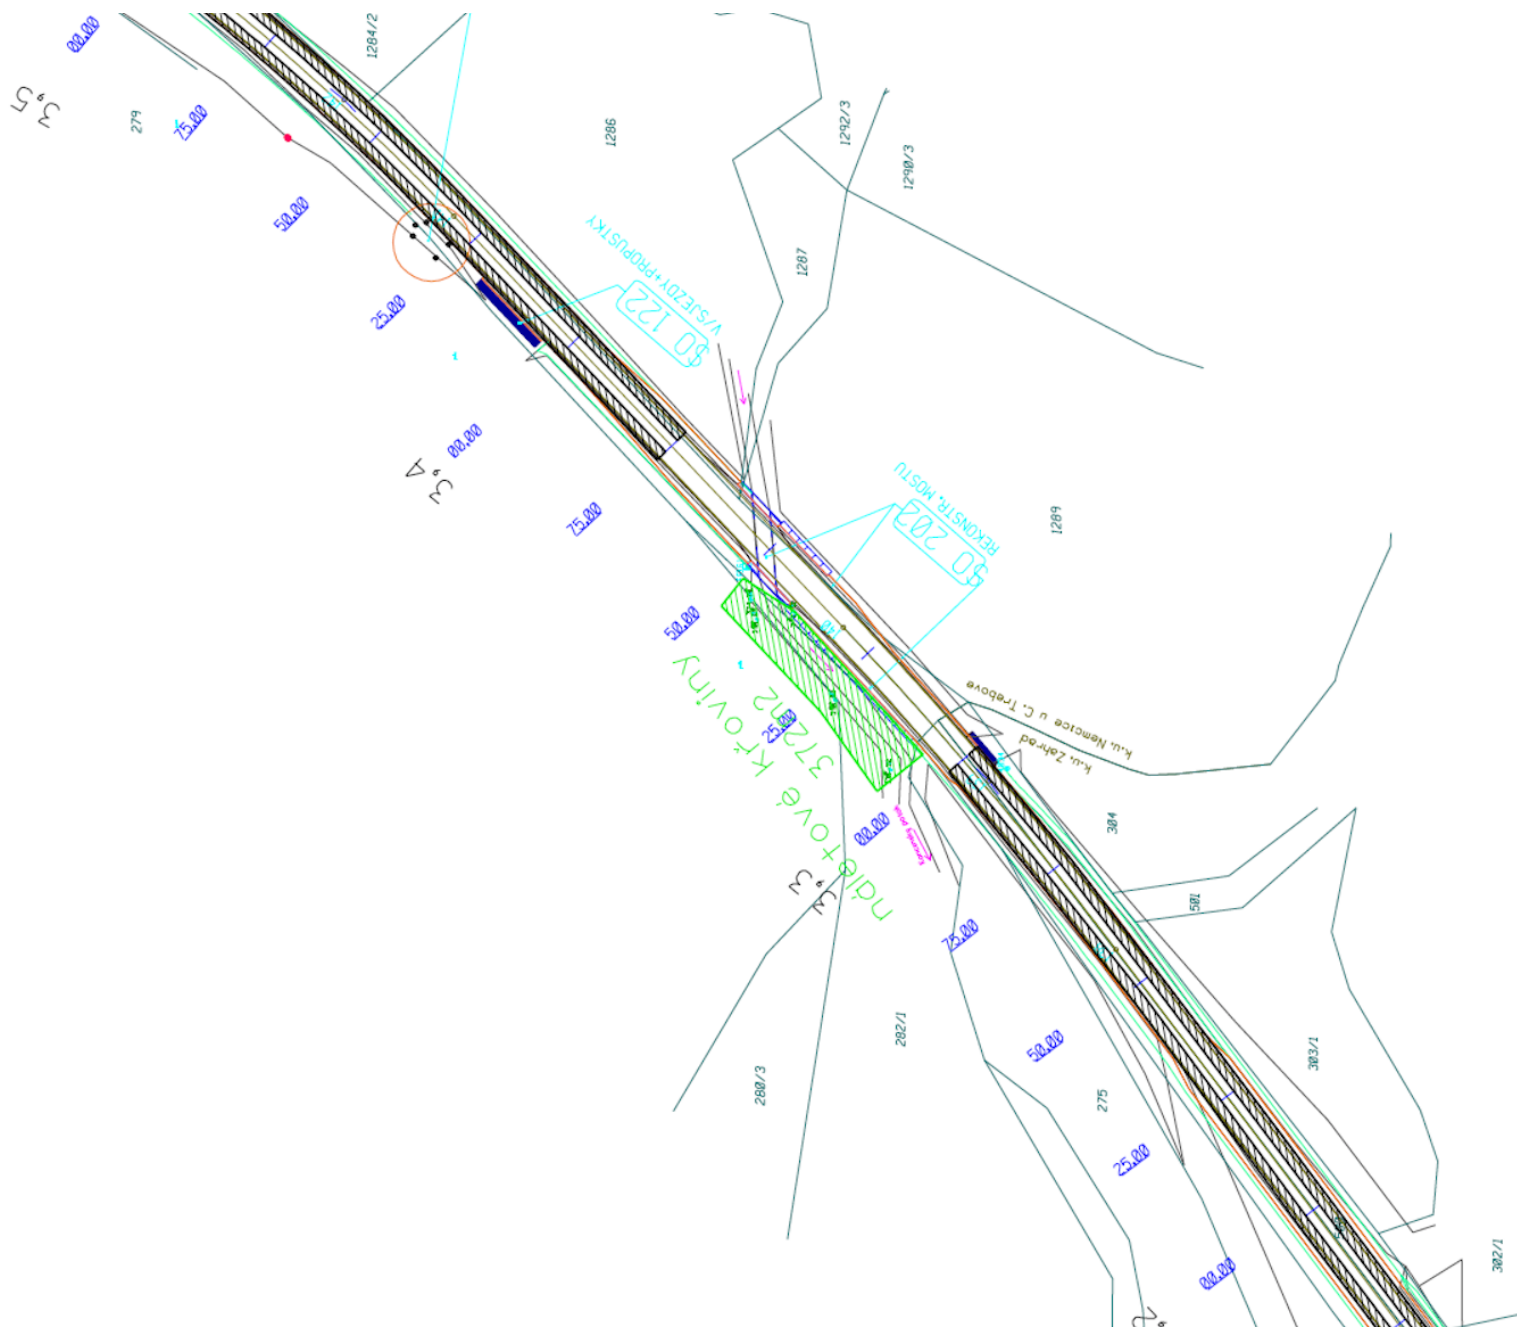
Skončeno, přečteno, podepsáno.

PREZENČNÍ LISTINA

03.04.2020

Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Organizace	Jméno	Kontakt/e-mail	Podpis
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Ing. Milan Skyba	+420 724 105 131	
		milan.skyba@suspk.cz	
M-SILNICE, a.s.	Mgr. Jiří Pokorný	+420 606 680 697	
		jiri.pokorny@msilnice.cz	
Contract management, a.s.	Tomáš Opelka	+420 774 988 894	
		opelka@cmanagement.cz	
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Ing. Kristýna Malinská	+ 420 724 946 065	
		Kristyna.malinska@suspk.cz	
M-SILNICE, a.s.	Ondřej Štol	+ 420 602 465 782	
		Ondrej.stol@msilnice.cz	
MADOS MT s.r.o.	Libor Janeček	+ 603 223 231	
		janecek@madosmt.cz	
MADOS MT s.r.o.	Zdeněk Stránský	+602 238 536	
		stransky@madosmt.cz	
MADOS MT	PETR ROUS		
		ROUS@madosmt.cz	





Stav po vyřezání náletů



Stav před vyřezáním náletů
