

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	25
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/358, km 0,000 - 8,060
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101/14

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Doplňek Opatření obecné povahy vč. schématu ze dne 12.11.2019	2 / 5	
Zápis z KD č. 4 ze dne 06.12.2019	11 / 7	
Fotodokumentace	2 / 18	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/358, km 0,000 - 8,060	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 14	Číslo ZBV: 25
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE Husova 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí		
Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: V rámci provádění stavby v km 0,230-0,300 musel zhotovitel provést úplnou uzavírku opravované komunikace z důvodu nemožnosti provádění prací v rámci uzavírky částečné, protože v této části stavby došlo k nálezů kabelů ČEZ Distribuce, a.s. s nedostatečným krytím a muselo dojít k jejich dochránění (opatření k ochraně kabelů bylo řešeno v ZBV č. 17). Jako objízdna trasa byla využita část ulice Prokešova za účelem zajištění obslužnosti dotčené oblasti. V rámci zvýšené dopravy došlo v ulici Prokešova k poškození silničních obrubníků a výrazné degradaci obrusné vrstvy. Na KD č. 4 vznesl zástupce města Litomyšl požadavek na opravu poškozené části ulice. Z těchto důvodů došlo k výměně poškozených obrub a obnově obrusné vrstvy asfaltbetonu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o požadavek třetí strany (DOSS) k opravě objízdny trasy lze tvrdit, že se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nepředvídané změny na díle nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky. Změna tedy splňuje podmínky nepředvídanosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	0,00 Kč	63 610,49 Kč
		63 610,49 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum: podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum: podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis:
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum: podpis:
		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 14

Evidenční číslo a název stavby: N24190086b - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/358, km 0,000 - 8,060 Číslo a název rozpočtu: SO 101a - Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.14 Skupina Změn: §222, odst. (6)						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0141022	POPLATKY ZA SKLÁDKU ASFALTOVÝ ODPAD	T	3 618,45	3 631,12	12,67	291,00 Kč	1 052 969,53 Kč	0,00 Kč	3 687,55 Kč	1 056 657,08 Kč	3 687,55 Kč	0,40%
3	0141023	POPLATKY ZA SKLÁDKU BETONOVÝ ODPAD	T	38,54	47,56	9,02	297,00 Kč	11 445,49 Kč	0,00 Kč	2 678,94 Kč	14 124,43 Kč	2 678,94 Kč	23,40%
9	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	141,79	185,79	44,00	55,00 Kč	7 798,45 Kč	0,00 Kč	2 420,00 Kč	10 218,45 Kč	2 420,00 Kč	31,00%
11	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	650,84	656,60	5,76	330,00 Kč	214 777,20 Kč	0,00 Kč	1 900,80 Kč	216 678,00 Kč	1 900,80 Kč	0,90%
31	572212	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	6 707,76	6 822,96	115,20	14,00 Kč	93 908,64 Kč	0,00 Kč	1 612,80 Kč	95 521,44 Kč	1 612,80 Kč	1,70%
39	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	142,73	149,13	6,40	95,00 Kč	13 559,35 Kč	0,00 Kč	608,00 Kč	14 167,35 Kč	608,00 Kč	4,50%
52	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	59,45	103,45	44,00	454,00 Kč	26 990,30 Kč	0,00 Kč	19 976,00 Kč	46 966,30 Kč	19 976,00 Kč	74,00%
57	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	142,73	149,13	6,40	67,00 Kč	9 562,91 Kč	0,00 Kč	428,80 Kč	9 991,71 Kč	428,80 Kč	4,50%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						1 431 011,87 Kč	0,00 Kč	33 312,89 Kč	1 464 324,76 Kč	33 312,89 Kč	2,00%
Nové položky													
140	574A44.N	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	0,00	115,20	115,20	263,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 297,60 Kč	30 297,60 Kč	30 297,60 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	30 297,60 Kč	30 297,60 Kč	30 297,60 Kč	100,00%
		Celkem za všechny položky						1 431 011,87 Kč	0,00 Kč	63 610,49 Kč	1 494 622,36 Kč	63 610,49 Kč	4,00%
Za Zhotovitele:							Za Objednatele:						
Datum:							Datum:						

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)																																		
Název a evidenční číslo Stavby:			Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b																															
2=1+19+20 3=(2/1)*100 4=(24/1)*100 5=(39/1)*100	1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	148 047 801,14 Kč	6=30+34		Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ					6 068 166,67 Kč	bez ABS	9=(32/1)*100		Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)					0,00%	limit nepřekročen		12=(28/1)*100		Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)					0,30%	limit nepřekročen			
		Aktuální smluvní částka (cena stavby)	154 563 449,95 Kč	7=(6/1)*100		Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ					4,10%	limit nepřekročen	10=(36/1)*100		Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídáné dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)					4,51%	limit nepřekročen		13=28		Sledování čerpání limitu (ABS)					22 207 170,17 Kč	447 482,14 Kč	limit nepřekročen		
		Procento změny Přijaté smluvní částky	104,40%	8=1*0,3		Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ					44 414 340,34 Kč		11=1*0,5		Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ					74 023 900,57 Kč				14=149224000-28		Zbývá do vyčerpání limitu					22 207 170,17 Kč	21 759 688,03 Kč		
		Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%																															
		Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%																															
15 % z Přijaté smluvní částky			22 207 170,17 Kč			Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)					Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ					Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ					Změny nepředvídáné dle § 222 odst. (6) ZZVZ					Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ					OK v limitu			
SO	ZBV č.	Název SOPS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných			
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28=(25/26	29	30	31=29+30	32=(29+30	33	34	35=33+34	36=(33+34	37	38	39=37+38											
			-302 299,50 Kč	6 817 948,31 Kč	6 515 6																													

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	25
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Silnice II/358, km 0,000 - 8,060
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 101/14

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
574A44.N	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	115,200	263,00 Kč	30 297,60 Kč	převzato z SO 131

Za zhotovitele:
Podpis:

Za objednatele:
Podpis:

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL
odbor místního a silničního hospodářství

Bří Šťastných 1000
570 20 Litomyšl

Tel.: 461 653 333

Č.j.: **MěÚ Litomyšl 101245/2019**

Vyřizuje: Ing. Miloslav Cink

Tel.: 461 653 365, 724 385 499

E-mail: miloslav.cink@litomysl.cz

Datum: 12.11.2019

Doplněk č. 1
VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY
Opatření obecné povahy

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, věcně a místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností dle § 77 odst. 1 písm. c) a dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění (dále jen zákon o silničním provozu), jako příslušný silniční správní úřad na základě žádosti spol. **M-SILNICE a.s., (IČ: 421 96 868), Husova 1697, 530 03 Pardubice** doplňuje

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

vydané pod č.j. **MěÚ Litomyšl 71978** dne **22.8.2019** o umístění přechodného dopravního značení dle příloh (schéma č. 7 a 8), která jsou nedílnou součástí tohoto stanovení.

Schéma č. 7:

platnost úpravy: 21. – 28.10.2019

důvod dopravního omezení: nutnost úplné uzavírky silnice II/358 v úseku od světelné křižovatky po ul. Prokešova v obci Litomyšl.

Schéma č. 8:

platnost úpravy: 4. – 25.11.2019

důvod dopravního omezení: nutnost úplné uzavírky silnice II/358 v úseku od Smetanova náměstí po ul. Lidická v obci Litomyšl.

Přechodná úprava provozu bude provedena za těchto podmínek:

Ve všech bodech platí stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané pod č.j. **MěÚ Litomyšl 71978** dne **22.8.2019**.

Za splnění podmínek tohoto stanovení dopravního značení zodpovídá:

odpovědná organizace: **MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí**

odpovědná osoba: **Roman Fišer, TM 603 153 228**

otisk úředního razítka

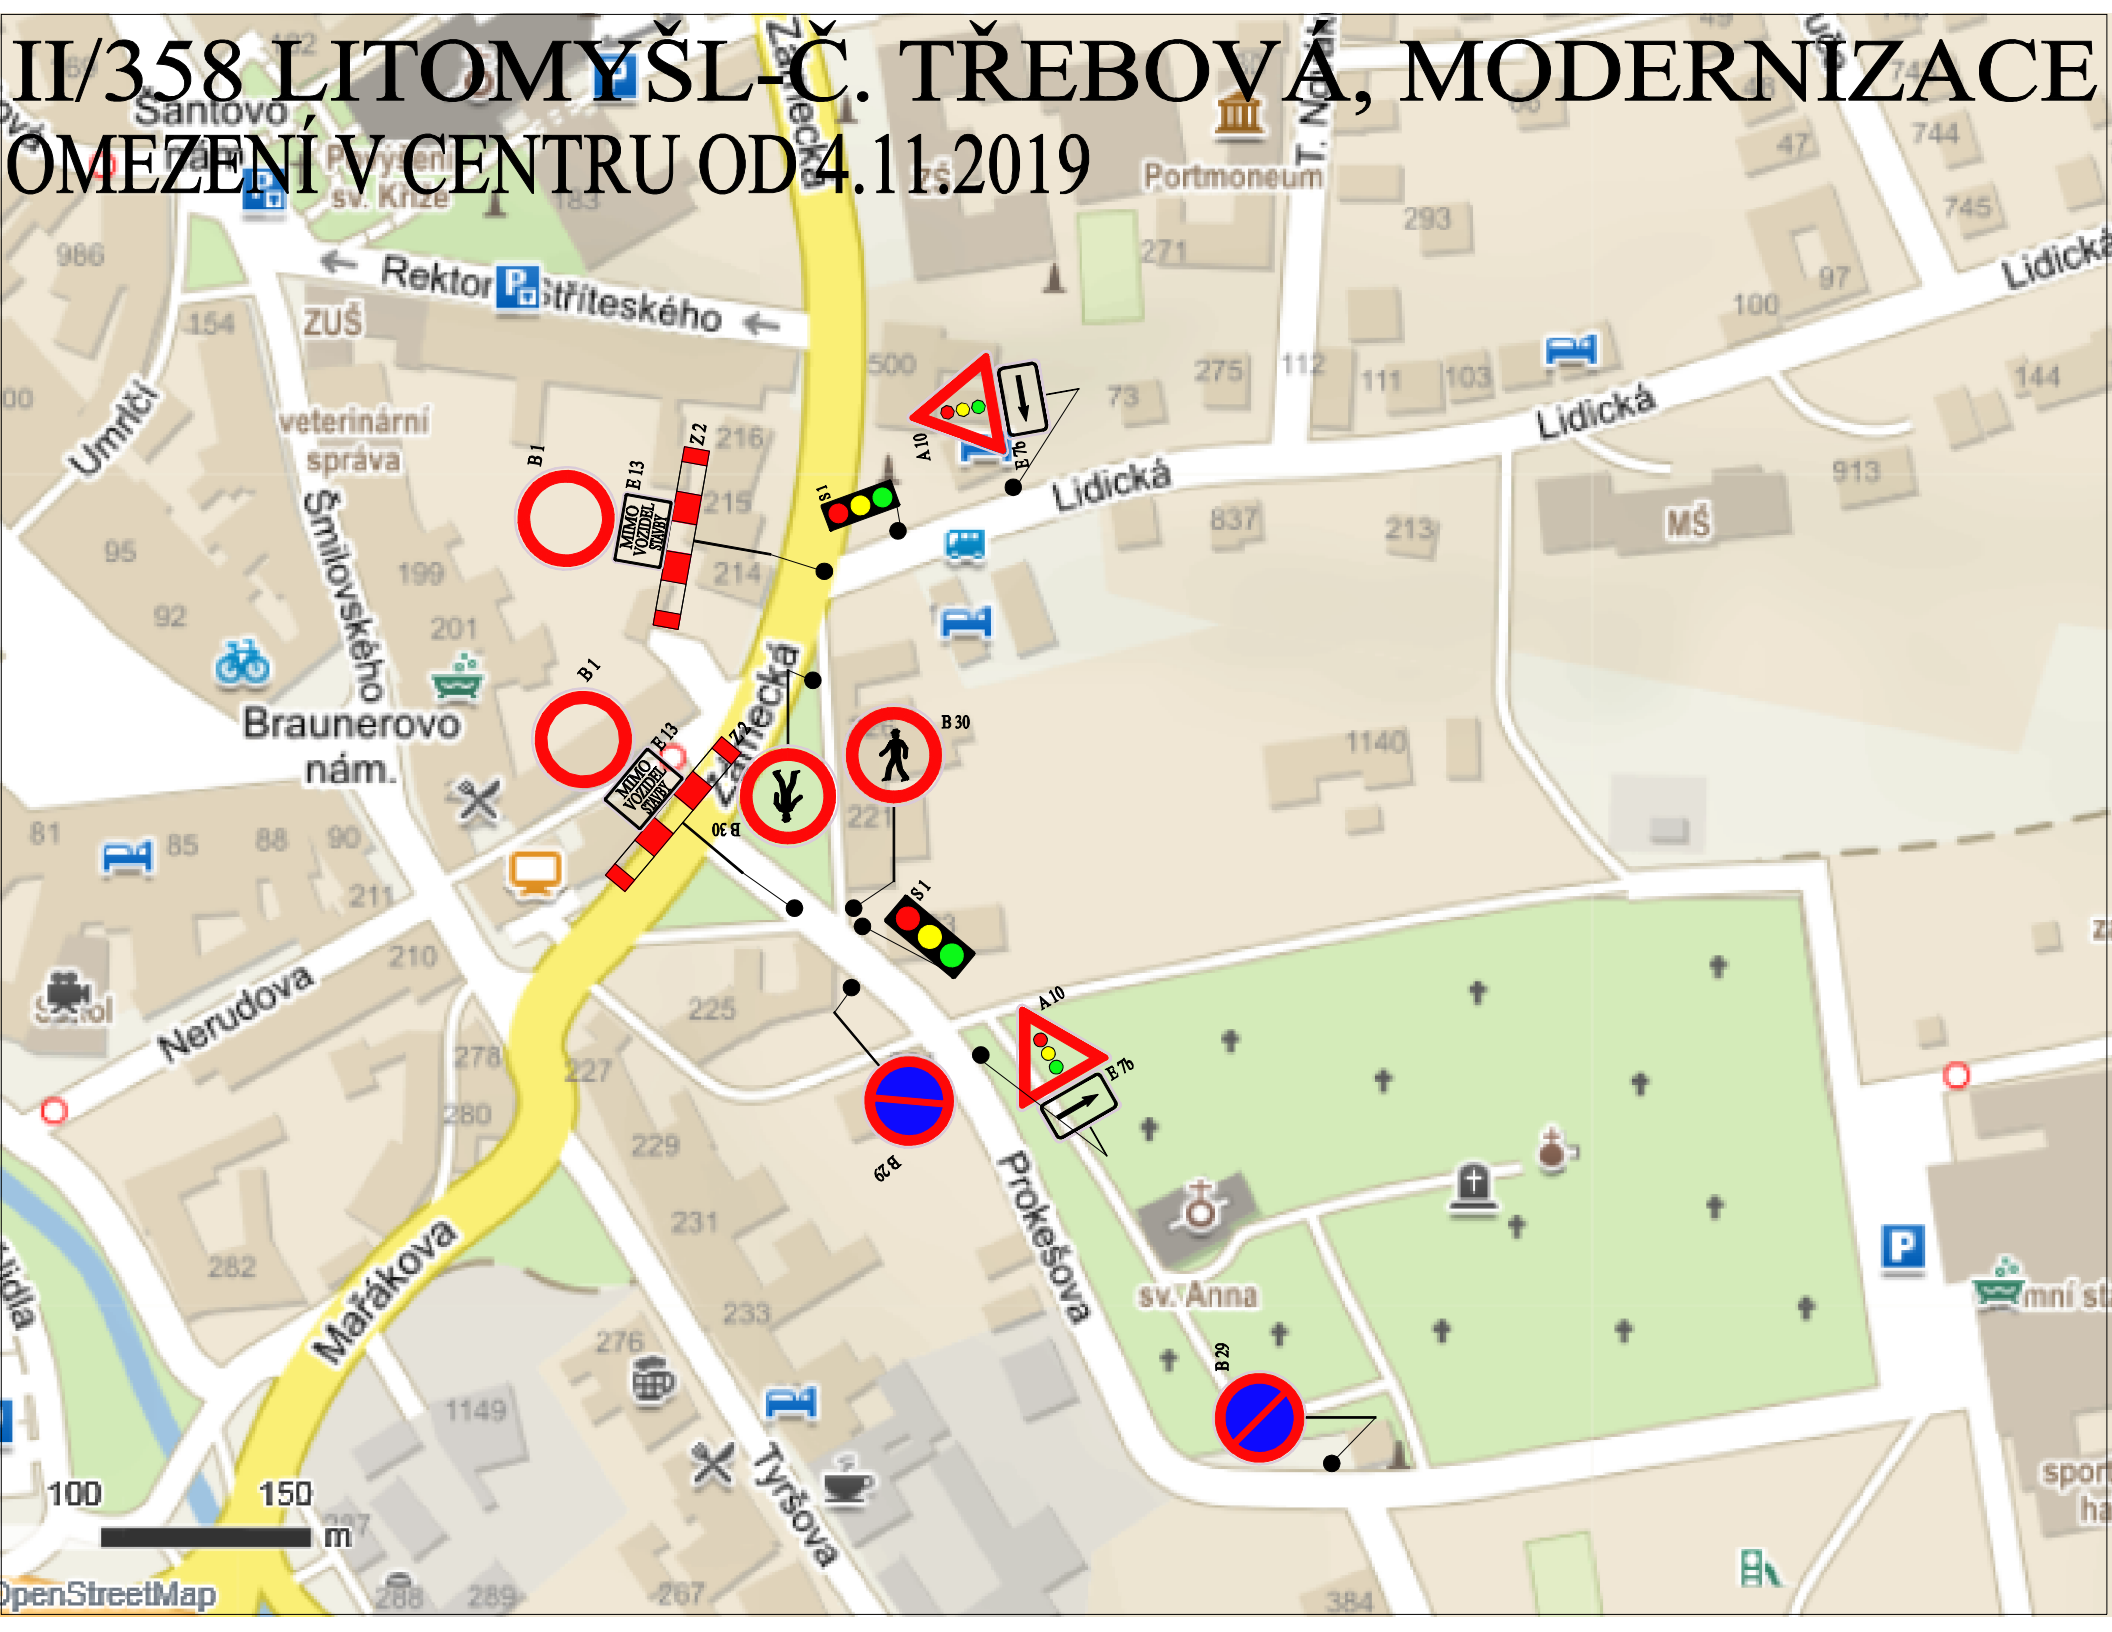
Ing. Miloslav Cink
referent odboru

Obdrží:

- M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice (žadatel)
- MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Policie ČR, dopravní inspektorát Svitavy, Purkyňova 2, 568 14 Svitavy
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Litomyšl, T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl
- Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

Příloha: situační plánky s rozmístěním přechodného dopravního značení (schéma č.7 a 8)

II/358 LITOMYŠL-Č. TŘEBOVÁ, MODERNIZACE OMEZENÍ V CENTRU OD 4.11.2019



ZÁPIS z kontrolního dne č. 4 konaného dne 06.12.2019

Stavba: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Místo: MěÚ Litomyšl

Účast: [viz prezenční listina]

Program:

- 1/ Konstatování současného stavu stavby
- 2/ Kontrola kvality
- 3/ Stav BOZP a PO
- 4/ Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni
- 5/ Vyjádření a připomínky účastníků
- 6/ Termín příštího kontrolního dne

1. Konstatování současného stavu stavby			
Úkol číslo	Název	Popis úkolu	Výsledek projednání
1.13	Odvodnění vjezdu	Odvodnění sjezdu vpravo u světelné křižovatky v km 0,075.	Během pochůzky v místě stavby bylo rozhodnuto, že nebude nutné sjezd odvodňovat samostatným žlabem. Dostačujícím opatřením bude obnovení funkčnosti kanalizační vpusti v tomto místě. Zhotovitel tuto vpust' pročistí, zhodnotí stav a bude informovat TDS, případně Správce stavby. AD předložil návrh řešení. Zhotovitel byl vyzván k předložení návrhu Variace. Dále viz bod 4.1.
3.2	Snížení obruby před objekty č. p. 217 a 216	Změna provedení chodníku č. 2 v Litomyšli	Zhotovitel navrhnul změnu v provedení chodníku a obrub v ulici Zámecké před objekty č. p. 217 a 216 v úseku km 0,315 – 0,330. Obruby měly být v souladu s projektovou dokumentací sníženy izolovaně pro účely dvou samostatných vjezdů k výše uvedeným objektům. Oproti PDPS má dojít z důvodu zajištění větší životnosti Díla ke spojení obou vjezdů do jednoho společného Správce stavby s návrhem souhlasí a dne 04.11.2019 požádal silniční správní úřad o stanovisko k této změně. Silniční správní úřad se k této změně souhlasně vyjádřil dne 08.11.2019.

			Zhotovitel v souvislosti s touto změnou nevyčíslil žádné Náklady ani nepředložil časové nároky. Změna tudíž nebyla předmětem Variace.
3.3	Stížnost	Stížnost na nasazení nízkého počtu Personálu Zhotovitele v Litomyšli	Opětovná stížnost veřejnosti na nasazení nízkého počtu personálu na Stavbě (bod zařazen na přání starosty města). Veškeré realizovatelné úseky se provádějí a domluvené termíny jsou zatím dodržovány. Tento bod se vypouští.
3.4	Požadavek města Litomyšl	Oprava účelové komunikace kolem tzv. Staré plovárny a chodníku mezi ulicemi Mařákova – Tyršova v Litomyšli	Město Litomyšl vzneslo požadavek na následující práce nad rámec PDPS, které mají spočívat v opravách: • účelových komunikací kolem tzv. Staré plovárny, tyto komunikace odlehčovali provoz po silnici II/358 i po jeho místních komunikacích. Na jaře letošního roku investovalo Město Litomyšl do oprav frézovanou drtí cca 200 000 Kč, • chodníku na křižovatce ulic Mařákova - Tyršova. Po dohodě se stavbou tady byl dočasně zřízen jediný možný příjezd do ulice Tyršova, chodník je tímto značně poničen. Objednatel s opravou objízdných tras souhlasí za předpokladu, že jsou trasy součástí DIO v rámci přechodné úpravy provozu. Silniční správní úřad se zavázal aktualizovat OOP na základě změn provedených během realizace Stavby v přechodné úpravě silničního provozu. Ze strany silničního správního úřadu došlo k aktualizaci objízdných tras.
3.5	Žádost o finanční kompenzaci	Salon Blanka a Pavla v Litomyšli žádá náhradu škody (způsobenou poklesem tržeb)	Žádost o náhradu škody, která měla vzniknout v důsledku poklesu tržeb, které mají podle žadatelky souviset s uzavírkami v intravilánu Litomyšle. Správce stavby vyjádřil pochopení, nicméně s odkazem na § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: „Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížděky“ celou věc bez dalšího uzavřel. Tento bod se vypouští.

3.6	Propad podkladní vrstvy	V ulici Zámecká na SO 101a došlo k propadu podkladní vrstvy vozovky	K propadu došlo zřejmě v důsledku přítomnosti sklepních prostor po zaniklé zástavbě v blízkosti zámku. Zhotovitel sdělil, že bude v souvislosti s tím kontaktovat archeologický dohled. Došlo k zajištění propadu. Tento bod se vypouští.
3.7	Poškození veřejné zeleně v České Třebové	V lokalitě U Besedy v České Třebové byla poničena plocha veřejné zeleně	Podle vyjádření Zhotovitele byla veřejná zezeň poničena jedním z Podzhotovitelů. Do konce listopadu Zhotovitel přislíbil obnovení veřejné zeleně. Věc bude komunikována mezi odborem životního prostředí a konkrétním Podzhotovitelem. Zhotovitel se zavázal obnovit poničené záhony se zelení v roce 2020, a to ve spolupráci s odborem životního prostředí.
4.1	Variace č. 13, 14, 15, 16	Pokyny k provedení Variací	Dne 11.11.2019 Zhotovitel předložil návrh Variací č. 13,14,15 a 16: • Variace č. 13 spočívá v pokládce separační geotextilie na SO 101a v km 0,775-1,100; • Variace č. 14 spočívá v odvodnění podjezdu pod viaduktem v rámci SO 102 v km 11,446-11,460; • Variace č. 15 spočívá v provedení vyrovnávací vrstvy asfaltobetonu v rámci SO 101a v km 0,000 – 0,200; • Variace č. 16 spočívá v odvodnění vjezdu v rámci SO 101a v km 0,071. K provedení všech výše uvedených Variací byl dne 12.11.2019 vydán ze strany Správce stavby pokyn.
4.2	Variace č. 17	Pokyn k provedení Variace	Zhotovitel dne 14.11.2019 oznámil Správci stavby přerušeni prací v rámci SO101a v km 0,250-0,300, a to z důvodu zjištění kabelů, které jsou ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Tyto kabely, které nebyly PDPS předpokládány, měly podle Zhotovitele nedostatečné krytí, nebyly položeny do pískového lože a nebyly obsypány ani opatřeny výstražnou páskou. Variace č. 17 spočívá v provedení dostatečné ochrany a v zakrytí zjištěných kabelů. Správce stavby vydal dne 15.11.2019 pokyn k provedení Variace č. 17.
4.3	Požadavek občana Litomyšle	Úprava chodníku před domem Zámecká č. p. 216	Občan si stěžuje, že v důsledku zvýšení nivelety komunikace a chodníku se jeho pozemek nachází pod její úrovní, což může způsobit zaplavení pozemku vodou, která poteče po komunikaci a překročí výšku obruby. Občan požaduje navrácení stavu nivelet do původního stavu.

			Požadavek byly ze strany Správce stavby na osobním jednání s občanem vypořádán.
4.4	Odmítnutí řemeslného zpracování v České Třebové	Odmítnutí řemeslného zpracování patek SDZ v České Třebové	Na podnět TDS ze dne 22.11.2019 došlo ze strany Správce stavby k odmítnutí řemeslného zpracování patek SDZ, které byly provedeny neesteticky a pod úrovní okolního terénu. Řemeslné zpracování patek SDZ bylo Zhotovitelem opraveno a je v souladu se Smlouvou.
4.5	Připomínka města Litomyšl	Zvýšený průjezd nákladních vozidel po místních komunikacích	V souvislosti se zásobováním Stavby došlo podle zástupce města Litomyšl v týdnu od 18.11.2019 ke zvýšenému průjezdu nákladních vozidel po místních komunikacích ve vlastnictví města. Zástupce města upozorňuje, že pokud městu vzniknou škody na jeho majetku, bude nárokovat jejich náhradu. Zároveň žádá, aby byl návoz materiálu na Stavbu přednostně veden prostorem Stavby.
4.6	Požadavek města Litomyšl	Změny v napojení místních komunikací v ulicích P. Bezruče a T. Novákové na silnici II/358	Zástupci města Litomyšl požádali o provedení úprav v napojení ulic P. Bezruče a T. Novákové oproti projektové dokumentaci. V případě úpravy u ulice P. Bezruče má dojít k rozšíření napojení ulice posunutím levého oblouku s chodníkem přibližně o 1 m směrem doleva (směrem do parku). V případě úpravy u ulice T. Novákové má dojít k rozšíření napojení ulice zmenšením rozměrů naváděcího ostrůvku na levé straně, čímž dojde ke zvětšení průjezdného profilu. K této změně se souhlasně vyjádřil silniční správní úřad, AD i Objednatel. Následně byl Správcem stavby dne 28.11.2019 vydán pokyn k provedení Variace č. 18.
4.7	Stížnost města Litomyšl	Omezení v obousměrném provozu ulicí V. K. Jeřábka	Zástupce města Litomyšl vytýká emailem ze dne 02.12.2019 Zhotoviteli, že v obousměrně průjezdné ulici V. K. Jeřábka nadále dochází k provádění prací v takovém rozsahu, že znemožňují průjezd osobních vozidel a autobusů. Na tuto stížnost reagoval téhož dne Zástupce zhotovitele emailem, kde uvádí, že ačkoli měl na tuto ulici stále platnou objízdnu trasu, snažil se ji pro rezidenty a autobusovou dopravu otevřít pro průjezd dříve. Zhotovitel je toho názoru, že je lepší rezidenty omezit dokončovacími pracemi za provozu než jim průjezd zamezit zcela.

			Tento bod se vypouští.
4.8	Požadavek města Litomyšl	Požadavek na opravu chodníku mezi ulicemi Lidická a Prkenná	Zástupce města Litomyšl vznesl požadavek na opravu chodníku mezi ulicemi Lidická a Prkenná. Chodník podle něj těsně přiléhá k rekonstruovanému úseku silnice a byl jednoznačně poničen při provádění prací, zejména skládáním materiálu a stavební technikou. Proběhla zde pasportizace. Zhotovitel se zavázal na své náklady chodník opravit, ačkoli nesouhlasí s tím, že odpovídá za poničení chodníku.
4.9	Požadavek města Litomyšl	Požadavek na opravu spojovací komunikace ulic Prokešova a Lidická	Zástupce města Litomyšl vznesl požadavek na opravu spojovací komunikace ulic Prokešova a Lidická. podle něj byl průjezd touto komunikací jedinou možností zajištění dopravní obslužnosti dané lokality. Při průjezdu došlo k celkovému poškození komunikace i obrub. Bude provedena oprava všech komunikací, které byly vedeny jako objížděné trasy.
4.10	Požadavek občana Litomyšle	Požadavek na úpravu vjezdu do garáže na Jiráskově náměstí č. p. 2	Dne 05.12.2019 byla obdržena stížnost občana na provedení napojení v případě garáže u Jiráskova náměstí č. p. 2 na komunikaci. Výška obruby a sklon dodláždění podle občana neodpovídá technickým normám, navíc je provedení neestetické. Proběhlo místní šetření, na kterém byla ze strany TDS a projektanta navržena úprava sklonu včetně předláždění napojení.
4.11	Požadavek občana Litomyšle	Požadavek na úpravu odvodnění prostoru před objektem na Jiráskově náměstí č. p. 6.	Podle názoru občana doručeném emailem dne 03.12.2019 dojde v důsledku provedení retardéru v místě křížení ulic V. K. Jeřábka s M. Kuděje a v důsledku změny umístění kanalizační vpusti k vytvoření prostoru, kde se bude v případě přívalových dešťů držet voda, čímž dojde k poškození obvodové zdi a zatopení nemovitosti. Proběhlo místní šetření, na kterém bylo konstatováno, že v dané lokalitě není vhodně vyřešeno odvodnění místní komunikace v ulici M. Kuděje. Občan byl seznámen s tím, že je nezbytná úprava kanalizace, která ale není záležitostí předmětné modernizace komunikace II/358 a bude tak řešena samostatně městem Litomyšl.

4.12	Požadavek občana Litomyšle	Požadavek na náhradu škody způsobené silničním provozem na objektu na Jiráskově náměstí č. p. 6.	Občan nárokuje emailem ze dne 21.11.2019 náhradu škody, která podle něj vznikla v důsledku povolení obousměrného provozu v ulici M. Kuděje. Na obvodové zdi nemovitosti došlo podle občana k odření omítky, utržení rohu a okapu. Proběhlo místní šetření, na kterém byl občan seznámen s tím, že Objednatel ani Zhotovitel nenese odpovědnost za škody na nemovitosti způsobené 3. osobou.
4.13	Požadavek občana Litomyšle	Požadavek na úpravu napojení ulice Rektora Stříteského na silnici II/358	Na žádost občana bude s projektantem projednána změna napojení místní komunikace a navazujícího chodníku v ulici Rektora Stříteského. Důvodem je obava vlastníka z hrozících škod na nemovitosti způsobených vodou tekoucí po komunikaci při přívalových deštích. Proběhlo místní šetření, na kterém byla ze strany TDS a projektanta navržena úprava napojení komunikace i chodníku.
4.14	Vady Díla ve městě Česká Třebová	Upozornění na vady Díla v ulici Litomyšlská	Zástupce města Česká Třebová zaslal dne 05.12.2019 Správci stavby fotodokumentaci částí Díla v ulici Litomyšlská, která nepovažuje za řádně provedenou. Konkrétně: • propadá dlažba ve vjezdu u bývalé restaurace Beseda; • chybějící obrubník v nově vzniklém ostrůvku u Besedy; • neupravený překop po pokládce kabelu k VO na přechodu pro chodce; • nadbytečná původní lampa VO osvětlující přechod v zeleném pásu. S vytknutými vadami byl seznámen TDS. Vady budou po domluvě se Zhotovitelem odstraněny po skončení zimní technologické přestávky.
4.15	Variace č. 19, 20	Pokyny k provedení Variací	Dne 04.12.2019 Zhotovitel předložil návrhy Variací č. 19 a 20: • Variace č. 19 spočívá v provedení sanační vrstvy v rámci objektu SO 101a v km 0,774 – 0,366 z důvodu zjištění nedosažených hodnot, které stanovuje PDPS; • Variace č. 20 spočívá v odstranění asfaltobetonových ploch a nestmelených vrstev v rámci SO 102, a to z důvodu nesprávných výpočtů, které byly použity při odstraňování konstrukčních vrstev stávající komunikace.

K provedení všech výše uvedených Variací byl dne 09.12.2019 vydán ze strany Správce stavby pokyn.

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací	<u>SO 101a, SO 111, SO 401 - Litomyšl</u> - km 0,000 – 0,197 - dokončovací práce na chodnících - km 0,197 – 0,400 - dokončení konstrukčních vrstev komunikace včetně vrstvy SC 0/32 C8/10 - pokládka podkladní a ložné vrstvy asfaltobetonu v pravé polovině jízdního pruhu ve směru na Českou Třebovou (směsi ACP 22 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm a směs ACL 16 CRmB v tl. 70 mm) - pokládka obrusné vrstvy v celé ploše úseku (směs SMA 8 NH 45/80-65 v tl. 30 mm) - km 0,400 – 0,590 - provedení konstrukčních vrstev komunikace včetně stabilizační vrstvy SC 0/32 C8/10 před vjezdem do provozovny Kubík - km 0,774 – 1,366 - dokončení všech konstrukčních vrstev komunikace včetně všech sanací a vrstvy SC 0/32 C8/10 - pokládka podkladní a ložné vrstvy asfaltobetonu (směsi ACP 22 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm a směs ACL 16 CRmB v tl. 70 mm) <u>SO 102, SO 113, SO 403 - Česká Třebová</u> - km 11,470 – 11,968 - pokládka podkladní a ložné vrstvy asfaltobetonu (směsi ACP 22 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm a směs ACL 16 CRmB v tl. 70 mm) - pokládka obrusné vrstvy v celé ploše úseku (směs SMA 8 NH 45/80-65 v tl. 30 mm) - provedení svislého a vodorovného dopravního značení mimo zdršňovacího nátěru u přechodů pro chodce - provedení veřejné osvětlení - provedení kompletních zahradních úprav
b) finanční plnění	-
c) předávání RDS	Na stavební objekty prováděné v rámci I. etapy – v kalendářním roce 2019 nebude zhotovitel z časových důvodů zpracovávat RDS.
d) fotodokumentace	Předložena Zhotovitelem Správci stavby.

2. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Práce dosud probíhaly v souladu se schválenými TePř a VTD.
--	--

3. Stav BOZP a PO

Koordinátor BOZP požádal Zhotovitele o sdělení bezpečnostního režimu pro zajištění Staveniště od 20.12.2019 do konce zimní technologické přestávky. Dále koordinátor BOZP připomněl Zhotoviteli povinnost kontrolovat stav DIO v týdenních intervalech.

4. Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni

Úkol číslo	Název	Popis úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1.1				
1.2				
1.3				
1.4				

5. Vyjádření a připomínky účastníků

Účastník	Vyjádření, připomínky, ostatní
Správce stavby	Správce stavby požádal Zhotovitele o předložení Souhrnné závěrečné zprávy pro SO 102. Zhotovitel se ji zavázal předložit do 25.01.2020.
Zástupce města Litomyšl	Podle zástupce města Litomyšl chybí na zprůjezdněných úsecích od světelné křižovatky dostatečné osazení SDZ. Podle Zhotovitele jde nadále o stavbu, nikoli o zkolaudovanou komunikaci a řidiči tomu musí přizpůsobit svoji jízdu.
Zástupce města Litomyšl	Zástupce města Litomyšl vznesl otázku na zimní údržbu zprovozněných úseků. Zhotovitel se zavázal, že po dobu provádění prací před zimní technologickou přestávkou v intravilánu Litomyšle bude zimní údržbu komunikace na Staveništi zajišťovat on. Bude uzavřena dohoda mezi Objednatel a Zhotovitelem o zimní údržbě.
Zástupce města Litomyšl	V týdnu od 09.12.2019 bude svoláno jednání se starostou obce Němčice ohledně trvání objízdných tras po dobu zimní technologické přestávky.

6. Termín příštího kontrolního dne

Datum konání příštího KD	10.01.2020
Čas konání příštího KD	10:00
Místo konání příštího KD	MěÚ Litomyšl

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku.

Zapsal:

Tomáš Opelka

Jméno



Podpis

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina




Rozdělovník




viz. Prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA

Kontrolní den č. 4 konaný dne 06.12.2019

Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Organizace	Jméno	Kontakt/e-mail	Podpis
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Ing. Milan Skýba	+420 724 105 131	
		milan.skyba@suspk.cz	
M-SILNICE, a.s.	Mgr. Jiří Pokorný	+420 606 680 697	
		jiri.pokorny@msilnice.cz	
Contract management, a.s.	Tomáš Opelka	+420 774 988 894	
		opelka@cmanagement.cz	
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.	Ing. Michal Jonáš	+420 602 218 638	
		michal.jonas@rhdhv.com	
M-SILNICE, a.s.	Josef Řezníček	+420 602 381 345	
		josef.reznicek@msilnice.cz	
Contract management, a.s.	Mgr. et. Mgr. Martin Altmann	+420 603 814 379	
		altmann@cmanagement.cz	
GEODROM s.r.o.	Ing. Jiří Habrovec	+420 604 235 851	
		habrovec@geodrom.cz	
MANIFOLD GROUP s.r.o.	Ing. Pavel Matuška	+420 602 171 295	
		matuska@manifold.cz	
CONTRACT MANAGEMENT	PETR KOPECKÝ	604 478 235	
		KOPECKY@CMANAGEMENT.CZ	
SUSPK	David Jarka	728 33 9607	
		david.jarka@suspk.cz	

Organizace	Jméno	Kontakt/e-mail	Podpis
Město Litomyšl DMA SH	Miloslav Cink	miloslav.cink@litomysl.cz	
Město Litomyšl	Pavel Jirana	pavel.jirana@litomysl.cz	
- II -	ROSTISLAV ŠIMON	rostislav.simon@litomysl.cz	
- II -	Michal Horcik	Michal.Horcik@litomy	
II-SILNIČNÍ a.s.	LUKÁŠ HORČÍK	Lukas.horcik@msilnice.cz	
- II -	Luboš Mikulecký	luboš.mikulecky@msilnice.cz	
Město Čáslav STŘEŽBÍK	LUDMIL SVRCH	ludmil.svrch@cska-tubova.cz	
MADOS MT s.r.o.	ROUS PETR	ROUS@MADOS.MT.CZ	

Organizace	Jméno	Kontakt/e-mail	Podpis
M - SILNICE	ONDŘEJ ŠTOL	ONDREJ.STOL@MSILNICE.CZ 602 465 782	



