

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	47
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úpravy sjezdů vč. propustků
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 122/04

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis oceněná změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Zápis z Kontrolního dne ze dne 03.04.2020	10 / 5	
Rozhodnutí Odboru místního a správního hospodářství Litomyšl ze dne 15.06.2020	5 / 15	
Pokyn Správce stavby k provedení Variace ze dne 10.07.2020	2 / 20	
Fotodokumentace	4 / 22	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy sjezdů vč. propustků	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 122 / 04	Číslo ZBV: 47
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE Husova 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí		
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: Starosta obce Němčice vznesl na Kontrolním dni č. 8 dne 03.04.2020 požadavek na zachování přístupu k vodojemu za účelem jeho údržby. Požadavek byl projednáván i na následujících Kontrolních dnech. Pro provedení sjezdu bylo nutné získat povolení od Odboru místního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl, který byl dne 15.06.2020 vydán. Na základě tohoto rozhodnutí Správce stavby vydal Pokyn k provedení Variace dne 10.07.2020. Propustek byl proveden z trouby DN500, materiál PP. Čela propustku byla zpevněna lomovým kamenem osazeným do betonu. Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že se jedná o dodatečný požadavek účastníka výstavby. Z tohoto důvodu lze tvrdit, že se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nepředvídané změny na díle nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky. Změna tedy splňuje podmínky nepředvídanosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	0,00 Kč	44 229,87 Kč
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem		
44 229,87 Kč		
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum: podpis: Tomáš Opelka
		Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2020.12.03 13:10:29 +01'00'
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis: Ing. Milan Skýba
		Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2020.12.03 16:41:45 +01'00'
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis: Ing. Milan Skýba
		Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2020.12.03 16:42:20 +01'00'
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum: podpis: Ing. Martin Krejčí
		Digitálně podepsal Ing. Martin Krejčí Datum: 2020.12.03 12:01:53 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis: Ing. Jiří Synek
		Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2020.12.04 09:41:48 +01'00'
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum: podpis: Mgr. Jiří Pokorný
		Digitálně podepsal Mgr. Jiří Pokorný Datum: 2020.12.03 07:56:37 +01'00'
		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04

Evidenční číslo a název stavby: N24190086b - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 122 - Úpravy sjezdů vč. propustků								č.04					
Číslo a název rozpočtu: SO 122 - Úpravy sjezdů vč. propustků - Soupis prací								Skupina Změn: §222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	544,64	553,64	9,00	151,00 Kč	82 240,64 Kč	0,00 Kč	1 359,00 Kč	83 599,64 Kč	1 359,00 Kč	1,70%
9	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 000,71	1 006,71	6,00	15,00 Kč	15 010,62 Kč	0,00 Kč	90,00 Kč	15 100,62 Kč	90,00 Kč	0,60%
19	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	52,85	55,04	2,18	2 975,00 Kč	157 237,68 Kč	0,00 Kč	6 491,45 Kč	163 729,13 Kč	6 491,45 Kč	4,10%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						254 488,94 Kč	0,00 Kč	7 940,45 Kč	262 429,39 Kč	7 940,45 Kč	3,00%
Nové položky													
159	17581.N	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00	8,36	8,36	1 097,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 170,92 Kč	9 170,92 Kč	9 170,92 Kč	100,00%
160	465512.N	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,00	3,00	3,00	888,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 664,00 Kč	2 664,00 Kč	2 664,00 Kč	100,00%
163	451314.N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,00	3,90	3,90	4 035,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 736,50 Kč	15 736,50 Kč	15 736,50 Kč	100,00%
222	87457.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	0,00	6,00	6,00	1 453,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 718,00 Kč	8 718,00 Kč	8 718,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	36 289,42 Kč	36 289,42 Kč	36 289,42 Kč	400,00%
		Celkem za všechny položky						254 488,94 Kč	0,00 Kč	44 229,87 Kč	298 718,81 Kč	44 229,87 Kč	17,00%
Za Zhotovitele: Mgr. Jiří Pokorný Datum: 07:57:25 +01'00'								Za Objednatele: Ing. Milan Skýba Datum: Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2020.12.03 16:42:46 +01'00'					

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)	
--	--

Poznámka	Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.
----------	--

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	47
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Úpravy sjezdů vč. propustků
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 122/04

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
17581.N	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,360	1 097,00 Kč	9 170,92 Kč	převzato z SO 121
451314.N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,900	4 035,00 Kč	15 736,50 Kč	převzato z SO 121
465512.N	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,000	888,00 Kč	2 664,00 Kč	převzato z SO 121
87457.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	6,000	1 453,00 Kč	8 718,00 Kč	převzato z SO 121_04

Za zhotovitele:
Podpis:

Mgr. Jiří Pokorný
Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Pokorný
Datum: 2020.12.03
07:59:55 +01'00'

Za objednatele:
Podpis:

Ing. Milan Skýba
Digitálně podepsal
Ing. Milan Skýba
Datum: 2020.12.03
16:43:16 +01'00'

ZÁPIS z kontrolního dne č. 8 konaného dne 03.04.2020

Stavba: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Místo: distančně elektronickou formou

Účast: [viz prezenční listina]

Program:
1/ Konstatování současného stavu stavby
2/ Kontrola kvality
3/ Stav BOZP a PO
4/ Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni
5/ Vyjádření a připomínky účastníků
6/ Termín příštího kontrolního dne

1. Konstatování současného stavu stavby			
Úkol číslo	Název	Popis úkolu	Výsledek projednání
7.5	Požadavek Zhotovitele	Požadavek Zhotovitele na zástupce města Litomyšl	Zhotovitel požádal zástupce města Litomyšl o sdělení, jaký typ přístřešku má být použit pro autobusovou zastávku. Zhotovitel zaslal Objednateli navrhovaný typ přístřešku, ke kterému se dne 08.04.2020 vyjádřil architekt.
7.6	Požadavek města Litomyšl	Požadavek zástupce města Litomyšl na Objednatele	Zástupce města Litomyšl vznesl požadavek na úpravu chodníku v ulici V. K. Jeřábka v okolí autobusové zastávky u Prokopa v úseku od křižovatky s ulicí Peciny do konce obce.
7.7	Požadavek města Litomyšl	Požadavek zástupce města Litomyšl na Objednatele	Zástupce města Litomyšl vznesl požadavek na zřízení přechodu pro chodce spojující chodník v ul. Zámecká a v ul. Rektora Stříteckého. Zřízení přechodu v tomto místě není možné z důvodu absence osvětlení a z důvodu vyššího náslapu nově provedených obrub (za účelem odvodu dešťové vody). Vzdálenost k nejbližšímu přechodu pro chodce před ZŠ je 75 m.
7.8	Požadavek města Litomyšl	Požadavek zástupce města Litomyšl na Objednatele	Zástupce města Litomyšl vznesl požadavek na provedení úpravy ostrůvku v křižovatce ulic Zámecká a Lidická. Úprava má spočívat v provedení záhonů. Ostrůvek je podle PDPS navržen jako pojížděný. Požadavek města Litomyšl je

			proto bezpředmětný. Tento bod se vypouští.
8.1	Námítka vlastníka dotčené nemovitosti	Námítka vlastníka dotčené nemovitosti k PDPS	Vlastník dotčené nemovitosti podal dne 10.02.2020 námitku proti řešení podle PDPS v km 5,65, k. ú. Němčice. Je podle něj dotčeno vlastnické právo k parcelám č. 807 a 811 následujícím způsobem: • podle PDPS je na parcele č. 807 zakreslen obslužný vjezd na silnici II/358, toto řešení vlastník odmítá; • podle PDPS má být na parcelu č. 811 zamezen přístup ze silnice II/358 nepřerušeným úsekem svodidel. Na základě posouzení situace a odsouhlasení technického řešení s AD dojde k zachování stávajícího sjezdu na parcelu č. 811. Přesné umístění přerušení svodidel bude dohodnuto v průběhu jejich instalace.
8.2	Požadavek obce Němčice	Požadavek obce Němčice na Zhotovitele a Objednatele	Starosta obce požádal dne 25.03.2020 o zvážení možnosti provést realizaci šachty a překopu silnice II/358 na křižovatce se silnicí III/36018 tak, aby byl umožněn průjezd autobusů z objížďky po III/36018 na "točnu", a byla tak zachována dopravní obslužnost alespoň ve všední dny i v termínu od 01.05.2020 do 30.06.2020. Podle vyjádření Zhotovitele ze dne 31.03.2020 bude provádění dešťové kanalizace přizpůsobeno tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost autobusy po celou dobu provádění Stavby. Podle vyjádření AD ze dne 01.04.2020 je možné souhlasit s náhradou monolitických šachet za šachty prefabrikované, pokud budou dodrženy technické kvalitativní požadavky a pokud to nenavýší cenu.
8.3	Dotaz Zhotovitele	Dotaz Zhotovitele – reprofilace příkopů	Podle dotazu Zhotovitele ze dne 30.03.2020 má být v rámci SO 101b, 101c, 101d provedena reprofilace příkopů. Odpovídající položky však v soupisu prací na jednotlivých stavebních objektech obsaženy nejsou. Pro stanovení rozsahu položek, Zhotovitel potřebuje znát množství m³ odkopávek a skládkovné. Rovněž v soupisu prací podle dotazu Zhotovitele ze dne 31.03.2020 chybí u SO 101d položky na provedení krajnic.

			Správce stavby požádal dne 30.03.2020 AD o vyjádření a předložení návrhu řešení. Podle vyjádření AD ze dne 03.04.2020 jsou veškeré zemní práce, tedy i ty spojené s úpravami příkopů, v rozsahu dle příloh č. 3 technických zpráv řádně vykázány v položkách spojených se zemními pracemi vč. položky skládkovného. Podle Zhotovitele nelze tvrzení AD ověřit, neboť nemá k dispozici výpočet kubatur odkopávek příkopů, ale pouze výsledek. Podle výpočtů Zhotovitele by měly být odkopávky příkopů vyšší. Dále podle názoru Zhotovitele nesedí výpočet kubatury odkopů zeminy dle přílohy č.3 technické zprávy. Zhotovitel potřebuje od AD doložit způsob výpočtu odkopávek příkopů a dále odkopávek nestmelených vrstev komunikace SO 101b, SO101c a 101d. V případě chybějící položky krajnic na SO 101d TDS v rámci místního šetření dne 03.04.2020 požádal Zhotovitele o nacenění krajnic u SO 101b, kdy namísto ŠD 0/32 jako materiál krajnic bude použit vyzisk – frézovaný asfalt, a dále bude dopočítána položka krajnic. Dojde tedy k ponížení výzisků frézovaného materiálu. Z důvodů finanční úspory bylo dohodnuta záměna materiálu na krajnicích na všech objektech z ŠD 0-32 na vyfrézovaný materiál. Správce stavby požádá Zhotovitele o předložení návrhu Variace.
8.4	Dotaz Zhotovitele	Dotaz Zhotovitele – sloup NN	Při zpracování RDS pro SO +210 byla Zhotovitelem zjištěna komplikace se zajištěním sloupu NN. V PDPS je chybně zakreslený a nachází se v jiné poloze. Nové výkopové schéma RDS řeší zajištění pomocí pažení a 4 ks vrtaných zemních kotev. Jedním z řešení je podle TDS i přeložka sloupu. Věc byla projednána dne 03.04.2020 při prohlídce Stavby, viz <i>Zápis z místního šetření</i>.
8.5	Požadavek obce Němčice	Požadavek zástupce obce Němčice na Zhotovitele a Objednatele	Dne 03.4.2020 obdržel Správce stavby od starosty obce následující požadavky na provedení Díla: Napojit do vybudované šachty na křižovatce II/358 a MK směr

			Vlčkov krom dešťové kanalizace v MK od Vlčkova i podélně uložené potrubí se silnicí II/358 (levá strana směrem na Č. Třebovou) pro odvod vody z pozemku a studánky za č. p. 35 na Člupku; • Zřídit sjezd k vodojemu mezi Němčicemi a Člupkem o šíři 5 m; • Možnost rozšíření VO SO 402 v Němčicích; • Možnost rozšíření VO SO 402 na Člupku; • Upřesnit typ svítidel VO v Němčicích a Člupku; • Průběžně informovat občany o možnosti nebo zamezení přístupu do jejich nemovitostí (krátkodobě z důvodu prováděných stavebních prací); • Předané sítě (vodovod, 2x kabely pro napájení ČS vodovodu, kanalizace) nejprve pomocí ručně provedených sond vyhledat před započítáním prací a zabezpečit proti poškození; • Zvážit dle okolností v případě potřeby umístit semaforey na výjezdu ze Člupku směr Vlčkov, úzká MK s nepřehlednou zatáčkou, kde mají i osobní vozidla problém; • Úprava nivelety obrubníku v Němčicích pro budoucí přechody, bude upřesněno dodatečně dle zpracovávaného projektu na výstavbu chodníků v této části obce.
8.6	Připomínka vlastníka dotčené nemovitosti	Provedení chodníku u č.p. 1 na Jiráskově náměstí.	Správce stavby obdržel dne 03.04.2020 následující připomínku. Vlastník objektu č. p. 1 na Jiráskově náměstí se obává, že zvýšení chodníku, začínající před vchodem do objektu, společně s vybudováním objezdu dvou malých schodišť o tři domy výše, povede k tomu, že při mírných přívalových deštích poteče těsně kolem objektu voda, která bude ohrožovat základy objektu, zatopí sklep a namočí základy. Podle názoru vlastníka úpravy chodníku zvednou hladinu protékající vody a dostane se tak do objektu. Během pochůzky po stavbě bylo konstatováno, že se voda ze silnice na chodník nedostane, neboť došlo k přidání dvou uličních vpustí na komunikaci, kde

			jsou celkem 4 uliční vpusti. Zhotovitel přislíbil, že vlastníkově situaci objasní.
8.7	Místní šetření	Místní šetření na stavbě dne 03.04.2020	Dne 03.04.2020 proběhlo místní šetření na stavbě, ze kterého byl učiněn zápis. Předmětem šetření byly následující body: • SO 111 - Přejíždění u ZŠ km 0,425 – sloup VO, vodící linie pro nevidomé; • SO 101a – zastávka v km 0,575; • SO 202 – snížení výzisků, geodetická značka, náletové dřeviny, prohloubení základové spáry gabionů; • SO 101d – chybějící položka krajnic, • změna materiálu krajnic, viz bod 8.3. tohoto zápisu; • SO 101c – křižovatka v km 4,135 se silnicí III/36018 – chybějící položka svodidel, silniční obruby, přítomnost kabelu CETIN, napojení svodu dešťové vody; • SO +210 – sloup NN; • SO 203 – svodidla v místě opěrné zdi; • oprava mostu 358-021, který je ve špatném technickém stavu. Blíže viz Zápis z místního šetření.

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací	V průběhu března probíhaly práce na těchto stavebních objektech: - SO 101a Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 - SO 101b Silnice II/358, km 1,366 - 4,125 - SO 111 Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - SO 142 Dopravně inženýrská opatření - SO 141 Definitivní dopravní značení SO 101a, SO 111 - Litomyšl - km 0,000 – 0,300 - spárování kamenných obrub - terénní úpravy - výšková úprava uličních vpustí - km 0,300 – 0,420 - předláždění stávajícího chodníku ze zámkové dlažby - výšková úprava dvou kanalizačních šachet - km 0,420 – 0,500 - provedení sjezdů v km 0,420P; 0,475P a 0,500P - terénní úpravy - km 0,750 – 1,366 - dokončovací dlaždičské práce na chodnících - terénní úpravy SO 101b, 101c - km 1,366 – 8,060 - vytyčení inženýrských sítí - geodetické zaměření osy komunikace a vytyčení příčných profilů SO 142 - Dopravně inženýrská opatření Osazené přechodné dopravní značení je průběžně minimálně jednou za týden kontrolováno a upravováno.
b) finanční plnění	-
c) předávání RDS	Viz níže.
d) fotodokumentace	Je součástí zprávy o postupu prací.

2. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Práce dosud probíhaly v souladu se schválenými TePř a VTD.
--	--

3. Stav BOZP a PO

Dne 24.03.2020 proběhla v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 aktualizace plánu BOZP.

4. Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni

Úkol číslo	Název	Popis úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1.1				
1.2				

5. Vyjádření a připomínky účastníků

Účastník	Vyjádření, připomínky, ostatní
Správce stavby	Správce stavby vyzval Zhotovitele k předložení RDS pro SO prováděné v roce 2020. Zhotovitel se zavázal předložit koncept RDS pro SO 202, SO 203 a SO 210 do 20.03.2020. Pro provedení zbylých SO bude podle Zhotovitele dostatečná projektová dokumentace ve stupni PDPS.

	Zhotovitel předložil koncept RDS pro SO +210 dne 27.03.2020 Správce stavby vyzval Zhotovitele dopisem ze dne 26.02.2020 k předložení aktualizovaného HMG, který bude reflektovat změny Díla a postupu prací od října 2019, a to s termínem do 20.03.2020. Zhotovitel předložil dne 19.03.2020 aktualizaci harmonogramu. Správce stavby zaslal Zhotoviteli dne 30.03.2020 odpověď s připomínkami k harmonogramu a požádal o jejich vypořádání do dne 14.04.2020.
Zástupce města Litomyšl	Zástupce města Litomyšl požádal Zhotovitele, aby konce února vyřídil ve spolupráci se silničním správním úřadem uzavírky potřebné pro provádění prací v jarních měsících. Zhotovitel se zavázal do 15.02.2020 iniciovat projednání. Zhotovitel předložil silničnímu správnímu úřadu návrh uzavírek. Ze strany úřadu bude svoláno 13.03.2020 jednání ohledně uzavírek po celou dobu realizace, tj. od 06.04.2020 do 30.11.2020. Výsledek jednání dne 13.03.2020 na MěÚ Litomyšl ohledně uzavírek a umístění přechodného dopravního značení v termínu od 6.4.2020 do 30.09.2020 je následující: • stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích formou opatřením obecné povahy (veřejná vyhláška) bylo vydáno dne 30.3.2020 pod č.j. MěÚ Litomyšl 22734/2020; • rozhodnutí o povolení uzavírky silnice II/358 bylo vydáno dne 01.04.2020 pod č.j. MěÚ Litomyšl 22742/2020; • DIO začíná od 6.4.2020, kdy se začne frézovat úsek od km 1,366; • Od 6.4.2020 bude na celou Stavbu do 30.11.2020 zřízeno pracovní místo (řízení na semafor nebo dopravním značením); • Od 6.4.2020 do 30.9.2020 bude pro část Stavby (Zhoř – odbočka na Pazuchu) zavedena objízdná trasa; • Od 16.4.2020 do 19.4.2020 bude dokončena pokládka obrusné vrstvy v intravilánu Litomyšle; • 05-06 / 2020 bude uzavřena část obce Němčice z důvodu pokládky dešťové kanalizace.
Zástupce Objednatele	Zástupce Objednatele avizoval dodání pravomocného stavebního povolení k datu 06.04.2020. Tento termín podle informací Objednatele platí.
Zhotovitel	Zhotovitel vznesl dotaz na Objednatele, jak má nakládat s výzisky (frézink). Dotaz byl ve spolupráci s Objednatelem vyřešen. Výzisky budou odváženy na cestmistrovství do Ústí nad Orlicí nebo Litomyšle. Objednatel stanovil jednotná pravidla pro přejímku výzisků na obou cestmistrovstvích.
Zástupce města Česká Třebová	Zástupce města vznesl dne 13. 03. 2020 e-mailem dotaz ohledně veřejného osvětlení. U odbočky II/358-BILLA stále není odstraněno původní osvětlení přechodu (2 sloupy). Zhotovitel reagoval na dotaz e-mailem ze dne 15. 03. 2020, ve kterém uvedl, že odstranění starého osvětlení není součástí PDPS. Dále uvedl, že se Podzhotovitel domluvil se správcem veřejného osvětlení z České Třebové, jak by měla finální úprava po odstranění starého nasvětlení vypadat. Nacenění bude součástí návrhu ZBV, které Zhotovitel předloží Správci stavby k odsouhlasení. Zhotovitel dosud nepředložil Správci stavby návrh ZBV.
Zástupce obce Němčice	Dne 03.4.2020 obdržel Správce stavby od starosty obce následující připomínky:

	• způsob prokazování oprávněnosti vjezdu do uzavírky (do Němčic, Člupku a Zhoře) pro trvale bydlící obyvatele (občanské nebo jiné průkazy), pro dojíždějící do zaměstnání do obce (vedoucí prodejny, obsluha čerpací stanice PHM), zásobování pro firmy a občany (Konzum, Lodreko, dodací list, objednávka apod.); • přístup, příjezd na čerpací stanici PHM v obci v době uzavírky od 6.4. do 30.9.2020, 1.5. – 30.6.2020; • Umístění dočasné zastávky na Člupku směrem na Litomyšl (Vičkov).

6. Termín příštího kontrolního dne

Datum konání příštího KD	Bude upřesněno.
Čas konání příštího KD	Bude upřesněno.
Místo konání příštího KD	Bude upřesněno.

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku.

Zapsal:

Tomáš Opelka

Jméno



Podpis

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník

viz Prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA

Kontrolní den č. 8 konaný elektronicky distanční formou dne 03.04.2020

Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Organizace	Jméno	Kontakt/e-mail	Podpis
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Ing. Milan Skýba	+420 724 105 131	Převzal koncept zápisu.
		milan.skyba@suspk.cz	
M-SILNICE, a.s.	Mgr. Jiří Pokorný	+420 606 680 697	Převzal koncept zápisu.
		jiri.pokorny@msilnice.cz	
Contract management, a.s.	Tomáš Opelka	+420 774 988 894	Převzal koncept zápisu.
		opelka@cmanagement.cz	
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.	Ing. Michal Jonáš	+420 602 218 638	Převzal koncept zápisu.
		michal.jonas@rhdhv.com	
Contract management, a.s.	Mgr. et. Mgr. Martin Altmann	+420 603 814 379	Převzal koncept zápisu.
		altmann@cmanagement.cz	
GEODROM s.r.o.	Ing. Jiří Habrovec	+420 604 235 851	Převzal koncept zápisu.
		habrovec@geodrom.cz	
MANIFOLD GROUP s.r.o.	Ing. Pavel Matuška	+420 602 171 295	Převzal koncept zápisu.
		matuska@manifold.cz	
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Ing. Kristýna Malinská	+420 724 946 065	Převzala koncept zápisu.
		kristyna.malinska@suspk.cz	
MěÚ Litomyšl	Rostislav Simon	viz Prezenční listina KD č. 7	Převzal koncept zápisu.
		dtto	
		dtto	

Organizace	Jméno	Kontakt/e-mail	Podpis
MADOS MT	Petr Rous	dtto	Převzal koncept zápisu.
		dtto	
Obec Némčice	Ing. Josef Racek	dtto	Převzal koncept zápisu.
		dtto	
MěÚ Litomyšl	Miloslav Cink	dtto	Převzal koncept zápisu.
		dtto	
MADOS MT	Zdeněk Stránský	dtto	Převzal koncept zápisu.
		dtto	
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	David Jaška	dtto	Převzal koncept zápisu.
		dtto	
Policie ČR, DI Svitavy	por. Bc. Martin Pavliš	dtto	Převzal koncept zápisu.
		dtto	
MěÚ Česká Třebová	Karel Švercl	dtto	Převzal koncept zápisu.
		dtto	

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL
odbor místního a silničního hospodářství

Bří Šťastných 1000
570 20 Litomyšl

Tel.: 461 653 333

Č.j.: MěÚ Litomyšl 30465/2020
Vyřizuje: Ing. Miloslav Cink
Tel.: 461 653 365, 724 385 499
E-mail: miloslav.cink@litomysl.cz
Datum: 15.6.2020

OBEC NĚMČICE	Cis. jedn. 337/2020
Došlo dne: 16.6.20	Poč. listů 1
Příloha (poč. listů): 1	Spis. znak: 337/15

ROZHODNUTÍ
povolení komunikačního připojení na silnici

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále zákon o PK) a jako silniční správní úřad věcně a místně příslušný ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. b) téhož zákona, po projednání žádosti **Obce NĚmčice, (IČ: 002 79 277), NĚmčice 107, 561 18 NĚmčice** a za souhlasů Správy a údržby silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí pod č.j. SUSPK-3453/2020 ze dne 2.4.2020 a Policie ČR, dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí pod č.j. KRPE-27857-2/ČJ-2020-171106 ze dne 22.4.2020 rozhodl v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 správního řádu a

p o v o l u j e

podle ustanovení § 10 zákona o PK zřízení komunikačního připojení ppč. 1140/2 v k.ú. NĚmčice u České Třebové na silnici II/358 u obce NĚmčice z důvodu zajištění příjezdu k obecnímu vodojemu dle přiložené situace.

Budou splněny následující podmínky:

1. Stavební uspořádání sjezdu musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na vozovku silnice. Sjezd bude zpevněný, bezprašný, snadno čistitelný a jeho užíváním nesmí docházet ke znečišťování silnice.
2. V plném rozsahu budou dodrženy podmínky ve vyjádřeních Správy a údržby silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí a Policie ČR, dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí, která jsou součástí tohoto rozhodnutí.
3. Budou dodrženy rozhledové trojúhelníky podle ČSN 73 6110+Z1 (čl. 12.7). Na ploše vymezeného rozhledového trojúhelníku nesmí být žádné překážky vyšší než 0,75 m nad úrovní jízdního pruhu i sjezdu.
4. Budou dodrženy podmínky pro připojování sousedních nemovitostí na pozemní komunikace podle § 11 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se zákon o PK provádí.
5. Sjezd musí navazovat plynule na niveletu silnice a jeho šířka musí umožňovat vozidlům, která jej budou využívat, plynulé odbočení ze silnice a výjezd na ni.
6. Bude zachováno odvodnění silnice, proto bude součástí sjezdu trubní propustek. Trouby budou ukončeny šikmými čely.
7. Během stavby nesmí dojít k narušení nebo ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
8. Stavbou nesmí docházet ke znečištění a poškození silnice. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno, případné poškození musí být neprodleně nahlášeno Správě a údržbě silnic Pardubického kraje, OMS Ústí nad Orlicí.
9. Minimálně 0,5 m od zpevněné krajnice silnice nebude žádná součást komunikačního připojení převyšovat povrch vozovky (aby nebyla tvořena překážka pro pluhování).
10. Vlastník sjezdu bude zajišťovat řádnou údržbu celého připojení včetně propustku.
11. Odstranění sněhové hrázky v zimě si zajistí vlastník komunikačního připojení bez nároku na úhradu od SÚS Pardubického kraje.

12. Po realizaci komunikačního připojení bude investorem stavby vlastník silnice (SÚS Pk, OMS Ústí nad Orlicí) vyzván k jeho kontrole.

Odůvodnění:

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, zahájil správní řízení na základě žádosti Obce Němčice, Němčice 107, 561 18 Němčice o povolení zřízení komunikačního připojení ppč. 1140/2 v k.ú. Němčice u České Třebové na silnici II/358 u obce Němčice z důvodu zajištění příjezdu k obecnímu vodojemu. Silniční správní úřad obdržel spolu se žádostí situační plánec, souhlasné stanovisko Správy a údržby silnic Pardubického kraje, OMS Ústí nad Orlicí a závazné stanovisko Policie ČR, dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí. Uvedené dokumenty byly použity jako podklad pro vydání předmětného rozhodnutí. Důvody, které by bránily vybudování nového komunikačního připojení, nebyly shledány.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje v Pardubicích, odboru dopravy a silničního hospodářství, prostřednictvím Městského úřadu Litomyšl, odboru místního a silničního hospodářství.

otisk úředního razítka

Ing. Miloslav Cink
referent odboru

Správní poplatek je stanoven podle položky č. 36, písm. c), zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a doplňků ve výši 500,- Kč.

Účastníci řízení:

- Obec Němčice, Němčice 107, 561 18 Němčice (žadatel)
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí, Třebovská 333/II, 562 03 Ústí nad Orlicí


Dotčený orgán:

- Policie ČR, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí


Na vědomí:

- Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, Bratří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

Příloha: situační plán

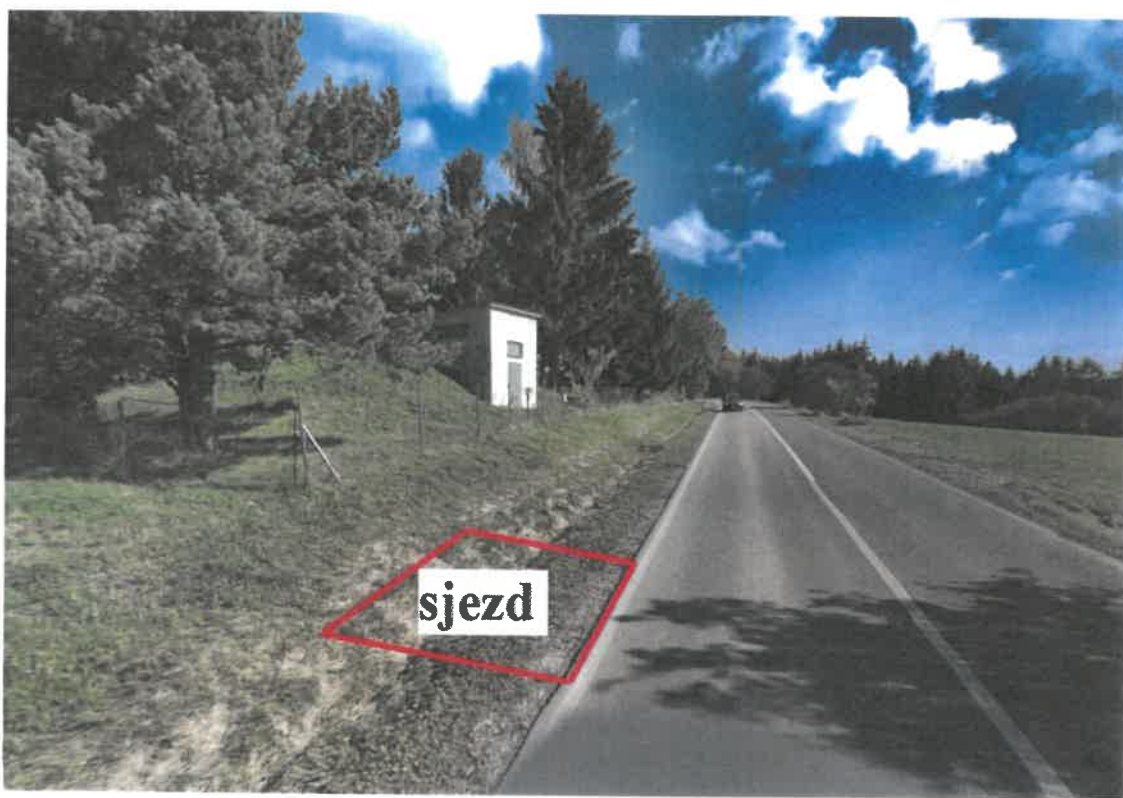

SITUACE 1

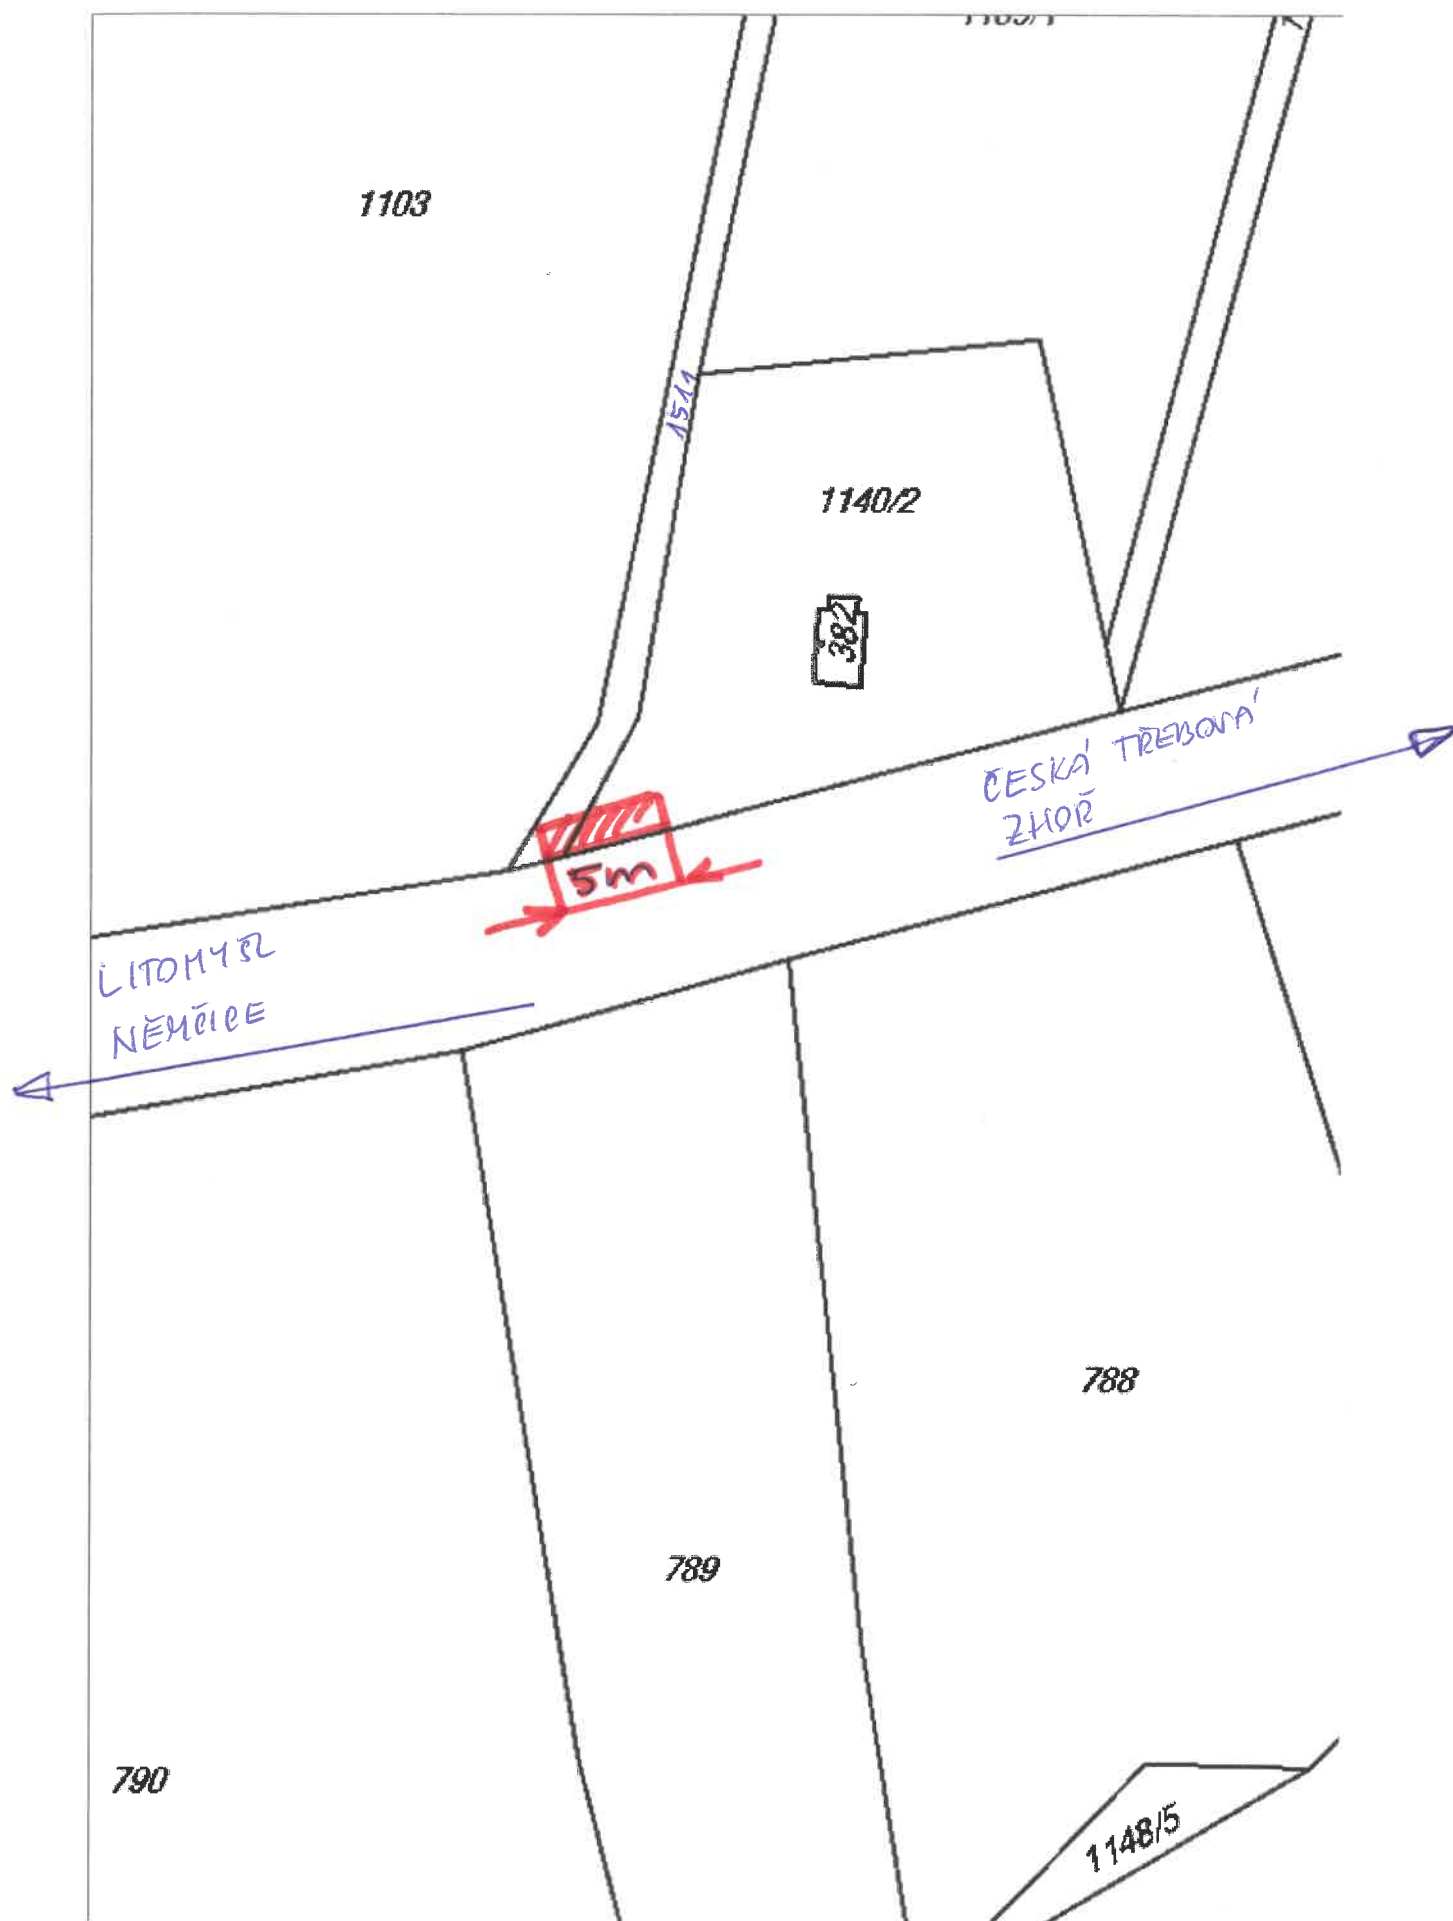

Mgr. Jiří Pokorný
Zástupce zhotovitele

M – Silnice a.s. – Oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 40 Chrudim
IČO: 421 96 868
ID schránky: jwtq7ju

Název stavby: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Náše sp. zn.: CM2020/Ope/086

V Praze dne
10.07.2020

Související

korespondence: „Zápis z kontrolního dne č. 10“ ze dne 05.06.2020

Věc: Pokyn Správce stavby k provedení Variace (Pod-čl. 13.3 OP/ZP)

Dobrý den,

dne 03.04.2020 jsem obdržel žádost obce Němčice na provedení sjezdu z komunikace II/358 k objektu obecního vodojemu mezi obcemi Němčice a Zhoř v přibližném staničení km 6,025 (dále jen „sjezd“). Podle požadavku má být šířka sjezdu 5 m. Provedení sjezdu je nezbytné pro zachování přístupu k objektu za účelem jeho údržby. Požadavek na provedení sjezdu byl rovněž předmětem projednání na KD č. 10 a č. 11 (bod 8.5).

V souvislosti s provedením sjezdu bylo ze strany silničního správního úřadu vydáno na základě žádosti obce Němčice rozhodnutí o povolení komunikačního připojení na silnici, č.j.: MěÚ Litomyšl 30465/2020 ze dne 15.06.2020, kterým se povoluje napojení sjezdu na silnici II/358 (dále jen „**správní rozhodnutí**“).

Na základě výše uvedeného požadavku obce Němčice tímto vydávám pokyn k provedení Variace spočívající v provedení sjezdu, a to v souladu s podmínkami stanovenými správním rozhodnutím.

Vzhledem k tomu, že ocenění této Variace dosud nemohlo být Zhotovitelem vyčísleno, zdvořile žádám o jeho předložení v co nejkratším termínu.

Protože v souvislosti s předmětnou změnou nebyly během jejího projednání výslovně uvedeny žádné modifikace harmonogramu, Doby pro dokončení ani jiných časových milníků, mám za to, že se **nepředpokládá žádný časový dopad této změny na provedení Díla.**

Tento pokyn k provedení Variace je vydán před potvrzením (podpisem) Změnových listů, a to v souladu s bodem (7) Postupu při Variacích, který je součástí Přílohy k nabídce, jež tvoří přílohu Smlouvy.

Závěrem dodávám, že **Variace bude administrována podle interní směrnice Objednatele a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Během této administrace dojde rovněž k projednání ocenění Variace.**

S pozdravem



Tomáš Opelka
Správce stavby

Přílohy

- | | |
|---|--|
| 1 | Rozhodnutí o povolení komunikačního připojení na silnici, č.j.: MěÚ Litomyšl 30465/2020, ze dne 15.06.2020 |
|---|--|







