

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/343 Kameničky“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skyba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: M – SILNICE a.s.

Zastoupený: Ing. Zdenkem Babkou, místopředsedou představenstva, na základě písemného pověření představenstvem
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Právníká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem v Hradci Králové, pod sp. B zn. 430

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/ 0800
E-mail: obchod@msilnice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

p. Josef Řezníček – výrobní náměstek tel. 602 381 345

p. Pavel Krajíček – stavbyvedoucí tel. 602 408 284

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

p. Josef Řezníček – výrobní náměstek tel. 602 381 345

p. Michal Hejkal – stavbyvedoucí tel. 606 621 568

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

p. Josef Řezníček – výrobní náměstek tel. 602 381 345

p. Michal Hejkal – stavbyvedoucí tel. 606 621 568

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.7.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-162/1073/200/20/2019, na zhotovení díla „Modernizace silnice II/343 Kamenický“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

18.215.134,31 Kč (Slovy:

Osmnáct milionů dvě stě patnáct tisíc jedno sto třicet čtyři korun českých a 31/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 3.825.178,21 Kč (Slovy: **Tři miliony osm set dvacet pět tisíc jedno sto sedmdesát osm** korun českých a 21/100).

Cena včetně DPH činí **22.040.312,52 Kč** (Slovy: **Dvacet dva milionů čtyřicet tisíc tři sta dvanáct** korun českých a 52/100).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou ZBV č. 1 – 3 vč odůvodnění změn.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:
Za Objednatele:

Chrudim dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
na základě písemného pověření
představenstvem

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/343 Kameničky - Z2019-022555
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 001/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Vyjádření AD ke Změně	1 / 5	
Vyjádření MÚ Hlinsko č.j. HI 22246-2019-SÚ ze dne 03.04.2019	1 / 6	
Vyjádření TDS ke Změně	1 / 7	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/343 Kameničky - Z2019-022555 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 001 / 01	Číslo ZBV: 1
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel: M-SILNICE

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Husova 1697, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí

Přílohy změnového listu:

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci PDPS na základě vyjádření Městského úřadu Hlinsko č.j. HI 22246/2019/SÚ projektant zahrnul archeologický průzkum. Při realizaci výkopových prací však nebyly nalezeny žádné známky výskytu archeologických nálezů (žádný nález střepů, kostí, zdiva apod.). Z těchto důvodů nebylo potřeba archeologický průzkum provádět a dochází tedy k jeho odpočtu.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že skutečnost o potřebě realizace archeologického průzkumu mohla být zjištěna až v průběhu realizace stavebních prací, a tedy se jedná o Změnu z nepředvídaných důvodů ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Udaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-12 430,00 Kč	0,00 Kč	-12 430,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Projektant	jméno: Jana Förstlová	datum: 30.3.2020	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ing. Lukáš Horčík	datum: 30.3.2020	podpis: 
			Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01													
			ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)										
			č.01										
Evidenční číslo a název stavby: Z2019-022555 - Modernizace silnice II/343 Kamenický													
Číslo a název SO/PS: SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady													
Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,00	0,00	-1,00	12 430,00 Kč	12 430,00 Kč	-12 430,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-12 430,00 Kč	-100,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou					12 430,00 Kč	12 430,00 Kč	-12 430,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-12 430,00 Kč	-100,00%
		Celkem za stavební objekt						336 552,00 Kč	-12 430,00 Kč	0,00 Kč	324 122,00 Kč	-12 430,00 Kč	-4,00%
Za Zhotovitele:													
Datum:													
Za Objednatel:													
Datum:													

PREHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:									
Modifikace sítě BÚ(4) Kamenný - ZÚ19-02255									
1	Příjatek smluvní částka bez rezervy a DPH	6-30-04	Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	bez ABS	9-10-07-100	Stávající limit 50 % pro Změny ZZVZ (ABS)	Stávající limit 50 % pro Změny ZZVZ (ABS)	Stávající limit 50 % pro Změny ZZVZ (ABS)	Stávající limit 50 % pro Změny ZZVZ (ABS)
2+1+19-20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	7-16-07-100	Stávající limit 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	-0,07%	10-10-07-100	Stávající limit 50 % pro Změny ZZVZ (ABS)	Stávající limit 50 % pro Změny ZZVZ (ABS)	Stávající limit 50 % pro Změny ZZVZ (ABS)	Stávající limit 50 % pro Změny ZZVZ (ABS)
3-07-100	Procento změny Příjatek smluvní částky	8-1-10-0	Záporný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	5 399 947,04 Kč	11-1-10-0	Záporný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	Záporný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	Záporný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	Záporný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ
4-10-07-100	Stávající výměnových změn dle § 100 ZZVZ								
5-09-07-100	Stávající záporný polohek dle § 222 odst. (7) ZZVZ								
15 % z Příjatek smluvní částky									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit pro Změny do minimální dle § 222 odst. (4) ZZVZ									
12-08-07-100									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									
Záporný limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
15-08									
Stávající limit 15 % z Příjatek smluvní částky (ABS)									
14-14-02-00-00-00									

Vyjádření AD k ZBV č. 1

Stavba: Modernizace silnice II/343 Kameničky

Stavební objekt: SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Vyjádření AD:

V rámci PDPS projektant zpracoval položku 02821, která představuje provedení archeologického průzkumu. Tato položka byla do projektové dokumentace zpracována na základě vyjádření Městského úřadu Hlinsko č.j. HI 22246/2019/SÚ.

V průběhu realizace stavby při realizaci výkopových prací nebyly nalezeny žádné známky výskytu archeologických nálezů. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že není třeba archeologický průzkum provádět. A dochází k odpočtu předmětné položky.

S touto Změnou za autorský dozor souhlasím.

Dotčená položka:

2/02821 – PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU -1 KPL, -100 %

V Pardubicích dne 30.3.2020



Jana Förstová
Autorský dozor



Městský úřad Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

stavební úřad – úsek památkové péče

Adresa pracoviště: Adámkova 554, 539 23 Hlinsko



Váš dopis ze dne: 25.3.2019

Č.j.: Hl 22246/2019/SÚ

Opráv. úřed. osoba: Bc. Věra Štveráková, Ing. Vladimír Zavřel

Tel.: 469326135

E – mail: stverakova@hlinsko.cz

Vaše značka:

Spis. značka: SÚ/21196/2019/5

Spis. znak – skart. znak/lhůta: 411.1/A/10

Počet listů/příloh: 1/2

V Hlinsku dne: 3.4.2019

Obdržel:

PRODIN a.s., IDDS: wrjftqq

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad, Adámkova č. p. 554, 539 01 Hlinsko v Čechách

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad, úsek památkové péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkového zákona“), obdržel dne 25.3.2019 žádost o vyjádření od žadatele, kterým je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice, kterého zastupuje společnost PRODIN a.s., IČO 25292161, Jiráskova č. p. 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, ve věci **modernizace silnice II/343 Kameničky** na pozemcích parc. č. dle přiložené technické dokumentace v katastrálním území Kameničky.

Z hlediska státní památkové péče je výše uvedená stavba **přípustná**.

Upozorňujeme na **dvě nemovité kulturní památky v Kameničkách**, jejichž pozemky sousedí s pozemkem p.č. 823/1 předmětné modernizované silnice II/343. Jedná se o dům č. p. 97 na pozemku **st. p. 105** a dům č.p. 11 na pozemku **st. p. 128/1** v katastrálním území Kameničky. Dále připomínáme povinnosti, které jsou stanoveny výše uvedeným památkovým zákonem:

1. Stavebník je povinen podle § 22, odst. 2 památkového zákona již od doby přípravy stavby na území s archeologickými nálezy oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
2. Informace o územích s archeologickými nálezy a podmínky pro provádění výše uvedené akce Vám podá kterákoli oprávněná organizace s územní příslušností pro Pardubický kraj – viz. přiložený seznam organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů.
3. V případě objevení archeologického nálezu (kosti, dřivo, střepy atd.) musí podle § 23 odst. 2 památkového zákona nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací tento nález oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. (dále jen AÚ AV ČR) nebo nejbližšímu muzeu (Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86, 537 01 Chrudim – Mgr. Jan Musil, tel. 732 552 413, e-mail: info@muzeumcr.cz), a to nejpozději druhého dne po nálezu nebo potom, kdy se o nálezu dozvěděl. Archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze změn až do prohlídky AÚ AV ČR nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.

"otisk úředního razítka"

Vedoucí stavebního úřadu
Ing. Vladimír Zavřel

Příloha: Seznam oprávněných pracovišť
Oznámení stavebního záměru

Adresa:

Město Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1

539 23 Hlinsko

Tel: 469 315 311

Fax: 469 319 255

E – mail: mesto@hlinsko.cz

Bankovní spojení:

KB Chrudim

19-623-531/0100

IČO: 00270059

Spisová značka: SÚ/21196/2019/5

Strana 1 (celkem 1)

Vyjádření TDS k ZBV č. 1

Stavba: Modernizace silnice II/343 Kameničky

Stavební objekt: SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Vyjádření TDS:

Změna spočívající v nepotřebě provedení archeologického průzkumu byla zjištěna v průběhu realizace stavby při realizaci výkopových prací, kdy nebyly nalezeny žádné známky výskytu archeologických nálezů, tj. střepů, kostí, zdiva apod.

Z těchto dochází k odpočtu předmětné položky představující archeologický průzkum.

Za technický dozor stavebníka se Změnou souhlasím.

Dotčená položka:

2/02821 – PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU -1 KPL, -100 %

V Pardubicích dne _____

Ing. Jiří Synek
Technický dozor stavebníka

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/343 Kameničky - Z2019-022555
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 3	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Nové Položky	1 / 6	
Fotodokumentace - poklopy	1 / 7	
Protokol o zkoušce č. 258-19-CSL-CR ze dne 18.09.2019	1 / 8	
Vyjádření AD ke Změně	2 / 9	
Vyjádření TDS ke Změně	2 / 11	
Zápisy ze SD	2 / 13	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/343 Kameničky - Z2019-022555 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 2
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M-SILNICE

Husova 1697, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí

Přílohy změnového listu:

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel



Popis Změny:

Tato Změna vznikla v průběhu realizace zakázky upřesněním v rámci zpracování realizační dokumentace stavby. Změna naplňuje podmínky §222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Udaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-20 104,00 Kč	0,00 Kč	-20 104,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Projektant	jméno: Jana Förstlová	datum: 30.3.2020	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ing. Lukáš Horčík	datum: 30.3.2020	podpis: 
			Číslo paré: 

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/343 Kameničky - Z2019-022555 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 2
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: M-SILNICE Husova 1697, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí

Přílohy změnového listu:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) V PDPS bylo projektantem uvažováno provedení sanačních opatření na základě diagnostického průzkumu, který byl jako podklad pro její zpracování. Tento průzkum však nebyl proveden v rozsahu, který by přesně stanovil jeho výměry. V rámci realizace stavebních prací po odkrytí vozovkových vrstev dochází k provedení statické zatěžovací zkoušky podle ČSN 72 1006, viz protokol o zkoušce č. 25//19/CSL/CR ze dne 18.09.2019, na základě kterého je stanoven přesný a nezbytný rozsah provedení sanačních opatření.

Z tohoto důvodu dochází k navýšení výměr sanačních opatření oproti předpokladu PDPS.

2) Na základě detailní prohlídky stávajících kanalizačních poklopů bylo zjištěno že je třeba provést výměnu 11 kusů u kterých nebylo možné garantovat dlouhodobější životnost. Se souhlasem TDS bylo rozhodnuto o provedení výměny kanalizačních poklopů, nahrazeny budou celolitinovými poklopy.

3) V PDPS byla u pol. č. 899121 podmínka, že může být provedena pouze se souhlasem TDS. Tato podmínka byla stanovena z důvodu nemožnosti provedení detailní prohlídky stavu ocelových mříží pro zpracování PDPS projektantem a proto projektant zapracoval výměnu všech mříží dotčených stavbou. V rámci této změny dochází ke stanovení počtu kusů ocelových mříží, které je vzhledem k jejich stávajícímu stavu nezbytné vyměnit. Přesný počet kusů bylo možné stanovit až v rámci realizace stavby při jejich detailním ohledání.

Vzhledem k okolnostem vzniku výše uvedených Změn lze konstatovat, že se jedná o Změny, které splňují náležitosti nepředvídanosti ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-4 379,00 Kč	564 000,90 Kč	559 621,90 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Projektant	jméno: Jana Förstlová	datum:	podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ing. Lukáš Horčík	datum: 30.3.2020	podpis: 

	Číslo paré:
--	-------------

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č.01													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	14111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP SHO (INERTNÍ ODPAJ)	M3	1 706,60	1 860,50	153,90	302,00 Kč	515 392,29 Kč	0,00 Kč	46 477,80 Kč	561 870,09 Kč	46 477,80 Kč	9,00%
5	11332.B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELNĚNÉHO	M3	137,31	192,03	54,72	720,00 Kč	98 864,64 Kč	0,00 Kč	39 398,40 Kč	138 263,04 Kč	39 398,40 Kč	35,90%
13	12373.A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	89,06	140,36	51,30	640,00 Kč	56 997,76 Kč	0,00 Kč	32 832,00 Kč	89 829,76 Kč	32 832,00 Kč	57,60%
14	12373.B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	120,15	168,03	47,88	640,00 Kč	76 894,72 Kč	0,00 Kč	30 643,20 Kč	107 537,92 Kč	30 643,20 Kč	39,90%
25	18110	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 557,30	1 899,30	342,00	34,00 Kč	52 948,20 Kč	0,00 Kč	11 628,00 Kč	64 576,20 Kč	11 628,00 Kč	22,00%
27	21361	DŘENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	2 477,80	2 819,80	342,00	71,00 Kč	175 923,80 Kč	0,00 Kč	24 282,00 Kč	200 205,80 Kč	24 282,00 Kč	13,80%
32	56330.C	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRTI	M3	313,45	364,75	51,30	1 355,00 Kč	424 720,69 Kč	0,00 Kč	69 511,50 Kč	494 232,19 Kč	69 511,50 Kč	16,40%
34	56436	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKU VYPLNĚNÉHO GEM MALTOU TL DO 300MM	M2	867,20	1 209,20	342,00	799,00 Kč	692 892,80 Kč	-4 379,00 Kč	0,00 Kč	966 150,80 Kč	273 258,00 Kč	39,40%
54	899121	MRŽE OCELOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	8,00	7,00	-1,00	4 379,00 Kč	35 032,00 Kč	-2 486,00 Kč	0,00 Kč	30 653,00 Kč	-4 379,00 Kč	-12,50%
64	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVANÍM - DODAVKA A M	KUS	6,00	4,00	-2,00	1 243,00 Kč	7 458,00 Kč	-10 724,00 Kč	0,00 Kč	4 972,00 Kč	-2 486,00 Kč	-33,30%
72	91772	OSRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	211,00	183,00	-28,00	383,00 Kč	80 813,00 Kč	-10 724,00 Kč	0,00 Kč	70 089,00 Kč	-10 724,00 Kč	-13,30%
72	91772.1	OSRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	18,00	0,00	-18,00	383,00 Kč	6 894,00 Kč	-6 894,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-6 894,00 Kč	-100,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						2 224 831,90 Kč	-24 483,00 Kč	528 030,90 Kč	2 728 379,80 Kč	503 547,90 Kč	23,00%
		Nové položky											
110	89911E	LITINOVÝ POKLOP B125	KUS	0,00	11,00	11,00	3 270,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	35 970,00 Kč	35 970,00 Kč	35 970,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	35 970,00 Kč	35 970,00 Kč	35 970,00 Kč	100,00%
		Celkem za všechny položky						2 224 831,90 Kč	-24 483,00 Kč	564 000,90 Kč	2 764 349,80 Kč	539 517,90 Kč	24,00%
		Celkem za stavební objekt						11 657 507,01 Kč	-24 483,00 Kč	564 000,90 Kč	12 197 024,91 Kč	539 517,90 Kč	5,00%
Za Zhotovitele:													
Datum:													
Za Objednatel:													
Datum:													

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:									
Modernizace silnice III/243 Kamenický - ZD019-022555									
1	Příjatek změny stavby bez změny a DPH	17 999 803,45 Kč	6-30-24	Suma Změn Měrných a Změn záporných dle § 222 odst. (3) a (6) ZZZV	5 671 191,90 Kč	bez ABS	9- (22/71)*100	Skokovství limitu 50 % pro nedržení dodatečné ráhy dle § 222 odst. (6) ZZZV (ABS)	Skokovství limitu 50 % pro nedržení ZZZV (ABS)
2+1+19+20	Aktuální měřicí částka (sesta stavby)	18 526 891,35 Kč	7- (6/7)*100	Skokovství limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (3) a (6) ZZZV	3,04%	limit nepřekročen	10- (34/71)*100	Skokovství limitu 15 % pro ZZZV (ABS)	Skokovství limitu 15 % z příjatek měřicí částky (ABS)
3- (2/71)*100	Procento změny příjatek měřicí částky	102,53%	8- 1+0,3	Zákonny limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (3) a (6) ZZZV	5 399 941,04 Kč	limit nepřekročen	11- 1+0,5	Zákonny limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (6) ZZZV	Zákonny limit 50 % pro ZZZV (ABS)
4- (24/71)*100	Skokovství výkazových změn dle § 100 ZZZV	0,00%							
5- (39/71)*100	Skokovství změn polohy dle § 222 odst. (7) ZZZV	0,00%							
15 % z příjatek měřicí částky									
2 699 970,52 Kč									
OK v limitu									
</									

Přehled nových položek


Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/343 Kameničky, Z2019-022555
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Komunikace
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 101/01

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
89911E	LITINOVÝ POKLOP B125	KUS	11	3 270,00 Kč	35 970,00 Kč	Tato ani obdobná položka není specifikovaná ve Smlouvě. Z tohoto důvodu je stanovena na základě ceny příslušné položky databáze Expertních cen OTSKP-SPK 2019.

Za zhotovitele:
Podpis:

Za objednatele:
Podpis:

FOTODOKUMENTACE – POKLOPY

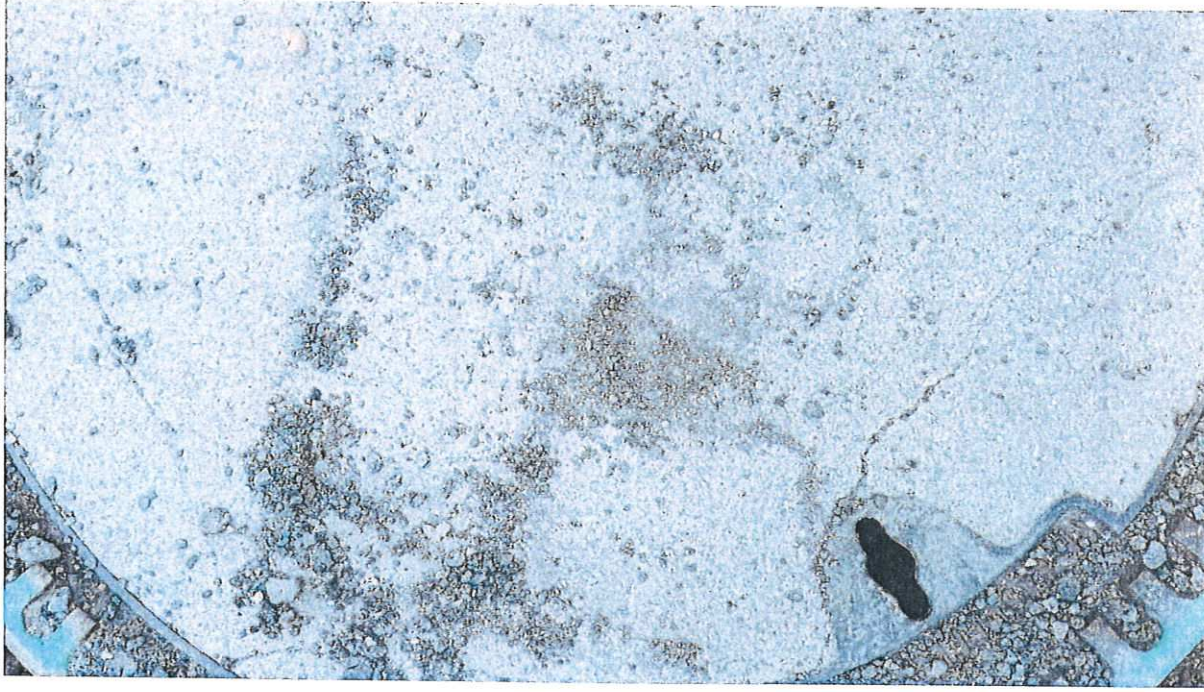

PROTOKOL O ZKOUŠCE

č.: 258/19/CSL/CR

Statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006, příloha A

Zákazník: M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, OZ STŘED – provoz H. Brod
Objednávka: smlouva o provádění zkoušek
Akce: Modernizace silnice II/343 Kameničky

Předmět zkoušky:

místo zkoušky*, staničení*, popis*, materiál*

lab.č.vz.:

podkladní vrstva po odfrézování, km 0,290, 1,5 m od levého kraje,
původní šterkodrt'

488/19

podkladní vrstva po odfrézování, km 0,421, 0,5 m od levého kraje,
původní šterkodrt'

489/19

podkladní vrstva po odfrézování, km 0,490, 1,0 m od levého kraje,
původní šterkodrt'

490/19

* Údaje poskytnuté zákazníkem

Výsledky zkoušek

Statická zatěžovací zkouška

Hlavní použité zařízení: kruhová zatěžovací deska o průměru 30 cm, hydraulický lis, siloměr (dynamometr), snímače zatlačení a další příslušenství.

Lab. č. vz.:	488/19	489/19	490/19
$E_{def\ 1}$ (MPa)	64,6	23,1	22,7
$E_{def\ 2}$ (MPa)	129,1	62,8	68,5
$E_{def,2}/E_{def,1}$	2,00	2,72	3,02

Zkoušky provedl: Beranová, Sokolová
V Chrudimi dne: 18. 9. 2019

Dne: 18. 9. 2019

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušební vzorku. Bez písemného souhlasu Centrální silniční laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Upozornění: Stížnost nebo námitku proti výsledkům zkoušek lze podat řediteli Centrální silniční laboratoře, který je povinen stížnost okamžitě potvrdit a do 30 kalendářních dnů sdělit výsledek reklamace.



Protokol o zkoušce schválil:

Ing. Martin Bušík
ředitel CSL

Konec protokolu

Vyjádření AD k ZBV č. 2

Stavba: Modernizace silnice II/343 Kameničky

Stavební objekt: SO 101 - komunikace

Vyjádření AD:

- 1) Rozsah sanačních opatření navržený v PDPS byl stanoven na základě dostupného diagnostického průzkumu. Změna vznikla na základě provedení statické zatěžovací zkoušky po odstranění vozovkových vrstev, čímž došlo k přesnému stanovení výměr sanačních opatření.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že přesný a nezbytný rozsah sanačních opatření nebylo možné v době zpracování PDPS předvídat.

Dotčené položky:

- 1/014111 – POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INTERNÍ ODPAD)...+153,900 m³, 9,00%
5/11332 B – ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO...+54,720 m³, 39,90 %
13/12373 A – ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I...+51,300 m³, 57,60 %
14/12373 B – ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I...+47,880 m³, 39,90 %
25/18110 – ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I...+342,000 m², 22,00 %
27/21361 – DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE...+342,000 m², 13,80 %
32/56330 C – VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI...+51,300 m³, 16,40 %
34/56436 – VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 300MM...+342,000 m², 39,40 %

- 2) Na základě detailní prohlídky stávajících kanalizačních poklopů bylo zjištěno že je třeba provést výměnu 11 ks u kterých není možné garantovat dlouhodobější životnost. Stávající kanalizační poklopy vykazovaly fyzické poruchy (praskliny, trhliny) viz příloha „Fotodokumentace – poklopy“.

Dotčená položka:

- 110/89911E – LITINOVÝ POKLOP B125...+11 KUS, 100,00 %

- 3) Ve smluvním rozpočtu u pol. č. 899121 bylo projektantem v rámci PDPS uvedeno, že může být provedena pouze se souhlasem TDS. Tato podmínka byla stanovena, jelikož PDPS uvažovala s výměnou všech mříží dotčených stavbou z důvodu, že projektant nemohl v rámci přípravy PDPS provést detailní ohledání těchto prvků.

V rámci této změny tedy dochází ke stanovení počtu kusů ocelových mříží, které mají být vyměněny.

Dotčená položka:

- 54/899121 – MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ...-1 KUS, -12,50 %

- 4) Tyto Změny vznikly v průběhu realizace zakázky, upřesněním v rámci zpracování realizační dokumentace stavby „RDS“.

Dotčené položky:

64/914911 – SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM – DODÁVKA A MONTÁŽ...-2 KUS, -33,30 %

72/91772 – OBRUBA Z DLAŽDĚNÝCH KOSTEK DROBNÝCH...-28,000 m, -13,30 %

72a/91772 1 – OBRUBA Z DLAŽDĚNÝCH KOSTEK DROBNÝCH ...-18,000 m, -100,00 %

S těmito Změnami za autorský dozor souhlasím.

V Pardubicích dne 30. 30. 2020



Jana Förstová
Autorský dozor

Vyjádření TDS k ZBV č. 2

Stavba: Modernizace silnice II/343 Kameničky

Stavební objekt: SO 101 - Komunikace

Vyjádření TDS:

- 1) Toto změna byla zjištěna v průběhu realizace stavby, kdy na základě provedení statické zatěžovací zkoušky bylo zjištěno, že je třeba je provedení sanačních opatření ve větší míře, než bylo v PDPS předpokládáno.

Dotčené položky:

- 1/014111 – POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INTERNÍ ODPAD)...+153,900 m³, 9,00%
5/11332 B – ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO...+54,720 m³, 39,90 %
13/12373 A – ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I...+51,300 m³, 57,60 %
14/12373 B – ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I...+47,880 m³, 39,90 %
25/18110 – ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I...+342,000 m², 22,00 %
27/21361 – DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE...+342,000 m², 13,80 %
32/56330 C – VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI...+51,300 m³, 16,40 %
34/56436 – VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 300MM...+342,000 m², 39,40 %

- 2) Na základě detailní prohlídky stávajících kanalizačních poklopů bylo zjištěno že je třeba provést výměnu 11 ks u kterých není možné garantovat dlouhodobější životnost. Stávající kanalizační poklopy vykazovaly fyzické poruchy (praskliny, trhliny) viz příloha „Fotodokumentace – poklopy“.

Dotčená položka:

- 110/89911E – LITINOVÝ POKLOP B125...+11 KUS, 100,00 %

- 3) V rámci této změny dochází k upřesnění počtu kusů ocelových mříží, které mají být vyměněny. Ve smluvním rozpočtu u pol. č. 899121 je uvedeno, že může být provedena pouze se souhlasem TDS. Na základě této skutečnosti a současného stavu mříží bylo rozhodnuto o výměně 7 Ks.

Dotčená položka:

- 54/899121 – MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ...-1 KUS, -12,50 %

- 4) Tyto Změny vznikly v průběhu realizace zakázky, upřesněním v rámci zpracování realizační dokumentace stavby „RDS“.

Dotčené položky:

64/914911 – SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM – DODÁVKA A MONTÁŽ...-2 KUS, -33,30 %

72/91772 – OBRUBA Z DLAŽDĚNÝCH KOSTEK DROBNÝCH...-28,000 m, -13,30 %

72a/91772 1 – OBRUBA Z DLAŽDĚNÝCH KOSTEK DROBNÝCH ...-18,000 m, -100,00 %

S těmito Změnami jako Technický dozor stavebníka souhlasím.

V Pardubicích dne _____



Ing. Jiří Synek
Technický dozor stavebníka

Datum

PRACOVNÍCI: TAP-ELHA PAVEL, ROMAN PÍHA, MICHAL ŠTRÁNSKÝ,
PĚŠKA MILAN, PĚŠKA ESTHER, VEJELT VILHLM, ČONKA
MIROSLAV, LUKAŠ HOLUB

18.9.
2019

MECHANIZACE: JSC 3CX - ADAMEK JAN, TAP-PLISEL PETR
PETR, VIBR. PESUT WACKER 2x MIX AUTODOMIČASVOC
BET. SMĚSI + ČERPADLO 3x TAP VSE ZAPA BETON
POČASÍ: TOLDOVNO + 12°C AŽ + 15°C
PRACOVNÍ DOBA: 6³⁰ - 18⁰⁰, PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 11³⁰

PROVEDENÉ PRÁCE:

- PRÁCE NA PROPUSTW SO 201 KM 0,250, PROVEDENÍ BEDNĚNÍ
A PŘÍPRAVA PŘED BETONOVÁNÍM, FOTO VÝSTUŽE

1.51: DO KONTRASTU STAVBY SOUKLADÍ V SAKAL V S/M M/25
1,6m. BUBB KLOVNO V ZRU.

- BETONÁŘ ZÁKLADU PROPUSTW C 30/37 - XF3, XC2 2x
MIX TAP 2x 4m³ CEMEN 14m³ SMĚSI, PODLOVO SMĚSI,
ČERPADLO, VČETNĚ VIBROVNÍ POMOČNÍ VIBRÁTORKY
VIZ PODACÍ LISTY A FOTO

- PROVEDENÍ JAKOSTI VŠETI 1.51 DO HODNOSTI 0,41 AŽ 0,44 AŽ
KM 0,460, KUTNĚNÍ, ZÁSTP SÍTKOVÉ POUČNÍCH, KUTNĚNÍ

19.9.

2019

PRACOVNÍCI: TAP-ELHA PAVEL, BOJOT FRANTIŠEK, VEJELT VILHLM,
ČONKA MIROSLAV, LUKAŠ HOLUB, MICHAL ŠTRÁNSKÝ, PĚŠKA
ESTHER, PĚŠKA MILAN, ROMAN PÍHA

MECHANIZACE: JSC 3CX - ADAMEK JAN, TAP-PLISEL PETR

POČASÍ: TOLDOVNO + 8°C AŽ + 16°C

PRACOVNÍ DOBA: 6³⁰ - 17⁰⁰ HOD, PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 11³⁰

PROVEDENÉ PRÁCE:

- VÁZOVÝ VÝSTUŽE NA PROPUSTW SO 201, KM 0,250
- ODŠALOVÁNÍ BEDNĚNÍ, TĚPRAVA VÝSTUŽE
- PROVEDENÍ A ODŠALOVÁNÍ SAKAL KM 0,41 AŽ 0,540 - ODŠALOVÁNÍ
PŘESTOUŽE KAMARIZACE, KUTNĚ POUČNÍ PROJEKTOVÁNÍ

PRACOVNÍCI: TAP-ELHA PAVEL, BOJOT FRANTIŠEK, VILHLM VEJELT,
MIROSLAV ČONKA, LUKAŠ HOLUB, MICHAL ŠTRÁNSKÝ,
PĚŠKA MILAN, PĚŠKA ESTHER, ROMAN PÍHA

20.9.2019

MECHANIZACE: JSC 3CX - ADAMEK JAN, TAP-PLISEL PETR

POČASÍ: TOLDOVNO + 5°C AŽ + 20°C

PROVEDENÉ PRÁCE :

- PROVEDENÍ JANTU, ODKOPÁN ZEMIN
HUTERNÍ TAVNÉ, JANTOČE 32/63 U P. 3007
+ P. 15 CM

- MONTÁŽ BEZPEČNÍ JINÉ KONSTRUKCE

161: KONTROLA PROMÍŘENÍ STOLY S VYHODNĚNÍM
ROZSAHU JANTU PO PROVEDENÍ PRÁCE
ROZSAH A JINÉ PRÁCE JANTU KONTROLA
V KONTAKTU S P. 15 CM.

PRÁCE : P. 15 CM JANTU, HODNĚNÍ P. 15 CM
ROZSAH JANTU, P. 15 CM, P. 15 CM
JANTU, KONTROLA P. 15 CM

15.9.
2019

PRÁCE : P. 15 CM JANTU, P. 15 CM
KONTROLA P. 15 CM

PRÁCE : P. 15 CM JANTU, P. 15 CM

PROVEDENÉ PRÁCE :

- PROVEDENÍ JANTU 32/63 U P. 30 07 + P. 15 CM
- HODNĚNÍ
- MONTÁŽ BEZPEČNÍ A VYHODNĚNÍ U P. 15 CM
NA PROVEDENÍ P. 15 CM

161: KONTROLA PROMÍŘENÍ STOLY S VYHODNĚNÍM
ROZSAHU JANTU PO PROVEDENÍ PRÁCE - ROZSAH JANTU
V KONTAKTU S P. 15 CM.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/343 Kameničky - Z2019-022555
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Propustek v km 0,250 92
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 201/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 3	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Nové Položky	1 / 6	
Fotodokumentace - prosakující podzemní voda	1 / 7	
Vyjádření AD ke Změně	2 / 8	
Vyjádření TDS ke Změně	2 / 10	
Zápis ze SD ze dne 09.09.2019	1 / 12	
Zápis ze SD ze dne 23.08.2019	1 / 13	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/343 Kameničky - Z2019-022555 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Propustek v km 0,250 92	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 201 / 01	Číslo ZBV: 3
---	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M-SILNICE

Husova 1697, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí

Přílohy změnového listu:

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna vznikla v průběhu realizace zakázky upřesněním v rámci zpracování realizační dokumentace stavby. Změna naplňuje podmínky §222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Udaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-105 097,04 Kč	0,00 Kč	-105 097,04 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:
Projektant	jméno: Jana Förstlová	datum: 30.3.2020	podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:
Zhotovitel	jméno: Ing. Lukáš Horčík	datum: 30.3.2020	podpis:
			Číslo paré:

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/343 Kameničky - Z2019-022555 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Propustek v km 0,250 92	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 201 / 01	Číslo ZBV: 3
---	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M-SILNICE

Husova 1697, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí

Přílohy změnového listu:

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) Tato změna byla zjištěna v průběhu realizace stavby, kdy během výkopových prací bylo zjištěno, že dochází k neustálému zaplavení stavební jámy a hrozilo tedy nebezpečí jejího zaplavení jemnozrnnými zeminami. Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto o nepoužití vrchní vrstvy ze ŠD 0/63 jelikož by došlo k jejímu znehodnocení. Na místo zmíněné štěrkodrti bylo provedeno zpevnění lomového kamene pomocí prostého betonu (viz. zápis ze SD ze dne 09.09.2019).

2) Pomocí kopaných sond byla vytyčena skutečná poloha plynové přípojky k domu č.p. 195, díky čemuž bylo zjištěno, že se nachází v jiném místě, než bylo předpokládáno v PDPS. Vzhledem ke skutečné poloze bylo zjištěno, že dochází ke kolizi ochranného pásma přípojky s nově navrženou přeložkou kanalizace (konkrétně s šachtou Š6) (viz. zápis ze SD ze dne 23.08.2019). Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o neprovedení přeložení kanalizace.

3) Na základě obecných předpokladů projektanta PDPS byla navržena výměna stávající branky u domu č.p. 195. V rámci realizace stavby však nebyla branka stavbou významně dotčena, pro realizaci stavby stačila její dočasná demontáž a opětovná instalace a tedy nebyla potřeba její výměna.

Vzhledem k okolnostem vzniku výše uvedených Změn lze konstatovat, že se jedná o Změny, které splňují náležitosti nepředvídanosti ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Udaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-248 520,00 Kč	41 860,00 Kč	-206 660,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	Jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:
Projektant	Jméno: Jana Förstlová	datum: 30.5.2020	podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	Jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:
Zhotovitel	Jméno: Ing. Lukáš Horčík	datum: 30.3.2020	podpis:
			Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01													
ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č.01													
Evidenční číslo a název stavby: Z2019-022555 - Modernizace silnice II/343 Kamenický													
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Propustek v km 0,250 92													
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Propustek v km 0,250 92													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	27152	POLSTARÉ POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2590	1190	-1400	880,00 Kč	22 792,00 Kč	-12 320,00 Kč	0,00 Kč	10 472,00 Kč	-12 320,00 Kč	-54,10%
51	327212	ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3800	2690	-1110	7 000,00 Kč	266 000,00 Kč	-77 700,00 Kč	0,00 Kč	188 300,00 Kč	-77 700,00 Kč	-29,20%
68	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1386	1074	-312	6 619,00 Kč	91 726,10 Kč	-20 664,52 Kč	0,00 Kč	71 061,58 Kč	-20 664,52 Kč	-22,50%
72	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	845	213	-632	446,00 Kč	3 768,70 Kč	-2 818,72 Kč	0,00 Kč	949,98 Kč	-2 818,72 Kč	-74,80%
74	700002	ÚPRAVA KANALIZACE	KUS	1,00	0,00	-1,00	229 000,00 Kč	229 000,00 Kč	-229 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-229 000,00 Kč	-100,00%
81	76796	VRATA A VRATKA	M2	1,44	0,00	-1,44	5 000,00 Kč	7 200,00 Kč	-7 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-7 200,00 Kč	-100,00%
97	917223	SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 100MM	M	21,42	15,12	-6,30	366,00 Kč	7 839,72 Kč	-2 305,80 Kč	0,00 Kč	5 533,92 Kč	-2 305,80 Kč	-29,40%
98	917224	SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 150MM	M	4,00	0,00	-4,00	402,00 Kč	1 608,00 Kč	-1 608,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-1 608,00 Kč	-100,00%
		Celkem za položky ze smlouvy dle Změnou						629 934,52 Kč	-353 617,04 Kč	0,00 Kč	276 317,48 Kč	-353 617,04 Kč	-56,00%
		Nové položky											
109	272313	ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	0,00	14,00	14,00	2 990,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	41 860,00 Kč	41 860,00 Kč	41 860,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	41 860,00 Kč	41 860,00 Kč	41 860,00 Kč	100,00%
		Celkem za všechny položky						629 934,52 Kč	-353 617,04 Kč	41 860,00 Kč	318 177,48 Kč	-311 757,04 Kč	-49,00%
		Celkem za stavební objekt						3 879 774,62 Kč	-585 617,04 Kč	41 860,00 Kč	3 568 017,58 Kč	-311 757,04 Kč	-8,00%
Za Zhotovitele:													
Datum:													
Za Objednatel:													
Datum:													

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidování díla Stavby:										
Modernizace silnice II/243 Karmelický - Z2019-022555										
1	Příloha smlouvy částka bez rezervy a DPH	17 999 803,45 Kč	6-30-34	Suma Změn dle stavby a Změn zápočtů dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	340 531,90 Kč	bez AÚS	0-10-17-1100	Skokovatel limit 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (6) ZZVZ (AÚS)	0,00%	limit nepřekročen
2+1-15-20	Aktuální smlouva částka (suma stavby)	18 215 154,37 Kč	7-10-17-1100	Skokovatel limit 30 % - počet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	1,99%	limit nepřekročen	10-13-17-1100	Skokovatel limit 50 % pro nezbytné práce dle § 222 odst. (6) ZZVZ (AÚS)	4,84%	limit nepřekročen
3-(27)-100	Procento změny Přílohy smlouvy částky	101,20%	8-1-1-1-100	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	5 399 941,04 Kč		11-1-1-1-100	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	11-1-1-1-100	OK v limitu
4-(24/7)-100	Skokovatel výměrů částky	0,00%								
5-(29/7)-100	Skokovatel zálohů položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%								
15 % z Přílohy smlouvy částky										
2 699 970,52 Kč										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst. (6) ZZVZ										
Změny nepřekročené dle § 222 odst										

Přehled nových položek


Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/343 Kameničky, Z2019-022555
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Propustek v km 0,250 92
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 201/01

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	14	2 990,00 Kč	41 860,00 Kč	JC převzata z OTSKP-SPK 2019

Za zhotovitele:
Podpis:

Za objednatele:
Podpis:

FOTODOKUMENTACE – PROSAKUJÍCÍ PODZEMNÍ VODA

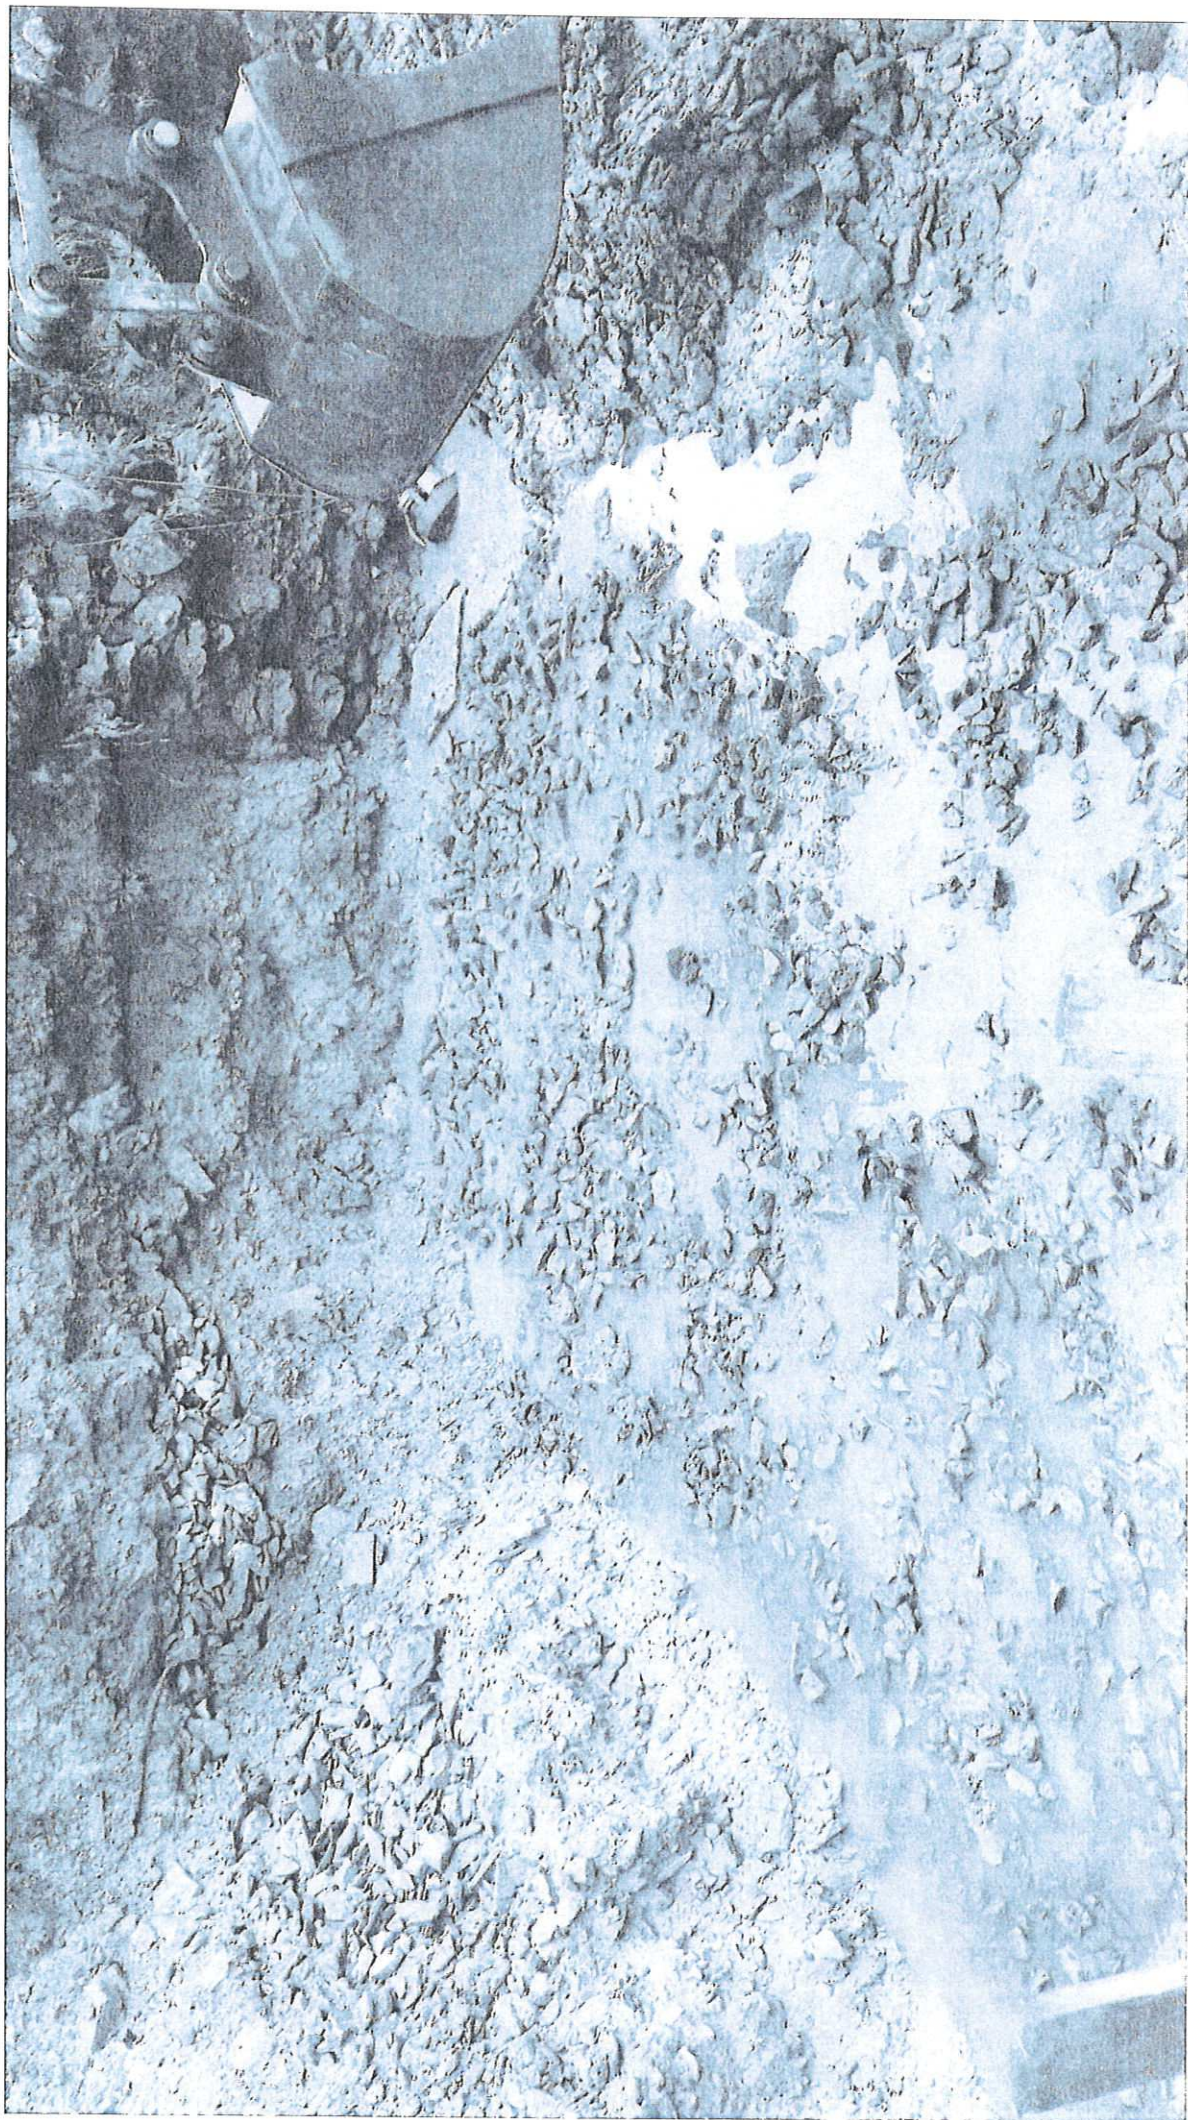

Vyjádření AD k ZBV č. 3

Stavba: Modernizace silnice II/343 Kameničky

Stavební objekt: SO 201 – Propustek v km 0,250 92

Vyjádření AD:

- 1) Toto změna byla zjištěna v průběhu realizace stavby, kdy v průběhu realizace výkopových prací bylo zjištěno, že dochází k neustálému zaplavování stavební jámy a hrozí nebezpečí zaplavení jámy jemnozrnnými zeminami. Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto o nepoužití vrchní vrstvy ze ŠD 0/63 protože by došlo k jejímu znehodnocení. Na místo toho bylo provedeno zpevnění lomového kamene pomocí prostého betonu.

Dotčené položky:

41/27152 – POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO...-14,000 m³, -54,10 %

42/272313 – ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20...+14,000 m³, 100,00 %

- 2) Pomocí kopaných sond byla vytyčena skutečná poloha plynové přípojky k domu č.p. 195, díky čemuž bylo zjištěno, že se nachází v jiném místě, než bylo předpokládáno v PDPS. V PDPS byla poloha přípojky zapracována na základě dostupných podkladů a informací. Vzhledem ke skutečné poloze bylo zjištěno, že dochází ke kolizi ochranného pásma přípojky s nově navrženou přeložkou kanalizace (konkrétně s šachtou Š6). Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o neprovedení přeložení kanalizace.

Dotčená položka:

74/700002 – ÚPRAVA KANALIZACE...-1 KUS, -100,00 %

- 3) Na základě předpokladu projektanta byla navrhována výměna stávající branky u č.p. 195, jelikož předpokládal její nezbytnou demontáž pro provedení stavby. V rámci realizace stavby však nebyla branka stavbou dotčena, pro realizaci stavby stačila její dočasná demontáž a opětovná instalace.

Dotčená položka:

81/76796 – VRATA A VRÁTKA...-1,440 m², -100,00 %

- 4) Tyto Změny vznikly v průběhu realizace zakázky, upřesněním v rámci zpracování realizační dokumentace stavby „RDS“.

Dotčené položky:

51/327212 – ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC...-11,100 m³, -29,20 %

68/465512 – DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC...-3,122 m³, -22,50 %


72/582611 – KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM...-6,320 m²,
- 74,80 %

97/917223 – SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM...-6,300 m,
- 29,40 %

98/917224 – SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM ...-4,000 m,
- 100,00 %

S těmito Změnami za autorský dozor souhlasím.

V Pardubicích dne 30.3.2020



Jana Förstová
Autorský dozor

Vyjádření TDS k ZBV č. 3

Stavba: Modernizace silnice II/343 Kameničky

Stavební objekt: SO 201 – Propustek v km 0,250 92

Vyjádření TDS:

- 1) Toto změna byla zjištěna v průběhu realizace stavby, kdy v průběhu realizace výkopových prací bylo zjištěno, že dochází k neustálému zaplavování stavební jámy a hrozí nebezpečí zaplavení jámy jemnozrnnými zeminami. Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto o nepoužití vrchní vrstvy ze ŠD 0/63 protože by došlo k jejímu znehodnocení. Na místo toho bylo provedeno zpevnění lomového kamene pomocí prostého betonu.

Dotčené položky:

41/27152 – POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO...-14,000 m³, -54,10 %

42/272313 – ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20...+14,000 m³, 100,00 %

- 2) V průběhu realizace prací došlo k provedení sond, které odhalilo kolizi plynového potrubí s nově navrženou kanalizační šachtou (Š6). Z tohoto důvodu dochází k nemožnosti provedení přeložky. A tudíž jejímu odpočtu.

Dotčená položka:

74/700002 – ÚPRAVA KANALIZACE...-1 KUS, -100,00 %

- 3) Na základě obecných předpokladů projektanta PDPS byla navrhována výměna stávající branky u domu č.p. 195. V rámci realizace stavby však nebyla branka stavbou významně dotčena, pro realizaci stavby stačila její dočasná demontáž a opětovná instalace, a tedy nebyla potřeba její výměna.

Dotčená položka:

81/76796 – VRATA A VRÁTKA...-1,440 m², -100,00 %

- 4) Tyto Změny vznikly v průběhu realizace zakázky, upřesněním v rámci zpracování realizační dokumentace stavby „RDS“.

Dotčené položky:

51/327212 – ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC...-**11,100 m³, -29,20 %**

68/465512 – DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC...-**3,122 m³, -22,50 %**

72/582611 – KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM...-**6,320 m², -74,80 %**

97/917223 – SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM...-**6,300 m, -29,40 %**

98/917224 – SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM ...-**4,000 m, -100,00 %**


S těmito Změnami jako Technický dozor stavebníka souhlasím.

V Pardubicích dne _____



Ing. Jiří Synek
Technický dozor stavebníka

Datum

POČASÍ:	+10°C ZATAŽENO	9.9.
	+15°C ZATAŽENO	
PRACOVNÍ DOBA:	6 ⁰⁰ - 16 ³⁰	
PRACOVNÍCI:	8 DĚLNÍKŮ HSV	
STROJE:	TB, 2x T895, LIAZ, AUTODOPÍŠKAČ	
PRÁCE:	DOJĚŽENÍ DVA STAVEBNÍ JÁMY	
	VÝMĚNA PODLOŽÍ Z LOHOVÉHO KAMENE	
	ČERPÁNÍ VODY, PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM	
ZÁPIS:	Z DŮVODU NEUSTÁLÉHO ZAPLAVOVÁNÍ STAVEBNÍ JÁMY A POHOTOVOSTI VNIKU JEDNÝCH ČÁSTÍ (HLINITOPÍŠČITÁ ZEMINA) ROZHODNUTO O PROLITÍ LOHOVÉHO KAMENE BETONEM PO ÚROVNĚ DLA PODKLADNÍHO BETONU	
	TAKÉ LOŽNÍKEM A KROVEM ZKOUŠENO PŘIHLÍŽENÍM V PODROBE PROLITÍM POTRUBÍM CK.	
		
	BETONÁŽ + PROLITÍ LOHOVÉHO KAMENE	

POČASÍ:	+ 8°C POLOVAHO	10.9.
	+ 19°C POLOVAHO	
PRACOVNÍ DOBA:	6 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰	
PRACOVNÍCI:	8 DĚLNÍKŮ HSV, AUTODOPÍŠKAČ	
STROJE:	2x TB, 2x T895, LIAZ HR, ↓	
PRÁCE:	ODSTRANOVÁNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV LOZOLKY	
	ODVOZ MATERIÁLU NA NEZISKADKY	
	ROZEBÍRÁNÍ DLAŽEB CHODNÍKŮ	
	VÝKOP PRO LOŽE UV	
SO 201	BEDLÉNÍ PRO PODKLADNÍ BETON	
	BETONÁŽ PODKLADNÍHO BETONU	
	ČERPÁNÍ VODY	
	DOVOZ VÝSTUŽE NA STAVBU	
	VÝPŘEVA - PÁJENÍ	

Datum

Počasí:	+ 10°C sloukno	22.8
	+ 20°C sloukno	2019
Pracovní doba:	6 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	
Pracovníci:	ČETA STAVEBNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ a.s., 4 DĚLNÍCI HSV	
Stroje:	2x TB, 2x LIAZ, 1x T875, AUTODOPNICHALAI	
Práce:	PŘELOŽKA VODOVODU - JO 201	
	ČERPÁNÍ VODY Z VÝKOPŮ	
	RUČNÍ BEKOPÁNÍ NA SÍTÍCH (VODOVOD, KANAL)	
JO 202	ZDĚNÍ KÁTOKOVÝCH A VÝTOKOVÝCH ŠACHET PROP.	
	KM 0,605	
	OBJEDNÁVÁNÍ PROPUSTKU VČ. VLOŽENÍ KARI SÍTÍ	
JO 101	ROZEBÍRÁNÍ ZAŘÍKOVÉ PLOŠY	
	ODHRABA PLYNO PÁNELY	

Jh

Počasí:	+ 12°C sloukno	23.8.
	+ 22°C sloukno	2019
Pracovní doba:	6 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰	
Pracovníci:	ČETA STAVEBNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ a.s., 4 DĚLNÍCI HSV	
Stroje:	2x TB, 2x T875, 1x LIAZ	
Práce:		
JO 201	PŘELOŽKA VODOVODU	
	ČERPÁNÍ VODY Z VÝKOPŮ	
JO 202	ZDĚNÍ KÁTOKOVÝCH A VÝTOKOVÝCH ŠACHET	
JO 101	PROVEDENÍ SOND NA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍCH	
	- ROZEBÍRÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PLOŠ	

ZÁPIS: PROBĚHLO ZLOUVYTYČENÍ PLYNOVÉ PŘÍPOJKY K ČP. 195. PO PROVEDENÍ SOND ZJIŠTĚNA KOLIZE PLYNOVÉHO POTRUBÍ S JEHO PECHALÝM RÁSTEM (STL) S LOUĚ ZAMÝŠLENOU KANALIZAČNÍ ŠACHTOU J.B. NA ZÁKLADĚ TOHOTO ZJIŠTĚNÍ BYLO ROZHODNUTO O NEPROVÁDĚNÍ PŘELOŽKY - ÚPRAVY KANALIZACE. V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE UPRAVEN TVAR PROPUSTKU (KŘÍDLO) TAI: KONTROLA MNOHA DĚLŮ VÝKOPŮ - DOBŘÍ ČAS. NAKONČENÍ PRÁCE V KANALIZACI DOBŘÍ KONTROLA V PRV. TVAR KONTROLA DOBA VODNÁKŮ V RÁD
