

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	38
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Opěrná zeď, km 7,675 - 7,712
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 203/02

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn položek	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Půdorys	1 / 5	
Podélný a příčné řezy	1 / 6	
Schéma betonářské výztuže	1 / 7	
Výkres svodidel	1 / 8	
Fotodokumentace	16 / 9	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Opěrná zeď, km 7,675 - 7,712	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 203 / 02	Číslo ZBV: 38
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98533 53 Pardubice

Zhotovitel: M-SILNICE

Husova 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci této změny došlo k dopřesnění PDPS do stupně RDS. Z těchto důvodů došlo k následujícím úpravám:

- Po geodetickém zaměření zájmového prostoru byla navržena úprava napojení zdi do stávajícího terénu a ke stávajícím objektům.
- Založení zdi bylo upraveno podle postupu realizace výkopových prací.
- Zádržný systém na opěrné zdi byl navržen dle TP daného systému a dle ČSN 73 6101
- Výkresy výztuží a návrh betonářské výztuže byl upřesněn dle požadavku ČSN EN 1992-2
- RDS dokumentace doplňuje PDPS dokumentaci o detailní návrh oplocení dle navrženého konceptu v PDPS.

RDS dopřesnila dokumentaci PDPS tak, aby zohledňovala skutečnosti na stavbě po provedení odbourání a obnažení stávající konstrukce a tedy nebylo možné tyto skutečnosti odhalit během přípravy, kde byl rozsah stanoven na základě provedených průzkumů a odborných odhadů. Z tohoto důvodu lze tvrdit, že se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nepředvídané změny na díle nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky. Změna tedy splňuje podmínky nepředvídanosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-3 005,60 Kč	356 948,07 Kč	353 942,47 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum:	podpis: Tomáš Opelka	Digitálně podepsal Tomáš Opelka Datum: 2020.12.03 12:59:22 +01'00'
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis: Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2020.12.03 16:18:20 +01'00'
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis: Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2020.12.03 16:19:56 +01'00'
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum:	podpis: Ing. Martin Krejčí	Digitálně podepsal Ing. Martin Krejčí Datum: 2020.12.03 11:54:54 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis: Ing. Jiří Synek	Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2020.12.04 09:37:02 +01'00'
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum:	podpis: Mgr. Jiří Pokorný	Digitálně podepsal Mgr. Jiří Pokorný Datum: 2020.12.03 07:05:07 +01'00'
			Číslo paré:	

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

[illegible]

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOPS)

č.02

Skupina Změn: \$222. odst. (6)

Evidenční číslo a název stavby: N24190080b - Modernizace silnice II/358 - Litomyšl - Česká Třebová

Číslo a název SOPS: SO 203 - Opěna zeď, km 7.675 - 7.712

Číslo a název rozpočtu: SO 203 - Opěna zeď, km 7.675 - 7.712 - Soupis prací

Číslo a název rozpočtu: SU_203 - Úprava Zeg., Kniha 7.67.9 - 7.7.12 - soupis prací													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.1	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU	T	81.87	140.40	58.53	192.00 Kč	15 716.46 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	25 956.41 Kč	11 237.95 Kč	71.50%
2	014102.1	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU	T	24.34	41.96	17.62	192.00 Kč	4 672.51 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	8 056.13 Kč	3 383.62 Kč	72.40%
3	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA	M3	15.21	24.60	9.39	147.00 Kč	2 235.87 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	3 616.20 Kč	1 380.33 Kč	61.70%
5	11372	NESTMELENÉHO	M3	3.90	8.20	4.30	419.00 Kč	1 634.10 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	3 435.80 Kč	1 801.70 Kč	110.30%
6	12373	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	16.85	68.23	49.58	294.00 Kč	5 483.10 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	14 575.05 Kč	14 575.05 Kč	265.80%
8	17411	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I	M3	14.12	33.32	19.21	287.00 Kč	4 051.87 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	9 563.71 Kč	5 511.84 Kč	136.00%
9	17421	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUŤNĚNÍM	M3	13.60	0.00	-13.60	221.00 Kč	3 005.60 Kč	-3 005.60 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-100.00%
10	18110	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	103.25	156.25	53.00	15.00 Kč	1 548.75 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	2 343.75 Kč	795.00 Kč	51.30%
13	311365	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	2.37	2.99	0.62	32 962.00 Kč	78 152.90 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	98 622.30 Kč	20 469.40 Kč	26.20%
14	327325	VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP. A VOL. Z OCELI 1050S B500B	T	33.08	34.92	1.83	7 700.00 Kč	254 739.10 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	268 845.50 Kč	14 106.40 Kč	5.50%
15	451312	ZDI OPĚRNÉ, ŽARUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	7.22	11.66	4.44	3 458.00 Kč	24 949.47 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	40 302.99 Kč	15 353.52 Kč	61.50%
16	561431	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	31.20	70.88	39.68	311.00 Kč	9 703.20 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	22 042.13 Kč	12 338.93 Kč	127.20%
17	56330	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL DO 150MM	M2	4.39	9.00	4.61	1 130.00 Kč	4 958.44 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	5 211.56 Kč	10 170.00 Kč	105.10%
18	572123	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	39.00	70.88	31.88	24.00 Kč	936.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	1 701.00 Kč	765.00 Kč	81.70%
19	572213	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	M2	39.00	82.00	43.00	13.00 Kč	507.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	1 066.00 Kč	559.00 Kč	110.30%
20	574E56	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0.5KG/M2	M2	39.00	82.00	43.00	262.00 Kč	10 218.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	21 484.00 Kč	11 266.00 Kč	110.30%
23	58910	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 80MM	M	37.00	46.00	9.00	198.00 Kč	7 326.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	9 108.00 Kč	1 782.00 Kč	24.30%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								429 840.37 Kč	-3 005.60 Kč	120 537.30 Kč	547 372.07 Kč	117 531.70 Kč	27.00%
Nové položky													
270	12575 N	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	0.00	33.32	33.32	89.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	2 965.75 Kč	2 965.75 Kč	100.00%
271	16223 N	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.20M	M2	0.00	51.50	51.50	43.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	2 214.50 Kč	2 214.50 Kč	100.00%
272	289917 N	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2	M2	0.00	111.00	111.00	85.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	9 435.00 Kč	9 435.00 Kč	100.00%
273	28999 N	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ Z FOLIE	M2	0.00	55.50	55.50	99.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	5 494.50 Kč	5 494.50 Kč	100.00%
274	45160 N	PODKL. A VÝPLN VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	0.00	4.44	4.44	1 620.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	7 192.80 Kč	7 192.80 Kč	100.00%
275	56933 N	PEVNĚNÍ KRAJIN ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	0.00	70.00	70.00	107.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	7 490.00 Kč	7 490.00 Kč	100.00%
276	58252 N	DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	0.00	3.25	3.25	545.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	1 771.25 Kč	1 771.25 Kč	100.00%
277	711112 N	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	M2	0.00	79.25	79.25	217.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	17 197.25 Kč	17 197.25 Kč	100.00%
278	87434 N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	0.00	5.25	5.25	462.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	2 373.00 Kč	2 373.00 Kč	100.00%
279	9166C2 N	DŮČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEN ZADŘENÍ T3 - MONTÁŽ S	M	0.00	61.00	61.00	1 070.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	65 270.00 Kč	65 270.00 Kč	100.00%
280	9166C3 N	PŘESUNEM	M	0.00	61.00	61.00	544.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	33 184.00 Kč	33 184.00 Kč	100.00%
281	9166C9 N	DŮČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEN ZADŘENÍ T3 - DEMONTÁŽ	M	0.00	2 745.00	2 745.00	7.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	19 215.00 Kč	19 215.00 Kč	100.00%
282	711509 N	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU	M2	0.00	79.25	79.25	96.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	7 608.00 Kč	7 608.00 Kč	100.00%
283	87433 N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	0.00	49.50	49.50	350.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	17 325.00 Kč	17 325.00 Kč	100.00%
284	91710 N	OTRUBKY Z BETONOVÝCH PALISAD	M3	0.00	1.44	1.44	26 163.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	37 674.72 Kč	37 674.72 Kč	100.00%
Celkem za nové položky								429 840.37 Kč	-3 005.60 Kč	236 410.77 Kč	763 782.84 Kč	236 410.77 Kč	1500.00%
Celkem za všechny položky								429 840.37 Kč	-3 005.60 Kč	356 948.07 Kč	783 782.84 Kč	353 942.47 Kč	82.00%
Za Zhotovitele: Mgr. Jiří Pokorný													
Datum: 07.05.26 v 01:00													
Digitálně podepsal Mgr. Jiří Pokorný													
Datum: 2020.12.03													
07.05.26 v 01:00													
Za Objednatel: Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba													
Datum: 2020.12.03													
16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													
Ing. Milan Skýba													
Datum: 16.20.45 v 01:00													

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	38
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Opěrná zeď, km 7,675 - 7,712
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 203/02


Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
12573.N	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	33,323	89,00 Kč	2 965,75 Kč	Převzato z OTSKP 2019
18223.N	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	51,500	43,00 Kč	2 214,50 Kč	Převzato z OTSKP 2019
28997F.N	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2	M2	111,000	85,00 Kč	9 435,00 Kč	Převzato z OTSKP 2019
28999.N	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	55,500	99,00 Kč	5 494,50 Kč	Převzato z OTSKP 2019
45160.N	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	4,440	1 620,00 Kč	7 192,80 Kč	Převzato z OTSKP 2019
56933.N	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	70,000	107,00 Kč	7 490,00 Kč	Převzato z OTSKP 2019
58252.N	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	3,250	545,00 Kč	1 771,25 Kč	Převzato z OTSKP 2019
711112.N	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	79,250	217,00 Kč	17 197,25 Kč	Převzato z OTSKP 2019
711509.N	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	79,250	96,00 Kč	7 608,00 Kč	Převzato z SO +201
87433.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	49,500	350,00 Kč	17 325,00 Kč	Převzato z SO 101a
87434.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	5,250	452,00 Kč	2 373,00 Kč	Převzato z OTSKP 2019
9166C2.N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	61,000	1 070,00 Kč	65 270,00 Kč	Převzato z OTSKP 2019
9166C3.N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ	M	61,000	544,00 Kč	33 184,00 Kč	Převzato z OTSKP 2019
9166C9.N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ	MDEN	2 745,000	7,00 Kč	19 215,00 Kč	Převzato z OTSKP 2019
91710.N	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	1,440	26 163,00 Kč	37 674,72 Kč	Převzato z SO 111

Za zhotovitele: **Mgr. Jiří Pokorný**
 Podpis: **Pokorný**
Digitalně podepsal
 Ing. Milan Skýba
 Datum: 2020.12.03
 07:06:49 +01'00'



Za objednatele: **Ing. Milan Skýba**
 Podpis: **Skýba**
Digitalně podepsal
 Ing. Milan Skýba
 Datum: 2020.12.03
 16:21:24 +01'00'



LITOMYŠL




C30/37 XF4, XE3 - Cl 0.40; Urea 16 - 54
 C25/30 nF3 - Cl 1.0; Urea 22 - 52
 C20/25 nF2 - Cl 1.0; Urea 22 - 52
 C16/20 n0
 8 5008
 S235 JR+R



SO 203
RDS

MÉRITKO:

PODÉLNÝ ŘEZ - DÍL 2
1:25

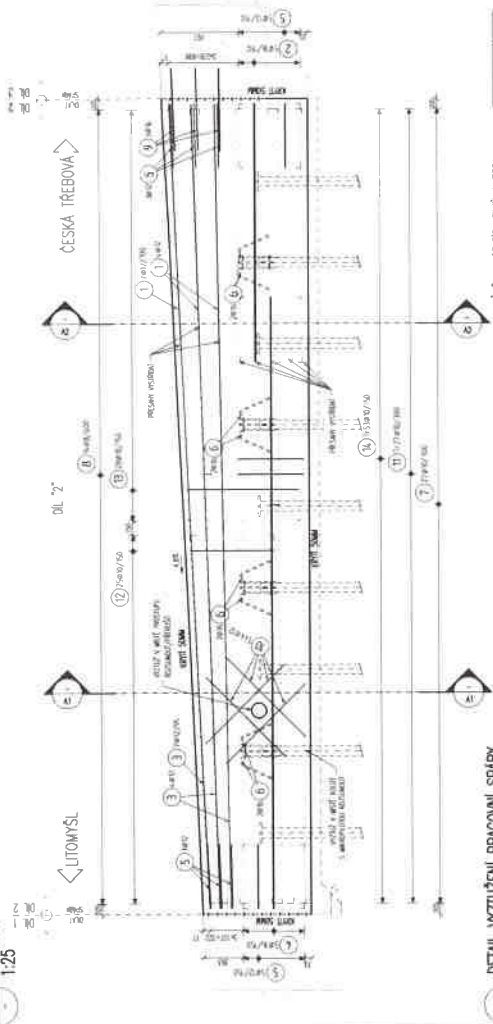

POZNÁMKA 1.:

BETON:

ANALYST(S):

POSITION TITLE AND ID NUMBER (S):

DATE OF TEST/TESTING LAB:

TEST NO./LAB. NO.:

TESTED BY:

C 20/25k - nbf3
C 18/20k - 100
C 30/37 - 154, mbs
C 22/30 - nbf3

LABORATORY NAME AND ADDRESS

10 595 (A) 85008
E-8 121
C. read = 50 mm
C. read = 40 mm

POZNÁMKA 2. :

POZNÁMKA 3.:



KONCEPT

SO 203
RDS[illegible]



