
DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy zhotovitele: 80 0111 27807 5 22064/SAP 160549
na zhotovení díla

**„Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 a chodníků Brčekoly, SO 103 -
chodníky“**

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) **Skanska a.s.**, sídlo Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 26271303, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

Bankovní spojení: ING Bank

Číslo účtu: 1000564927/3500

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Michal Pfaf, ředitel závodu a Ing. František Groulík, oblastní manažer, oba na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. František Groulík, oblastní manažer, tel. 737 257 356, e-mail:

frantisek.groulik@skanska.cz

Tomáš Chrbolka, stavbyvedoucí, tel. 737 257 334, e-mail:

tomas.chrbolka@skanska.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. František Groulík, oblastní manažer, tel. 737 257 356, e-mail:

frantisek.groulik@skanska.cz

Tomáš Chrbolka, stavbyvedoucí, tel. 737 257 334, e-mail:

tomas.chrbolka@skanska.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. František Groulík, oblastní manažer, tel. 737 257 356, e-mail:

frantisek.groulik@skanska.cz

Tomáš Chrbolka, stavbyvedoucí, tel. 737 257 334, e-mail:

tomas.chrbolka@skanska.cz

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Obec Rosice**

IČ: 002 70 831, DIČ: CZ00270831

Se sídlem Rosice 96, 538 54 Rosice

Email: starosta@obec-rosice.cz

zastoupená Bc. Zdeňkem Volejníkem – starostou obce

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Bc. Zdeněk Volejník – starosta obce

Tel: +420 777 913 974, e-mail: starosta@obec-rosice.cz

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

1. Smluvní strany se dohodly na **prodloužení termínu plnění o 151 dnů**. K prodloužení dochází pro zastavení prací na souběžné a technicky neoddělitelné stavbě, kde je stavebníkem Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Důvodem zastavení prací je nutnost zachování průjezdného profilu pro zimní údržbu.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Přílohou tohoto dodatku je:
 - a. Aktualizovaný harmonogram prací
 - b. Pokyn SÚS PK k zastavení prací
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Rosice dne:

Pardubice dne:


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Bc. Zdeněk Volejník
starosta obce

Ing. Jaroslav Richter
manažer řízení obchodu

Ing. František Groulík
oblastní manažer
oba na základě plné moci

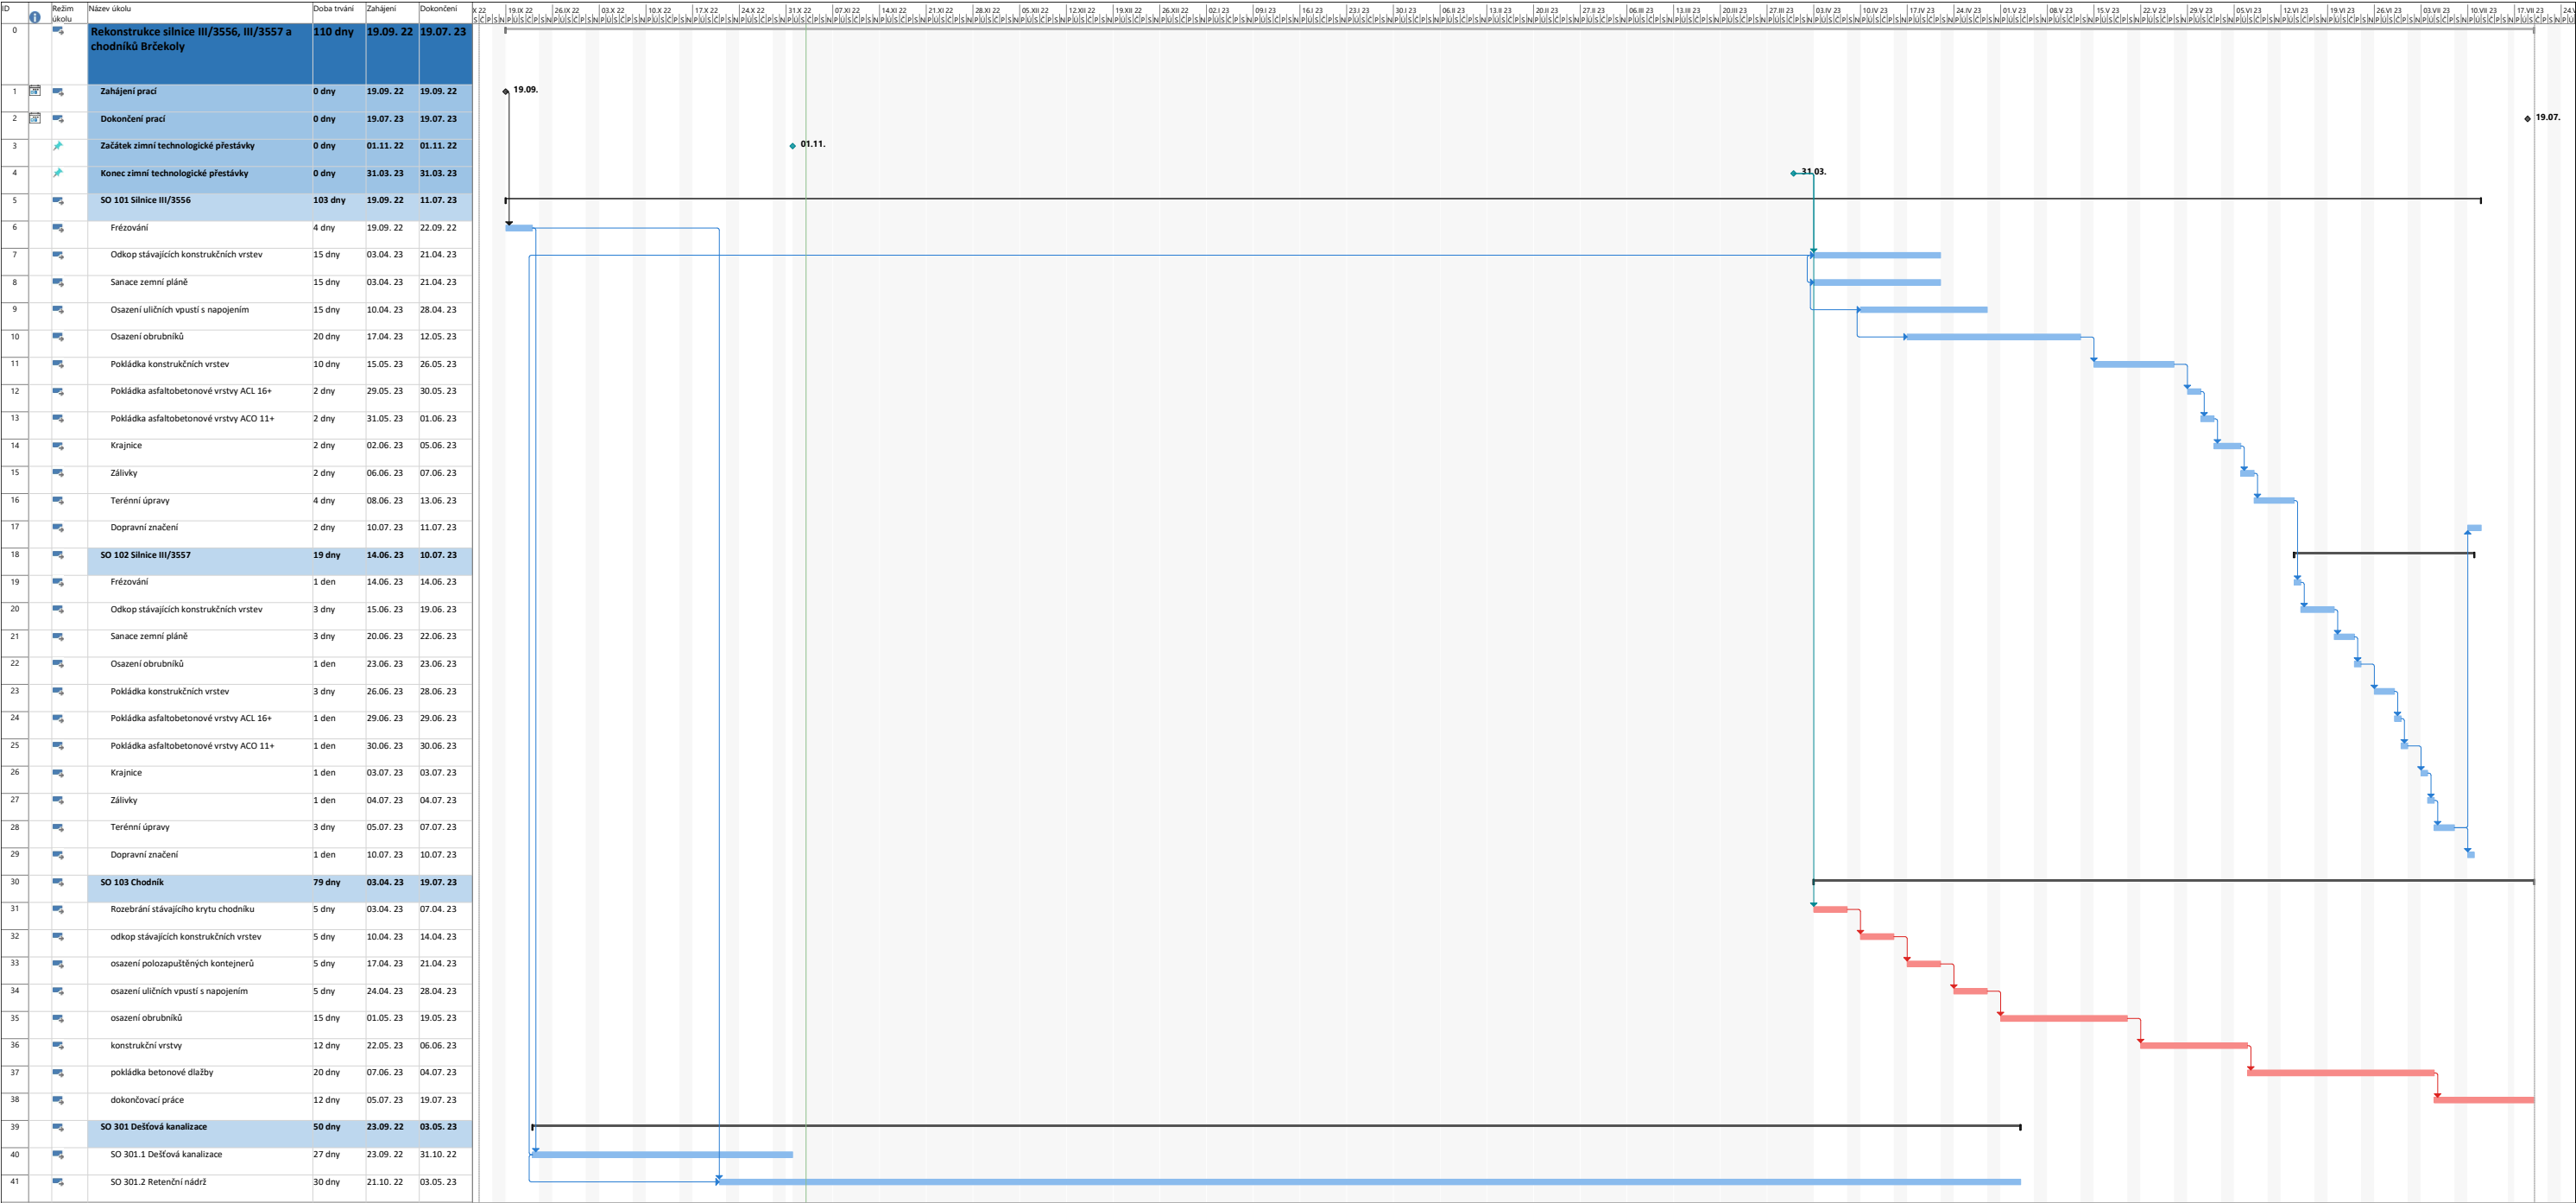

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčkovy

Naše sp. zn.: SÚS/2022/Malát
Související
korespondence: -

V Pardubicích dne
31.10.2022

Stavba Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčkovy (dále jen „**Stavba**“) je realizována na základě smlouvy o dílo č. SMLO-192/1073/200/20/2022 ze dne 14.09.2022 (dále jen „**Smlouva**“), jejíž nedílnou součástí jsou „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky“, ve znění Zvláštních podmínek a příloh (dále jen „**OP/ZP**“), uzavřené mezi

příspěvkovou organizací **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**,

sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice,
zastoupenou Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem,
IČO: 000 85 031,
ID schránky: ffhk8fq,
Pověřená osoba Objednatele: Ing. Jiří Synek, technický náměstek,
Zástupce Objednatele: Ing. Radim Malát, vedoucí oddělení přípravy staveb,

dále jen „**Objednatel**“,

a

společností **Skanska a.s.**,

sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín,
zastoupenou Ing. Jakubem Krenkem, ředitelem závodu,
Ing. Františkem Groulíkem, oblastním manažerem,
IČO: 262 71 303,
ID schránky: d7zgbd2,
Zástupce zhotovitele: Ing. Jaroslav Richter, manažer řízení obchodu,

dále jen „**Zhotovitel**“,
společně dále jako „**Smluvní strany**“.

Věc: Pokyn Zástupce Objednatele k přerušení postupu prací podle Pod-čl. 2.3 OP/ZP

Vážený pane Richtere,

Zástupce Objednatele uvádí, že v časovém období od 01.11.2022 do 31.03.2023 je nutné přerušit postup prací na Stavbě, neboť další postup je znemožněn nepříznivými klimatickými podmínkami, respektive práce budou přerušeny na základě nutnosti zimní technologické přestávky a probíhající zimní údržby v tomto období.

Na základě výše uvedených skutečností proto Zástupce Objednatele podle Pod-čl. 2.3 OP/ZP vydává Zhotoviteli pokyn k přerušení postupu prací na celém Díle podle Pod-čl. 1.1.19 OP/ZP ve výše uvedeném období.

Zástupce Objednatele dále Zhotoviteli sděluje, že případné změny (prodloužení) Doby pro uvedení do provozu (Pod-čl. 1.1.22 OP/ZP) a Doby pro dokončení (Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP) budou předmětem samostatné dohody smluvních stran.

Závěrem Zástupce Objednatele pro vyloučení pochybností uvádí, že tento dokument nepředstavuje sám o sobě uznání jakýchkoliv nároků Zhotovitele, tj. schválení prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu, ani schválení nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu nebo jakoukoli jinou kompenzaci.

V Pardubicích dne 31.10.2022

Ing. Radim Malát
Zástupce Objednatele

Přílohy

-

Rozdělovník

Vyhotoveno v 1 výtisku o 2 stranách.

- | | |
|----------|---|
| 1 | Skanska a.s., Ing. Jaroslav Richter, manažer řízení obchodu – doručeno do datové schránky |
| 2 | Pro spis Objednatele |
-
