
SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-151/1073/200/20/2023 na zhotovení díla

„Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť. kanalizace“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) **Stavební vodohospodářská s.r.o.**, sídlo Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová, IČ 287 71 346, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26437

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 270175759/0300

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Pavel Binka, Bc. David Vávra – jednatelé společnosti

+420 602 356 505, e-mail: p.binka@stavho.cz

+420 602 307 326, e-mail: d.vavra@stavho.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Otto Vojíš – příprava výroby

+420 602 356 487, e-mail: priprava@stavho.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Miroslav Šíp – stavbyvedoucí

+420 732 441 505, e-mail: m.sip@stavho.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Miroslav Šíp - stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email pro fakturaci: fakturace.tu@suspck.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspck.cz

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „**Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť. kanalizace**“ (dále jen „Dílo“) dle zpracovaného soupisu prací.

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

- povinnost Zhotovitele vést deník stavby,
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti,
- zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),
- práce budou prováděny za **úplné dopravní uzavírky**,
- projekt a realizace DIO,
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci,
- Zhotovitel je povinen při provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době.

2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení** na veřejnou zakázku malého rozsahu a dohody smluvních stran a činí:

2.240.000,- Kč (Slovy: **dvamilionydvěstěčtyřicettisíc** korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **470.400,- Kč** (Slovy: **čtyřistasedumdesáttisícčtyřista** korun českých).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **2.710.400,- Kč** (Slovy: **dvamilionysedumsetdesettisicčtyřista** korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných. **Faktury budou zaslány elektronicky na e-mail: fakturace.tu@suspk.cz.**
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.
7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání staveniště.
2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli **nejpozději do 45 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatel** **Zhotoviteli**, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je **silnice III/36012**
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného Díla Objednatel) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **3 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od vyzvání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činnostmi zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelům oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelům. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení objednatelům.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.
4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbujuje zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se

činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

6. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodloužení Zhotovitele s předáním plánu řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodloužení.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.
15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.
16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně.

19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě porušení povinností dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázan ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce zhotovitele námatkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů.

Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

4. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené kupní ceně.
6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelům odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelům neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.
10. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

8. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - Zhotovitel přeneše bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
 - I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

- Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
 - Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
 - Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.
3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami smlouvy.
9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
9. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

10. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

9. Staveniště, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.
2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 3 bodě 2 smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatel vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatel k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.
6. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

10. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatel (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatel za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatel. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku

- za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele bez dalšího.
2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
 3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
 4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.
 5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
 6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
 7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.
 8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
 9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.
 10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajících z této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
 - Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
 - Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
 - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

- Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.
7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá strana obdrží její elektronický originál.

Pardubice dne:

Moravské Třebové dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
Ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Pavel Binka
jednatel společnosti
Stavební vodohospodářská s.r.o.

Bc. David Vávra
Jednatel společnosti
Stavební vodohospodářská s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	011-2023	Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť.kanalizace	
Objednatel:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 53353 Pardubice-Doubravice	IČO: 00085031 DIČ: CZ00085031	
Zhotovitel:	Stavební vodohospodářská, s.r.o. Olomoucká 139/4 57101 Moravská Třebová	IČO: 28771346 DIČ: CZ28771346	
Vypracoval:	Ing. Vojtěch Otto		
Rozpis ceny		Celkem	
HSV			2 240 000,01
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 240 000,01
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 240 000,01 CZK
Základní DPH	21 %		470 400,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 710 400,01 CZK
v <u>Moravské Třebové</u> dne <u>8.6.2023</u>  Ing. Pavel Binka Digitálně podepsal Ing. Pavel Binka Datum: 2023.06.08 11:08:36 +02'00'  Bc. David Vávra Digitálně podepsal Bc. David Vávra Datum: 2023.06.08 11:09:04 +02'00' _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO301	SO 301 Kanalizace dešťová	0,00	2 240 000,01	470 400,00	2 710 400,01	100
02_PRI_VAR	Přílož vodovodního potrubí bez rozšíření výkopu DN200 a DN225	0,00	1 815 298,96	381 212,78	2 196 511,74	81
06	Napojení 3 - Stoka P4 do nové šachty Š8 - 8.2.2023	0,00	169 399,96	35 573,99	204 973,95	8
07	Napojení 2 - Stoka P3 do nové šachty Š16 - 8.2.2023	0,00	97 972,63	20 574,25	118 546,88	4
08	Napojení 1 - Stoka P5 do stávající šachty - 8.2.2023	0,00	157 328,46	33 038,98	190 367,44	7
Celkem za stavbu		0,00	2 240 000,01	470 400,00	2 710 400,01	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	zemní práce	HSV			384 649,03	17,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			50 185,64	2,2
5	Komunikace	HSV			15 584,80	0,7
8	Trubní vedení	HSV			1 735 776,21	77,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 552,60	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			43 105,37	1,9
998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	HSV			6 146,36	0,3
Cena celkem					2 240 000,01	100,0

Položkový rozpočet

S:	011-2023	Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť.kanalizace
O:	SO301	SO 301 Kanalizace dešťová
R:	02_PRI_VAR	Příloha vodovodního potrubí bez rozšíření výkopu DN200 a DN225 8.2.2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		zemní práce				165 411,06
1	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	M3	82,20000	2 012,30	165 411,06
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				43 018,00
2	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	M3	27,40000	1 570,00	43 018,00
Díl: 8		Trubní vedení				1 573 534,70
3	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	M	685,00000	114,60	78 501,00
4	877372121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky do d 315 mm	KUS	59,00000	568,20	33 523,80
5	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	M	685,00000	43,80	30 003,00
6	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	M	685,00000	22,90	15 686,50
7	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm ²	M	685,00000	50,10	34 318,50
8	28613090.MR	Elektroredukce dlouhá PE-HD d225/200 mm PE 100 PN 16 SDR 11	KUS	1,00000	2 729,55	2 729,55
9	286134237R	Trubka tlaková HD RC PE100RC 200x18,2 mm PN16 tyč 12 m	M	517,65000	1 806,10	934 927,67
10	286134241R	Trubka tlaková HD RC PE100RC 225x20,5 mm PN16 tyč 6 m/tyč 12 m	M	177,62500	2 106,20	374 113,78
11	286538013R	Elektrotvarovka - spojka FRIALEN UB d200 PE100, SDR11, bez dorazu	KUS	43,00000	1 062,20	45 674,60
12	286538014R	Elektrotvarovka - spojka FRIALEN UB d225 PE100, SDR11, bez dorazu	KUS	15,00000	1 238,50	18 577,50
13	286538062R	Elektrotvarovka - záslepka FRIALEN MV d200 PE100, SDR11	KUS	1,00000	2 516,80	2 516,80
14	286538063R	Elektrotvarovka - záslepka FRIALEN MV d225 PE100, SDR11	KUS	1,00000	2 962,00	2 962,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				33 335,20
15	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	T	199,61200	167,00	33 335,20
Celkem :						1 815 298,96

Položkový rozpočet

S:	011-2023	Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť.kanalizace
O:	SO301	SO 301 Kanalizace dešťová
R:	06	Napojení 3 - Stoka P4 do nové šachty Š8 - 8.2.2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		zemní práce				88 305,33
1	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	M2	6,00000	764,00	4 584,00
2	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	M2	6,00000	563,80	3 382,80
3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	20,00000	167,70	3 354,00
4	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	DEN	3,00000	82,60	247,80
5	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	M	2,00000	652,80	1 305,60
6	130001101R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	M3	1,94000	1 108,30	2 150,10
7	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	M3	7,42500	1 647,10	12 229,72
8	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	M3	14,50800	682,20	9 897,36
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	14,50800	218,60	3 171,45
10	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	M3	7,42500	351,10	2 606,92
11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	M3	21,93300	176,60	3 873,37
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	21,93300	423,20	9 282,05
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	21,93300	422,50	9 266,69
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	11,26000	206,60	2 326,32
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	2,79500	937,00	2 618,92
16	151811118R00	Montáž pažicího boxu standard dl.3m, š.1m,hl.3,72m	KUS	4,00000	894,10	3 576,40
29,016M2						
17	151813218R00	Demontáž pažicího boxu standard dl.3m, š.1,5m,hl.3,72m	KUS	4,00000	149,00	596,00
29,016M2						
18	583325631R	Kamenivo těžené 8/16	T	5,03100	580,30	2 919,49
19	583423641R	Kamenivo drcené 0/63 Z Jablonné, PAK	T	20,26800	538,60	10 916,34
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 976,23
20	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	M3	0,55800	1 570,00	876,06
21	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	KUS	2,00000	647,50	1 295,00
22	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	KUS	1,01000	455,30	459,85
23	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	KUS	1,01000	341,90	345,32
Díl: 5		Komunikace				8 500,80
24	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	M2	6,00000	287,10	1 722,60
25	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	M2	6,00000	474,00	2 844,00
26	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	M2	6,00000	655,70	3 934,20
Díl: 8		Trubní vedení				60 669,64
27	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	M	5,58000	81,00	451,98
28	892855113R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m	M	5,58000	145,70	813,01
29	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	KUS	4,00000	1 132,30	4 529,20
30	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	KUS	1,00000	976,60	976,60
31	894423112RT1	Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t	KUS	1,00000	3 821,70	3 821,70
32	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	KUS	1,00000	1 326,30	1 326,30
33	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	KUS	1,00000	3 680,20	3 680,20

URS 2023

Položkový rozpočet

S:	011-2023	Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť.kanalizace
O:	SO301	SO 301 Kanalizace dešťová
R:	06	Napojení 3 - Stoka P4 do nové šachty Š8 - 8.2.2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	2861421011R	Trubka kanalizační ULTRA COR SN 12 250x6000 mm korugovaná, PP, modrá	KUS	1,07000	8 346,00	8 930,22
35	55244415R	Poklop ECON litinový samonivelační D400 SN600, kanalizační s ventilací, kruhový	KUS	1,00000	5 074,40	5 074,40
36	5922405391R	Skruž šachty SR-M 1000 x 250 PS/DEHA	KUS	1,01000	1 572,40	1 588,12
37	5922405392R	Skruž šachty SR-M 1000 x 500 PS/DEHA	KUS	1,01000	2 208,90	2 230,99
38	5922405393R	Skruž šachty SR-M 1000 x 1000 PS/DEHA	KUS	2,02000	2 873,00	5 803,46
39	5922405305R	Dno šachty SU-M 1000x885 DN 400 BB	KUS	1,01000	17 286,10	17 458,96
40	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	KUS	1,01000	2 190,10	2 212,00
41	59224373.AR	Těsnění elastomerové pro šachtové díly EMT DN 1000	KUS	5,00000	354,50	1 772,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 801,60
42	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	M	16,00000	175,10	2 801,60
Díl: 998276101		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop				6 146,36
43	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	T	36,32600	169,20	6 146,36
Celkem :						169 399,96

Položkový rozpočet

S:	011-2023	Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť.kanalizace
O:	SO301	SO 301 Kanalizace dešťová
R:	07	Napojení 2 - Stoka P3 do nové šachty Š16 - 8.2.2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		zemní práce				40 349,61
1	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	M2	5,00000	764,00	3 820,00
2	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	M2	5,00000	563,80	2 819,00
3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	20,00000	167,70	3 354,00
4	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	DEN	3,00000	82,60	247,80
5	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	M3	3,60000	1 647,10	5 929,56
6	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	M3	4,83200	682,20	3 296,39
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	8,43200	218,60	1 843,24
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	M3	8,43200	176,60	1 489,09
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	8,43200	423,20	3 568,42
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	8,43200	422,50	3 562,52
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	4,53700	206,60	937,34
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	1,51300	937,00	1 417,68
13	151811118R00	Montáž pažicího boxu standard dl.3m, š.1m,hl.3,72m	KUS	2,00000	894,10	1 788,20
		9,664M2				
14	151813218R00	Demontáž pažicího boxu standard dl.3m, š.1,5m,hl.3,72m	KUS	2,00000	149,00	298,00
		9,664M2				
15	583315002R	Kamenivo těžené frakce 8/16 praná Jihomor. kraj	T	2,72300	580,30	1 580,16
16	583423641R	Kamenivo drcené 0/63 Z Jablonné, PAK	T	8,16600	538,60	4 398,21
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 581,49
17	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	M3	0,30200	1 570,00	474,14
18	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	KUS	1,00000	647,50	647,50
19	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	KUS	1,01000	455,30	459,85
Díl: 5		Komunikace				7 084,00
20	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	M2	5,00000	287,10	1 435,50
21	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	M2	5,00000	474,00	2 370,00
22	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	M2	5,00000	655,70	3 278,50
Díl: 8		Trubní vedení				44 139,41
23	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	M	3,02000	81,00	244,62
24	892855113R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m	M	3,02000	145,70	440,01
25	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	KUS	1,00000	1 132,30	1 132,30
26	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	KUS	1,00000	976,60	976,60
27	894423112RT1	Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t	KUS	1,00000	3 821,70	3 821,70
28	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	KUS	1,00000	1 326,30	1 326,30
29	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	KUS	1,00000	3 680,20	3 680,20
30	2861421011R	Trubka kanalizační ULTRA COR SN 12 250x6000 mm korugovaná, PP, modrá	KUS	0,57900	8 346,00	4 832,33
31	55244415R	Poklop ECON litinový samonivelační D400 SN600, kanalizační s ventilací, kruhový	KUS	1,00000	5 074,40	5 074,40
32	5922405392R	Skruž šachty SR-M 1000 x 500 PS/DEHA	KUS	1,01000	2 208,90	2 230,99
33	5922405305R	Dno šachty SU-M 1000x885 DN 400 BB	KUS	1,01000	17 286,10	17 458,96
34	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	KUS	1,01000	2 190,10	2 212,00
35	59224373.AR	Těsnění elastomerové pro šachtové díly EMT DN 1000	KUS	2,00000	354,50	709,00

Položkový rozpočet

S:	011-2023	Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť.kanalizace
O:	SO301	SO 301 Kanalizace dešťová
R:	07	Napojení 2 - Stoka P3 do nové šachty Š16 - 8.2.2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 751,00
36	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	M	10,00000	175,10	1 751,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 067,12
37	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	T	18,36600	167,00	3 067,12
Celkem :						97 972,63

Položkový rozpočet

S:	011-2023	Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť.kanalizace
O:	SO301	SO 301 Kanalizace dešťová
R:	08	Napojení 1 - Stoka P5 do stávající šachty - 8.2.2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		zemní práce				90 583,03
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	30,00000	167,70	5 031,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	DEN	6,00000	82,60	495,60
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	M3	4,27500	1 647,10	7 041,35
4	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	M3	18,54000	682,20	12 647,99
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	22,81500	218,60	4 987,36
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	M3	22,81500	176,60	4 029,13
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	22,81500	423,20	9 655,31
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	22,81500	422,50	9 639,34
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	13,94600	206,60	2 881,24
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	5,15900	937,00	4 833,98
11	151811118R00	Montáž pažicího boxu standard dl.3m, š.1m,hl.3,72m	KUS	10,00000	894,10	8 941,00
		37,080M2				
12	151813218R00	Demontáž pažicího boxu standard dl.3m, š.1,5m,hl.3,72m	KUS	10,00000	149,00	1 490,00
		37,080M2				
13	583315002R	Kamenivo těžené frakce 8/16 praná Jihomor. kraj	T	9,28700	580,30	5 389,25
14	583423641R	Kamenivo drcené 0/63 Z Jablonné, PAK	T	25,10300	538,60	13 520,48
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 609,92
15	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	M3	1,03000	1 570,00	1 617,10
16	452112111R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	KUS	1,00000	647,50	647,50
17	59224187	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	KUS	1,01000	341,90	345,32
Díl: 8		Trubní vedení				57 432,46
18	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	M	10,30000	81,00	834,30
19	892855113R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m	M	10,30000	145,70	1 500,71
20	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	KUS	1,00000	1 132,30	1 132,30
21	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	KUS	1,00000	976,60	976,60
22	894423112RT1	Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t	KUS	1,00000	3 821,70	3 821,70
23	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	KUS	1,00000	1 326,30	1 326,30
24	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	KUS	1,00000	3 680,20	3 680,20
		ÚRS 2023				
25	2861421011R	Trubka kanalizační ULTRA COR SN 12 250x6000 mm korugovaná, PP, modrá	KUS	1,97400	8 346,00	16 475,00
26	55244415R	Poklop ECON litinový samonivelační D400 SN600, kanalizační s ventilací, kruhový	KUS	1,00000	5 074,40	5 074,40
27	5922405392R	Skruž šachty SR-M 1000 x 500 PS/DEHA	KUS	1,01000	2 208,90	2 230,99
28	5922405305R	Dno šachty SU-M 1000x885 DN 400 BB	KUS	1,01000	17 286,10	17 458,96
29	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	KUS	1,01000	2 190,10	2 212,00
30	59224373.AR	Těsnění elastomerové pro šachtové díly EMT DN 1000	KUS	2,00000	354,50	709,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 703,05
31	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	T	40,13800	167,00	6 703,05
Celkem :						157 328,46

Harmonogram stavby: 011-2023 Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť.kanalizace

Zhotovitel : Stavební vodohospodářská, s.r.o.
Olomoucká 139/4
57101 Moravská Třebová

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Počet prac. dní	Počet kal.dní	Prům. počet prac.	XX 2023																													
								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
011-2023	Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť.kana			2 240 000	34	45	6																														
SO301	SO 301 Kanalizace dešťová			2 240 000	34	45	6																														
02_PRI_VA	Přílož.vodovodního potrubí bez rozšíření výkopu DN200 a DN225 8.2			1 815 299	26	36	6																														
1	zemní práce			165 411	26	36	6																														
4	Vodorovné konstrukce			43 018	16	22	6																														
8	Trubní vedení			1 573 535	22	30	6																														
99	Staveništní přesun hmot			33 335	26	36	6																														
06	Napojení 3 - Stoka P4 do nové šachty Š8 - 8.2.2023			169 400	13	17	6																														
1	zemní práce			88 305	10	12	6																														
4	Vodorovné konstrukce			2 976	3	3	6																														
5	Komunikace			8 501	2	2	6																														
8	Trubní vedení			60 670	6	8	6																														
91	Doplňující práce na komunikaci			2 802	2	2	6																														
998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop			6 146	13	17	6																														
07	Napojení 2 - Stoka P3 do nové šachty Š16 - 8.2.2023			97 973	6	8	6																														
1	zemní práce			40 350	6	8	6																														
4	Vodorovné konstrukce			1 581	2	2	6																														
5	Komunikace			7 084	2	2	6																														
8	Trubní vedení			44 139	4	4	6																														
91	Doplňující práce na komunikaci			1 751	2	2	6																														
99	Staveništní přesun hmot			3 067	6	8	6																														
08	Napojení 1 - Stoka P5 do stávající šachty - 8.2.2023			157 328	10	12	6																														
1	zemní práce			90 583	10	12	6																														
4	Vodorovné konstrukce			2 610	4	4	6																														
8	Trubní vedení			57 432	6	8	6																														
99	Staveništní přesun hmot			6 703	10	12	6																														
	Kč za měsíc							752 251																													
	Kč za rok																																				


V Moravské Třebové dne 8.6.2023

Ing. Pavel Binka

Bc. David Vávra

Ing. Pavel Binka
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Binka
Datum: 2023.06.08
12:05:12 +02'00'

Bc. David Vávra
Digitálně podepsal
Bc. David Vávra
Datum: 2023.06.08
12:05:36 +02'00'

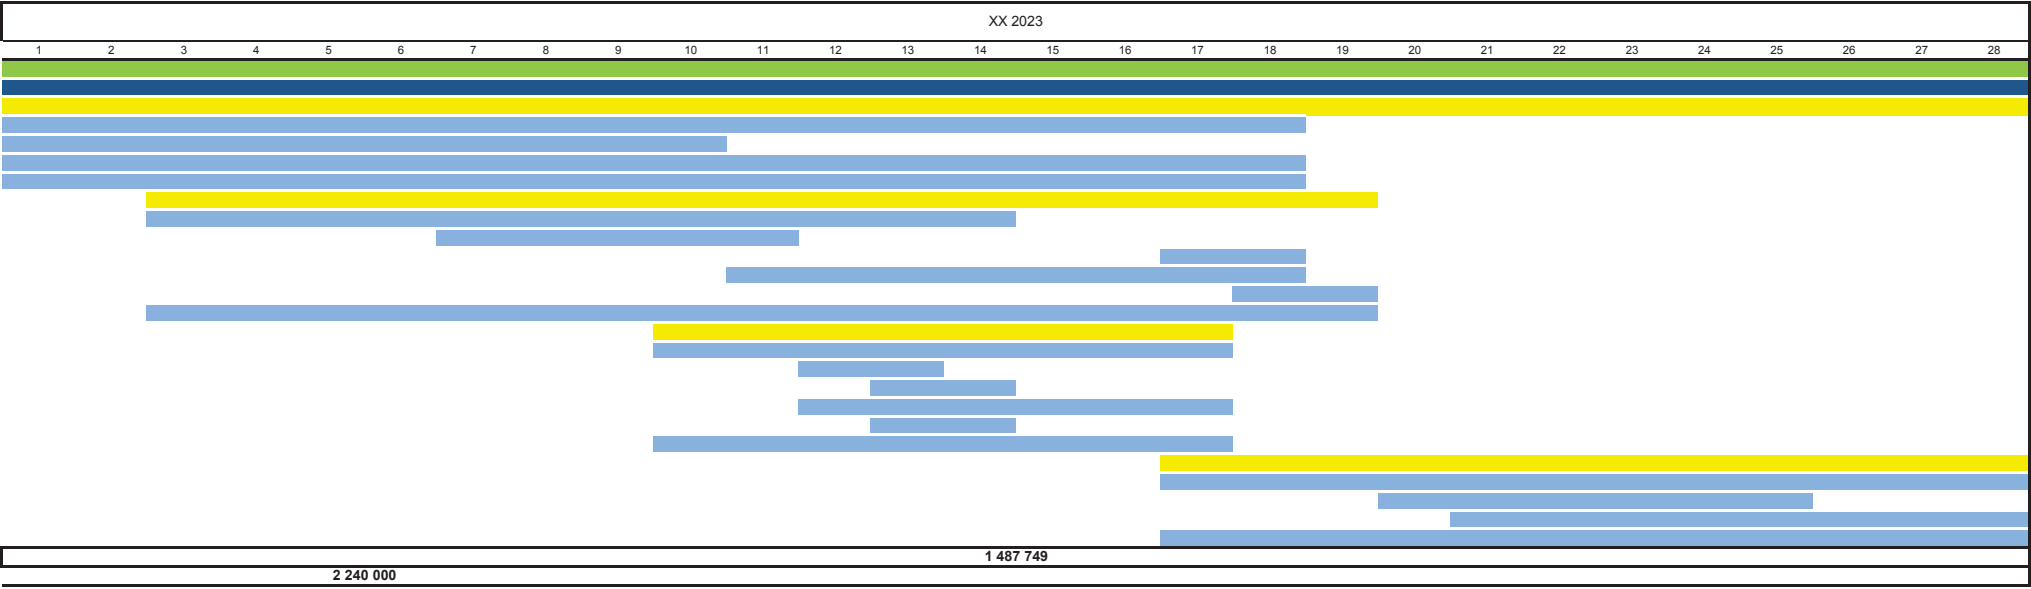

Harmonogram stavby: 011-2023 Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť.kanalizace

Zhotovitel : Stavební vodohospodářská, s.r.o.
Olomoucká 139/4
57101 Moravská Třebová

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Počet kal.dnů	Počet prac. dní	Prům. počet prac.	2023	
								XX	XX
011-2023	Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť.kanalizace			2 240 000	45	34	6	752 251	1 487 749
SO301	SO 301 Kanalizace dešťová			2 240 000	45	34	6	752 251	1 487 749
02_PRI_VA	Přílož vodovodního potrubí bez rozšíření výkopu DN200 a DN225 8.2.2023			1 815 299	36	26	6	752 251	1 063 048
1	zemní práce			165 411	36	26	6	82 706	82 706
4	Vodorovné konstrukce			43 018	22	16	6	23 464	19 554
8	Trubní vedení			1 573 535	30	22	6	629 414	944 121
99	Staveništní přesun hmot			33 335	36	26	6	16 668	16 668
06	Napojení 3 - Stoka P4 do nové šachty Š8 - 8.2.2023			169 400	17	13	6		169 400
1	zemní práce			88 305	12	10	6		88 305
4	Vodorovné konstrukce			2 976	3	3	6		2 976
5	Komunikace			8 501	2	2	6		8 501
8	Trubní vedení			60 670	8	6	6		60 670
91	Doplňující práce na komunikaci			2 802	2	2	6		2 802
998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop			6 146	17	13	6		6 146
07	Napojení 2 - Stoka P3 do nové šachty Š16 - 8.2.2023			97 973	8	6	6		97 973
1	zemní práce			40 350	8	6	6		40 350
4	Vodorovné konstrukce			1 581	2	2	6		1 581
5	Komunikace			7 084	2	2	6		7 084
8	Trubní vedení			44 139	4	4	6		44 139
91	Doplňující práce na komunikaci			1 751	2	2	6		1 751
99	Staveništní přesun hmot			3 067	8	6	6		3 067
08	Napojení 1 - Stoka P5 do stávající šachty - 8.2.2023			157 328	12	10	6		157 328
1	zemní práce			90 583	12	10	6		90 583
4	Vodorovné konstrukce			2 610	4	4	6		2 610
8	Trubní vedení			57 432	8	6	6		57 432
99	Staveništní přesun hmot			6 703	12	10	6		6 703
	Cena za měsíc							752 251	1 487 749
	Cena za rok							2 240 000	

V Moravské Třebové dne 8.6.2023

Ing.Pavel Binka

Bc. David Vávra

Ing. Pavel Binka
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Binka
Datum: 2023.06.08
12:06:36 +02'00'

Bc. David Vávra
Digitálně podepsal
Bc. David Vávra
Datum: 2023.06.08
12:06:13 +02'00'

Příloha č.4

Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	Stavební vodohospodářská s.r.o.
Poskytované plnění (název akce):	Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť. kanalizace

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:

Razítko:

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:

