Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Protokol o hodnocení a posouzení nabídek

ve smyslu § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon")
v zadávacím řízení dle § 3 písm. a) ve spojení s § 52 písm. a) zákona – zjednodušené podlimitní řízení

" Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná - průtah "

Hodnotící komise byla seznámena s Protokolem o odtajnění obálek s nabídkami, včetně identifikačních údajů účastníků, kteří podali nabídky a Písemnou zprávou o hodnocení nabídek.

Protokol sepsaný dne 2.7.2020 při jednání hodnotící komise ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**").

Složení komise

Zadavatel ustanovil hodnotící komisi v souladu s § 42 zákona (dále jen „**komise**") k posouzení splnění podmínek účasti stanovené zadávacími podmínkami, k posouzení splnění rozsahu požadavků zadavatele na kvalifikaci a hodnocením nabídek v tomto složení:

předseda: Mgr. Josef Neumann, LL.M.

místopředseda: Ing. Radim Malát

člen: Ing. Mojmír Myšák

Komise se sešla v počtu 3 osob jmenovaných zadavatelem.

Střet zájmů

Všichni přítomní na prvním jednání komise dne 25.6.2020 potvrdili platnost prohlášení k neexistenci střetu zájmů a povinnosti mlčenlivosti včetně zachování zásad GDPR při zpracování osobních údajů.

Předmět jednání komise

Náplní jednání komise bylo v souvislosti s § 114 a násl. zákona hodnocení nabídek, dále dle § 39 a násl. zákona posouzení splnění podmínek účasti

stanovené zadávacími podmínkami a dle § 52 a násl. zákona splnění rozsahu požadavků zadavatele na kvalifikaci stanovené zadávacími podmínkami.

Pořadí úkonů na jednání komise

Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace vč. příloh na Profilu Zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK) dne 5. června 2020.
Konec lhůty pro podání nabídek byl stanovený na 25. června 2020 do 08:00 hodin. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek bylo podáno 5 nabídek. Bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek bylo zahájeno odtajnění obálek s nabídkami. Komise provedla u elektronicky podaných nabídek kontrolu, zda jsou autentické a nemanipulované. Komise následně nabídky otevřela a do protokolu o odtajnění nabídek zaznamenala identifikační údaje dodavatelů včetně informace o nabídkové ceně bez DPH.

Komise zvolila následující pořadí úkonů:

1) hodnocení nabídek,
2) posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,
3) posouzení splnění kvalifikaci stanovené zadávacími podmínkami.

Hodnocení nabídek

Komise konstatuje, že níže uvedení účastníci nepřekročili předpokládanou cenu veřejné zakázky uvedenou v zadávací dokumentaci.

Seznam nabídek včetně kritérií hodnocení:

abídka č. 1
Jméno (název) dodavatele: SKANSKA a.s.
Sídlo dodavatele: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ dodavatele: 262 71 303
El. nabídka autentická a DZ nemanipulovaná: ANO
Nabídková cena celkem bez DPH: 21 878 490,79 Kč
Lhůta pro provedení v kal. dnech: 100
Bankovní záruka: ANO

Nabídka č. 2
Jméno (název) dodavatele: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo dodavatele: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ dodavatele: 480 35 599
El. nabídka autentická a DZ nemanipulovaná: ANO
Nabídková cena celkem bez DPH: 23 896 801,42 Kč
Lhůta pro provedení v kal. dnech: 109
Bankovní záruka: ANO

Nabídka č. 3
Jméno (název) dodavatele: Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná, MTS Infra – MTS DS, Metrostav Infrastructure a.s. a Metrostav DS a.s.
Sídlo dodavatele: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČ dodavatele: 242 04 005
El. nabídka autentická a DZ nemanipulovaná: ANO
Nabídková cena celkem bez DPH: 25 851 555,99 Kč
Lhůta pro provedení v kal. dnech: 102
Bankovní záruka: ANO

Nabídka č. 4
Jméno (název) dodavatele: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo dodavatele: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČ dodavatele: 252 53 361
El. nabídka autentická a DZ nemanipulovaná: ANO
Nabídková cena celkem bez DPH: 31 167 000,00 Kč
Lhůta pro provedení v kal. dnech: 140
Bankovní záruka: ANO

Nabídka č. 5
Jméno (název) dodavatele: M-SILNICE a.s.
Sídlo dodavatele: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ dodavatele: 421 96 868
El. nabídka autentická a DZ nemanipulovaná: ANO
Nabídková cena celkem bez DPH: 24 888 888,00 Kč
Lhůta pro provedení v kal. dnech: 108
Bankovní záruka: ANO

Komise provedla hodnocení nabídek dle pokynů zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

Způsob hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.
Ekonomická výhodnost nabídek bylo hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta první zákona podle **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality**.

Kritéria kvality

Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zákona následující kritéria kvality:

- Lhůta pro provedení díla.

Pravidla pro hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:

- Nabídková cena,

- Lhůta pro provedení díla.

V rámci kritéria hodnocení **Nabídková cena** bude hodnocena nabídková cena zpracovaná podle čl. 10 Zadávací dokumentace zadávacího řízení. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. **Údaj o celkové nabídkové ceně rozhodný pro hodnocení účastník zadávacího řízení uvedl do krycího listu nabídky.**

V rámci kritéria hodnocení **Lhůta pro provedení díla** bude hodnocena doba realizace stanovená podle následujících odstavců. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejkratší dobou realizace. **Údaj o lhůtě provedení díla rozhodný pro hodnocení účastník zadávacího řízení uvedl do krycího listu nabídky.**

Lhůtou pro provedení díla se rozumí lhůta pro provedení díla podle čl. IV. odst. 1 závazného návrhu smlouvy, tj. časový úsek od předání staveniště do dne dokončení a předání díla (podrobnosti jsou stanoveny v návrhu smlouvy). **Lhůtu pro provedení díla byl účastník zadávacího řízení povinen stanovit v celých kalendářních dnech a zahrnout do ní každý, i započatý, kalendářní den ode dne předání staveniště (včetně dne předání staveniště) do dne dokončení a předání díla (včetně dne předání díla).**
Zadavatel předpokládal lhůty pro provedení díla takto:

- **minimální** lhůta pro provedení díla .....120 kalendářních dnů,
- **maximální** lhůta pro provedení lhůta ..... 150 kalendářních dnů.

Do lhůty pro provedení díla je účastník zadávacího řízení povinen zahrnout všechny případné technologické přestávky a přerušení prací v důsledku běžných povětrnostních podmínek odpovídajících roční době, ve které budou stavební práce prováděny. Údaj o době realizace musí odpovídat účastníkem zadávacího řízení zpracovanému časovému a finančnímu harmonogramu prací, jenž bude tvořit přílohu návrhů smluv.

Účastník zadávacího řízení je povinen stanovit lhůtu pro provedení díla v celých kalendářních dnech, maximálně ve lhůtě 150 kalendářních dnů, jinak nabídka nesplňuje zadávací podmínky. Při stanovení délky lhůty pro provedení díla nižší než 120 dnů bude účastník vyzván k vysvětlení takové hodnoty kritéria. V případě, že bude poté hodnota kritéria posouzena zadavatelem jako nepřiměřená, přidělí zadavatel kritériu hodnotu 0 bodů.

Hodnotící komise požádala dne 26.6.2020 účastníka č. 1 – SKANSKA a.s. (doložil lhůtu 100 kal. dnů), účastníka č. 2 – SWIETELSKY stavební s.r.o. (doložil lhůtu 109 kal. dnů), účastníka č. 3 - Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná, MTS Infra –

MTS DS, Metrostav Infrastructure a.s. a Metrostav DS a.s. (doložil lhůtu 102 kal. dnů) a účastníka č. 4 – M – SILNICE a.s. (doložil lhůtu 108 kal. dnů) o doložení vysvětlení takto stanovené lhůty pro provedení díla a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti,, a to výhradně elektronicky.

Dne 26.6.2020 obdržela objasnění od účastníka č. 5 – M - SILNICE a.s., od účastníka č. 2 – SWIETELSKY stavební s.r.o. a dne 29.6.2020 od účastníka č. 1 – SKANSKA a.s. a dne 30.6.2020 od účastníka č. 3 - Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná, MTS Infra – MTS DS, Metrostav Infrastructure a.s. a Metrostav DS a.s.

Objasnění všech účastníků jsou přílohou tohoto protokolu.
Hodnotící komise přijala všechna vysvětlení a vyhodnotila je jako přiměřená a dostačující.

Výsledek hodnocení

Na základě výsledku hodnocení bylo sestaveno následující pořadí nabídek:

Pořadí nabídek podle hodnotícího kritéria	Účastník	Nabídková cena/lhůta v kal. dnech
1.	SKANSKA a.s.	21 878 490,79 Kč bez DPH/100
2.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	23 896 801,42 Kč bez DPH/109
4.	Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná, MTS Infra – MTS DS, Metrostav Infrastructure a.s. a Metrostav DS a.s.	25 851 555,99 Kč bez DPH/102
5.	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	31 167 000,00 Kč bez DPH/140
3.	M – SILNICE a.s.	24 888 888,00 Kč bez DPH/108

Nejvýhodnější nabídka po hodnocení (vybraný dodavatel):

Nabídka č. 1			
Účastník:	SKANSKA a.s.		
Sídlo:	Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín	IČ:	262 71 303
Nabídková cena:	21 878 490,79 Kč bez DPH/100 kal. dnů		

Zadavatel s odkazem na § 39 odst. 4 zákona provedl posouzení splnění podmínek účasti a kvalifikace jen u účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější v návaznosti na zefektivnění procesu zadávání veřejné zakázky a snížení časové a administrativní náročnosti zadávacího řízení.

Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

Komise provedla posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení dle zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci u účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
Nabídka vybraného dodavatele byla posouzena jako úplná, splňující zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Nabídka vybraného dodavatele byla v elektronickém nástroji zadavatele opatřena elektronickým podpisem.

Nabídková cena vybraného dodavatele včetně oceněné kalkulace ceny nebyla posouzena jako mimořádně nízká nabídková cena.

Posouzení splnění kvalifikace stanovené zadávacími podmínkami

Komise provedla kompletní posouzení splnění kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci.

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazuje kvalifikaci:

- čestné prohlášení o základní způsobilosti ze dne 24.6.2020
- certifikát SILMOS-Q č. 09069 platný do 16.12.2020
- seznam významných stavebních prací:
    - I/35 Litomyšl – průtah, I. etapa, OŽK, objednatel ŘSD ČR, správa Pardubice, obnova krytu vozovky v intravilánu města v délce 2 119 m, plocha obrusné vrstvy 28 818 m2, předláždění vodících proužků a obrubníků, dopravní značení a DIO, práce na pokládce asfaltobetonových vrstev byly provedeny vlastními kapacitami, cena 37 505 327,- Kč bez DPH, termín 1.9.2018-31.5.2019, Referenční list ŘSD ČR ze dne 11.2.2020
    - Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 Ostrava, el. Orlovská, objednatel Moravskoslezský kraj Ostrava, rekonstrukce silnice II/470 v intravilánu města v délce 2,84 km, plocha obrusné vrstvy 28 631 m2, úprava odvodnění komunikace, autobusové zálivy, kamenné obruby a kostky, svislé a vodorovné dopravní značení, práce na pokládce asfaltobetonových vrstev byly provedeny vlastními kapacitami, cena 36 748 036,- Kč bez DPH, termín 1.4.2019-30.7.2019, Osvědčení objednatele, reference o provedené stavbě ze dne 16.10.2019
    - I/59 Petřvald – průtah, objednatel ŘSD ČR, správa Ostrava, oprava čtyřpruhové komunikace v intravilánu města v délce 2 121 m, plocha obrusné vrstvy 31 585 m2, obnova svislého a vodorovného značení, práce na

pokládce asfaltobetonových vrstev byly provedeny vlastními kapacitami, cena 21 492 064,- Kč bez DPH, termín 2.11.2015-9.12.2015, Osvědčení o realizované VZ na stavební práce pro ŘSD ČR ze dne 6.6.2016 a dodatek k osvědčení objednatele

- Seznam členů realizačního týmu: Martin Paťava, DiS., autorizace v oboru Dopravní stavby č. 36627, praxe v oboru 16 let, zaměstnanec společnosti, profesní životopis, referenční zakázky: I/11 Častolovice-Lípa, rekonstrukce, II/317 Borohrádek-Čermná n.O., 2. etapa, I/35 Litomyšl-průtah, OŽK.
- Seznam poddodavatelů – provedení vlastními kapacitami.
- Čestné prohlášení o zajištění dostatečného množství asfaltových směsí k realizaci předmětu díla.
- Rámcová smlouva o dodávkách asfaltových směsí č. SAP:_100000143418

Účastník prokázal splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace.

Přílohou je **Vyhodnocení a způsob výpočtu hodnocených nabídek**.

Protokol byl přečten a členové komise podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů.

Ve vztahu k závěrům neměl žádný z přítomných osob odchylný názor proti názoru většiny. Komise se na shora uvedeném shodla a jednomyslně usnesla.

Přílohy:

1. Objasnění účastníků
2. Vyhodnocení a způsob výpočtu hodnocených nabídek

V Pardubicích dne: 2.7.2020

Zapsala : Bc. Kamila Filípková

Podpisy :

Předseda komise:	Mgr. Josef Neumann, LL.M. .....
Místopředseda komise:	Ing. Radim Malát .....
Člen komise:	Ing. Mojmír Myšák .....

Vyřizuje: Ing. Lukáš Horčík
Tel.: 724 925 454
E-mail: lukas.horcik@msilnice.cz

V Chrudimi dne: 26.06.2020

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Bc. Kamila Filípková
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Ke sp. Zn. SUSPK/2020

„Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná – průtah" – objasnění předložených údajů z nabídky

Dne 26. 6.2020 byl účastník zadávacího řízení – společnost M – SILNICE a.s., IČ:42196868, Husova 1697, 503 03 Pardubice prostřednictvím el. nástroje eZAK vyzván zadavatelem – Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, IČ:00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, k objasnění délky provádění díla, kterou účastník ve své nabídce stanovil na 108 kalendářních dnů.

Účastník zadávacího řízení objasňuje délku provádění díla 108 kalendářních dnů takto:

Účastník se přípravou možné realizace stavby detailně zabýval a je schopen délku provádění stavby zkrátit na stanovenou lhůtu 108 kalendářních dnů a to z několika zásadních důvodů, kterými jsou zejména souběh prací při provádění stavby na více pracovních místech, blízká vzdálenost střediska účastníka a jeho lomu i obalovny.

Účastník předpokládá při realizaci prací souběžné práce na nasazení většího množství techniky na více pracovních místech, čímž může realizovat celou stavbu rychleji. Souběh prací je zřejmý i z časového harmonogramu, který je součástí nabídky.

Délka výstavby byla do nabídky stanovena mimo jiné i na základě odvozových a dovozových vzdáleností na stavbu. Účastník má pro kamenivo a další materiály zajištěnu meziskládku přímo v bezprostřední blízkosti stavby. S ohledem na tuto skutečnost je účastník schopen operativně řešit celou logistiku stavby.

Účastník rovněž podotýká, že objektivní zhodnocení délky provádění díla je rovněž podepřeno skutečností, že pod hrozbou propadnutí složené jistiny je nabídnutá realizační doba již nyní pro účastníka závazná a po případném uzavření smlouvy o dílo je tento závazek účastníka zajištěn smluvními sankcemi. Z ekonomického pohledu je vyloučeno, aby účastník nepodloženě zkrátil realizační dobu s cílem získání kontraktu na veřejnou zakázku, jelikož i poměrně krátké prodlení by pro něj znamenalo významnou finanční újmu.

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že účastníkem stanovený termín 108 kalendářních dnů na zhotovení předmětné stavby je zcela adekvátní a reálný a účastník k němu dospěl po zhodnocení všech prací a dodávek prováděných na stavbě, tak i s ohledem na místo provádění stavby a v neposlední řadě i s ohledem na rizika sankcí, které hrozí účastníkovi při nesplnění jeho závazku provést dílo v nabídnuté lhůtě.

S pozdravem

M - SILNICE a.s. ①
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

Ing. Lukáš Horčík
Ředitel OZ STŘED

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD,
oblast Pardubice

Tovární 209, Chrudim 53701

Vyřizuje: Ing. Martin Lukeš
m.lukes@swietelsky.cz

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Bc. Filipková Kamila

Doubravice 98

533 53 Pardubice

V Chrudimi, dne 29. června 2020

Vysvětlení délky lhůty pro provedení díla na veřejné zakázce „ Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná – průtah"

Vážená paní Filipková,

stavební firma Swietelsky stavební s.r.o. oblastní závod Pardubice připravoval harmonogram pro zadávací řízení na veřejnou zakázku „ Rekonstrukce silnice III/3542 Česká Rybná-průtah" v počtu dnů 109, tedy 11 dní pod minimální lhůtou výstavby.

Zodpovědně prohlašujeme, že jsme využili znalosti místních poměrů při stanovení optimální doby výstavby, zapracovali jsme do předloženého harmonogramu zkrácení doby výstavby s ohledem na prodloužení pracovní doby, práci ve dnech pracovního volna, nasazení mechanizace.

S pozdravem

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice
ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

.....

Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti Pardubice

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha: Harmonogram výstavby

Harmonogram	Modernizace silnice III/3542 Česká rybná - průtah r. 2020
Objekty	Doba realizace ve dnech

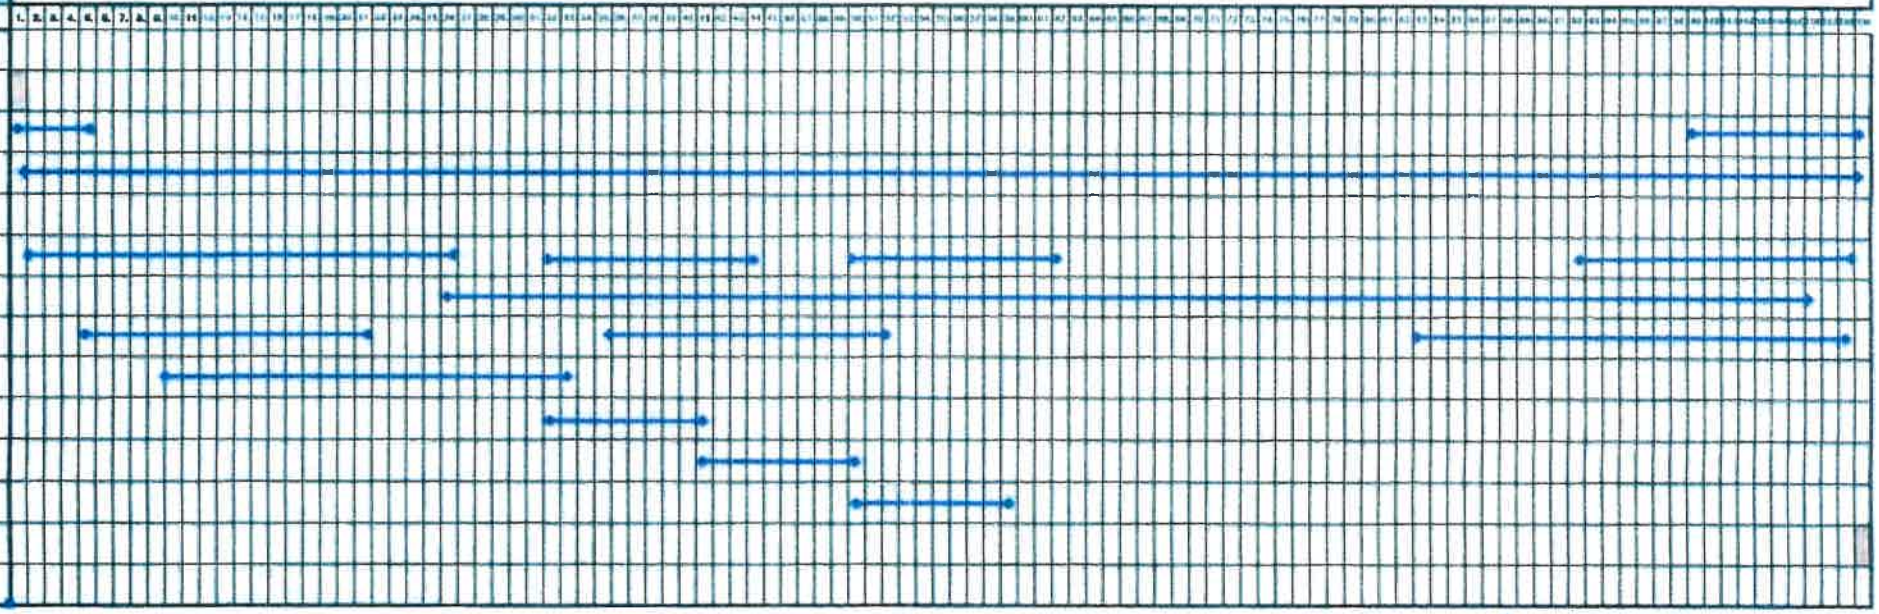

Zpracoval:

Datum:

Schválil:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice
ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

SKANSKA

Skanska a.s.

Sídlo
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
Tel.: +420 267 095 111
E-mail.: skanska@skanska.cz
Web.: www.skanska.cz

Závod Inženýrské stavitelství Morava
Průmyslová 493
530 03 Pardubice

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zasláno elektronicky

Datum	Naše značka	Vyřizuje	Přímý telefon
26. 06. 2020		Mgr. Martin Krupica	724 709 060

Věc: **Reakce na žádost o objasnění předložených údajů z nabídky ze dne 26. 6. 2020**

Veřejná zakázka: Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná - průtah
Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Vážení,

v souvislosti s veřejnou zakázkou: „Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná - průtah" jsme obdrželi žádost o objasnění předložených údajů z nabídky v souladu s § 46, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon"). Konkrétně se jedná o vysvětlení lhůty pro provedení díla v délce 100 kalendářních dnů.

Společnost Skanska a.s. (jako právní nástupce) působí na stavebním trhu v ČR již 60 let. Během tohoto období jsme získali cenné zkušenosti a know – how v oblasti silničního stavitelství, což se pozitivně projevilo ve zlepšení přípravy, organizace a řízení staveb. Tím došlo v celkovém kontextu ke zkrácení jednotlivých pracovních činností, k úsporám mzdových nákladů a ke snížení výrobní režie. Společnost Skanska a.s. disponuje rozsáhlým kvalitním technickým, personálním, ale i odborným zázemím pro včasnou realizaci této zakázky.

Skanska a.s., po důkladném prostudování zadávací dokumentace a detailního harmonogramu, konstatuje, že lhůta pro provedení díla v délce 100 kalendářních dnů je s ohledem na aktuální kapacitní možnosti účastníka reálná a dostatečná. Při přípravě nabídky a stanovení lhůty pro provedení díla vycházela Skanska a.s. z harmonogramu zpracovaného v MS Project, který je přiložen k tomuto sdělení. Uvedený harmonogram zohledňuje reálné volné výrobní kapacity zhotovitele v daném termínu a je zpracovaný na základě reálných denních výkonů strojů a prací.

V případě potřeby dojde ze strany Skanska a.s. k prodloužení směn a mohou být rovněž využity i víkendové dny. Nabídka Skanska a.s rovněž v obecné rovině vychází i ze znalosti místa realizace zakázky, kdy v uvedeném regionu dlouhodobě realizuje obdobné stavby a má zde stabilní síť subdodavatelů. Mezinárodní postavení je rovněž garancí, že je schopna předmětnou veřejnou zakázku řádně a v uvedeném termínu realizovat.

Skanska a.s. na závěr konstatuje, že v blízkosti realizace stavby (cca 25 km) se nachází obalovna Skanska Asfalt s.r.o. (Modřec u Poličky), se kterou má Skanska a.s. uzavřenou rámcovou smlouvu a vlastní lom

Zárubka (cca 14km). Tyto dojezdové vzdálenosti zajišťují rychlé a včasné dodávky obalovaných směsí a kameniva.

Závěrečná prohlášení uchazeče:

Skanska a.s. prohlašuje, že opětovně prověřila harmonogram provádění díla a nezjistila žádné nesrovnalosti. Skanska a.s. prohlašuje, že lhůta pro provedení díla je plně odpovídající rozsahu díla a Skanska a.s. provede dílo v požadovaném standardu, technických parametrech a v souladu se Zadávacími podmínkami, a to v nabídnuté lhůtě 100 kalendářních dní v souladu s předloženou nabídkou.

S pozdravem

Jiří Vinklárek Digitálně podepsal Jiří Vinklárek Datum: 2020.06.26 12:20:23 +02'00'

Jiří Vinklárek
ředitel závodu
oba na základě plné moci

Ing. František Groulík Digitálně podepsal Ing. František Groulík Datum: 2020.06.26 10:22:35 +02'00'

Ing. František Groulík
projektový manažer

ID	Re úk	Název úkolu	Doba trvání
1		**Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná - průtah**	**100 dny**
2		Datum zahájení prací	0 dny
3		Dokončení dle hmg Skanska	0 dny
4		Uprava kanalizačních řadů	30 dny
5		**I. Etapa (západní úsek směr Miřetín)**	**43 dny**
6		frézování	2 dny
7		bourací práce obruby, dlažby, odtěžení podkladních vrstev	12 dny
8		zemní práce , pokládka separační textilie a mříží	4 dny
9		nestmelené podkladní vrstvy	12 dny
10		příčné propustky, nové UV	14 dny
11		obruby, rigoly	16 dny
12		pokládka AHV	4 dny
13		**II. etapa (východní úsek, směr Proseč)**	**38 dny**
14		frézování	1 den
15		bourací práce obruby, dlažby, odtěžení podkladních vrstev	10 dny
16		zemní práce	4 dny
17		nestmelené podkladní vrstvy	10 dny
18		příčné propustky, nové UV	10 dny
19		obruby, rigoly	14 dny
20		pokládka AHV	4 dny
21		Dokončovací práce, dopravní značení	6 dny

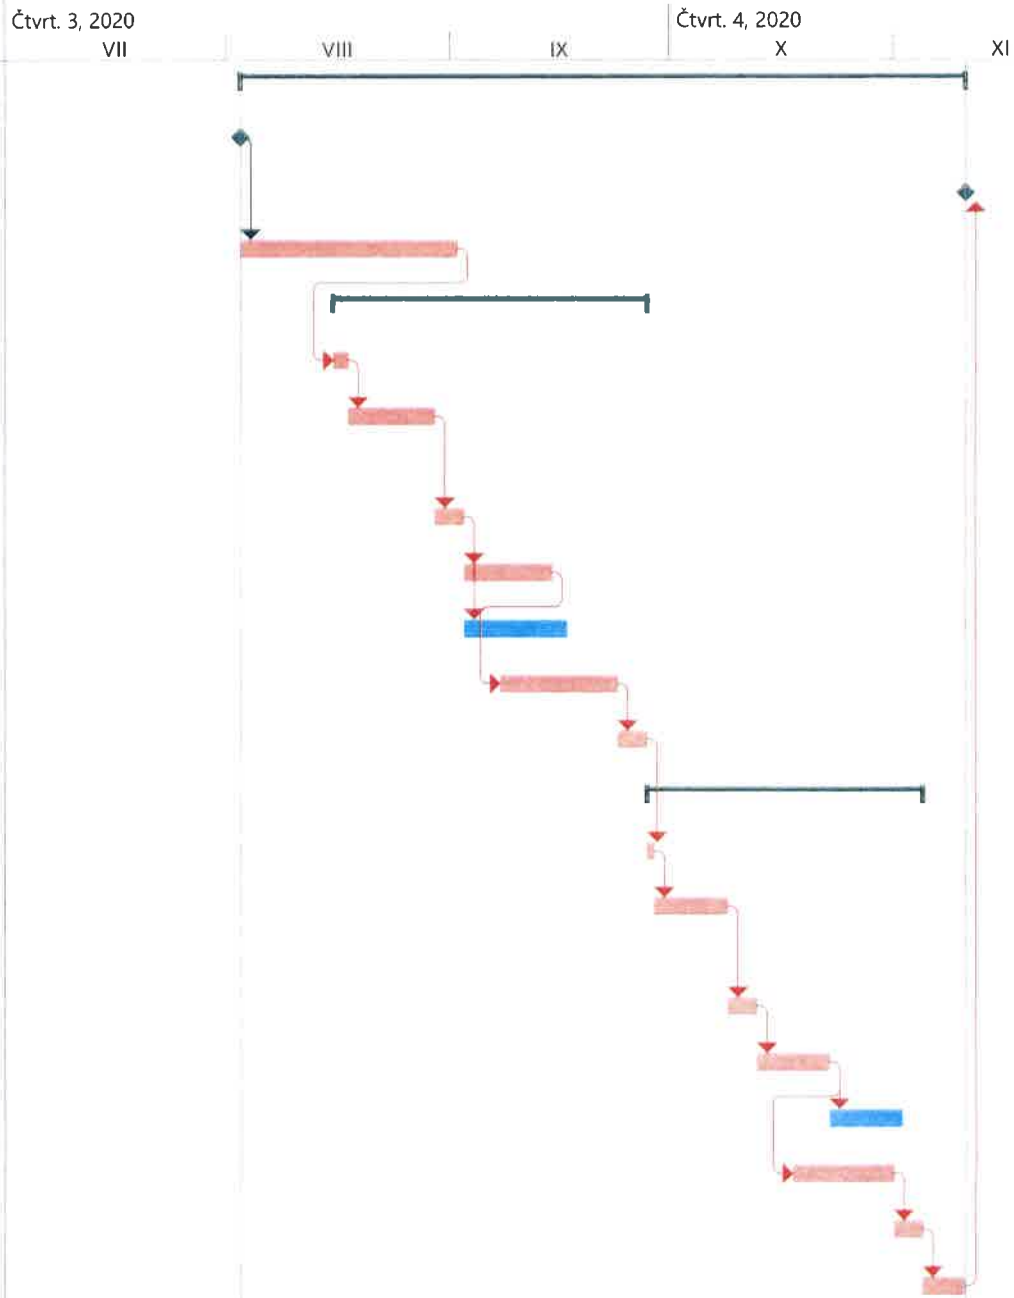

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Radim Malát, místopředseda hodnotící komise
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČO: 00085031

Praha 30. 6. 2020

Společnost „Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná, MTS Infra – MTS DS"

Správce/Společník 1:
Metrostav Infrastructure a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 24204005

Společník 2:
Metrostav DS a.s.
se sídlem: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
IČO: 46120602

(Společník 1 a Společník 2 dále jen „Společnost" nebo „účastník")

Č. j. zadavatele: SUSPK 2020
Č. j. Společnosti: MI/70/20/DOU

Vyjádření k Žádosti o objasnění předložených údajů z nabídky

Vážení,

dne 26. 6. 2020 nám byla doručena Žádost o objasnění předložených údajů z nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku **„Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná - průtah"**. V souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nás žádáte o objasnění údajů předložených v nabídce.

Účastník stanovil v nabídce lhůtu pro provedení díla v délce 102 kalendářních dnů. V souladu s bodem 13.3 zadávací dokumentace při stanovení délky lhůty pro provedení díla nižší než 120 dnů podáváme zadavateli vysvětlení této hodnoty kritéria.

Lhůta pro provedení díla v délce 102 kalendářních dní je výsledkem prostudování údajů v zadávací dokumentaci a podrobného naplánování postupu výstavby.

Při zohlednění všech aspektů, zejména:
- efektivní a plné využití technického vybavení účastníka,
- dispozice potřebným množstvím personálu,
- lokalizování většího množství výrobních kapacit v daném regionu

může účastník realizovat dílo ve lhůtách dle předpokládaného harmonogramu postupu prací předloženého v nabídce a v celkové lhůtě provedení díla 102 kalendářních dnů.

S ohledem na výše uvedené účastník věří, že zadavateli dostatečně objasnil stanovenou hodnotu kritéria a zadavatel tak nebude mít pochybnosti o vyhodnocení tohoto hodnotícího kritéria jako přiměřeného. Účastník je připraven v případě výběru jeho nabídky jako nejvhodnější, veřejnou zakázku ve lhůtě pro provedení díla dle nabídky realizovat.

S pozdravem

Ing. Radim Čáp, Ph.D.

Digitálně podepsal Ing. Radim Čáp, Ph.D.
Datum: 2020.06.30 08:04:06 +02'00'

.....

Ing. Radim Čáp, Ph.D.
předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

Ing. Marek Steiner

Digitálně podepsal Ing. Marek Steiner
Datum: 2020.06.30 10:51:01 +02'00'

.....

Ing. Marek Steiner
člen představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

Název VZ: **Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná - průtah**

Kritérium: **Nabídková cena**

Váha kritéria: **70%**

Minimální cena **21 878 490,79 Kč**

Nab.	Účastník	Cena bez DPH	Počet bodů	**Vážený počet bodů**
1	SKANSKA a.s.	21 878 490,79	100,00	**70,00**
2	SWIETELSKY stavební s.r.o.	23 896 801,42	91,55	**64,09**
3	Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná, MTS Infra – MTS DS, Metrostav Infrastructure a.s. a Metrostav DS a.s.	25 851 555,99	84,63	**59,24**
4	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	31 167 000,00	70,20	**49,14**
5	M - SILNICE a.s.	24 888 888,00	87,90	**61,53**

Kritérium: **Lhůta provedení díla**

Váha kritéria: **30%**

minimální lhůta **100** **120** kalendářních dnů

maximální lhůta **150** kalendářních dnů

Nab.	Účastník	Délka výstavby	Počet bodů	**Vážený počet bodů**
1	SKANSKA a.s.	100	100,00	**30,00**
2	SWIETELSKY stavební s.r.o.	109	91,74	**27,52**
3	Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná, MTS Infra – MTS DS, Metrostav Infrastructure a.s. a Metrostav DS a.s.	102	98,04	**29,41**
4	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	140	71,43	**21,43**
5	M - SILNICE a.s.	108	92,59	**27,78**

POŘADÍ NABÍDEK

Nab.	Účastník	Součet vážených bodů	Pořadí
1	SKANSKA a.s.	100,00	1
2	SWIETELSKY stavební s.r.o.	91,61	2
3	Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná, MTS Infra – MTS DS, Metrostav Infrastructure a.s. a Metrostav DS a.s.	88,65	4
4	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	70,57	5
5	M - SILNICE a.s.	89,31	3
